

2017

DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A.

ALAMO PINO, JORDANA MONTSERRAT

<http://hdl.handle.net/11673/24692>

Repositorio Digital USM, UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
SANTIAGO-CHILE



**DISEÑO CONCEPTUAL DE PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCOVESA
SANTIAGO S.A.**

JORDANA MONTSERRAT ALAMO PINO

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

PROFESOR GUIA: SR. PABLO VIVEROS

JULIO 2017

Quiero dedicar esta memoria a mi madre Montserrat por haberme apoyado siempre y enseñarme que todo es posible, que los límites son infinitos y que cada cosa que uno se propone puede ser alcanzable con dedicación y esfuerzo y por inculcarme los valores que me han formado como la mujer que soy en este momento.

Además quiero dar gracias por la familia que tengo, por mi compañero de vida Gonzalo y mi hijo Santiago que es la luz de mis días.

Finalmente agradecer a mis hermanos menores sin los cuales mi vida sería muy aburrida.

RESUMEN

La presente investigación tiene por objetivo diseñar una plataforma, que permita mejorar el sistema de control de planificación de los proyectos de la Constructora Socovesa Santiago, para así reducir los aumentos en los plazos que se produjeron en los proyectos ejecutados del años 2011 al 2016, el que llegó a ser de 6 a 8 meses en algunos casos y que generó un sobrecosto de 167.729 UF. Es por lo anterior, que se propuso e implementó una herramienta de control de planificación “offline”, para probar su beneficio y poder establecer los parámetros necesarios para el posterior desarrollo de la plataforma “online”.

La herramienta de control de planificación propuesta, se aplicó en 4 obras que se estaban desarrollando en la empresa Constructora Socovesa Santiago durante el año 2016, las cuáles además necesitaban cumplir con la programación de manera estricta puesto que se encontraban afectas al cambio de la Reforma Tributaria, en cuanto a la aplicación del IVA en la venta de inmuebles, que comenzó a regir el 31 de diciembre del 2016. Como resultado de esto, se logró que los 4 proyectos en estudio cumplieran con su programación, la cual a pesar de que implicó un aumento del presupuesto de los proyectos en un total de 10.092 UF, generó por otra parte un ahorro de 65.548 UF que tendría que haber asumido la empresa inmobiliaria.

Finalmente, para abordar el diseño de la plataforma “online” se consideraron las ideas planteadas por las directivas de los proyectos, y además se analizaron las utilidades de las herramientas existentes en el mercado para este objetivo. Donde también, se buscó la integración de la filosofía Lean, que persigue reducir las actividades que no le agregan valor a la construcción, por medio de la identificación de restricciones. Al juntar toda esta información, más los beneficios de la herramienta ya probada, se generaron maquetas de la nueva plataforma a utilizar por la empresa Constructora Socovesa Santiago, para tener un correcto seguimiento de la planificación de todos sus proyectos, y así obtener los mayores beneficios que persigue la empresa.

ABSTRACT

The objective of this research is to design a platform to improve the project planning control system of Constructora Socovesa Santiago, in order to reduce the increases in the deadlines that occurred in the projects executed from the years 2011 to 2016. Which came to be 6 to 8 months in some cases and generated an excess cost of 167,729 UF. It is because of the above, that an "offline" planning control tool was proposed and implemented, to prove its benefit and to be able to establish the necessary parameters for the later development of the "online" platform.

The proposed planning control tool was applied in 4 projects that were being developed by the company Constructora Socovesa Santiago during the year 2016, which also needed to strictly comply with the programming since they were affected to the change of the Tax Reform, regarding the application of VAT in the sale of real estate, which began to take effect on December 31, 2016. As a result, it was accomplished that the 4 projects under study complied with its programming, which, although involved an increase on the budget of the works in a total of 10,092 UF, in turn generated savings of up to 65,548 UF that would otherwise have to have assumed the real estate company.

Finally, to address the design of the "online" platform, the ideas raised by the project directives were considered, and the tools of the existing market tools for this purpose were analyzed. In addition, we sought the integration of the Lean philosophy, which seeks to reduce activities that do not add value to construction, through the identification of restrictions. By gathering all this information, plus the benefits of the tool already tested, models were generated of the new platform to be used by the company Constructora Socovesa Santiago, to have a correct control of the planning of all its projects, and thus obtain the most benefits which the company pursues.

ÍNDICE

RESUMEN	2
ABSTRACT	3
1. INTRODUCCIÓN	9
2. ANTECEDENTES	12
2.1 Problemática	12
2.2 Justificación	13
2.3 Objetivos	15
2.4 Alcance	16
3. MARCO TEÓRICO	17
3.1 Conceptos claves sobre programación de proyectos	17
3.2 Programación en el sector construcción	21
3.3 Filosofía Lean	23
3.4 Sistema Last Planner	24
3.5 Plataformas y herramientas para el control de planificación	26
3.5.1 MS Project	26
3.5.2 ProPlanner	27
3.5.3 Foco en obra	28
3.5.4 Análisis comparativo entre las plataformas de programación	29
4. DESARROLLO	31
4.1 Estudio a la empresa Constructora Socovesa Santiago	31
4.2 Sistemas iniciales de programación en la empresa Constructora Socovesa Santiago	33
4.3 Generación de herramienta para Control de Avance y Mano de Obra – CayMo	35
4.4. Llenado y utilización de herramienta CayMo	46

4.5 Resultado obtenidos gracias a CayMo	51
4.6 Evaluación de CayMo	53
4.7 Plataforma nueva – Socoplanner	55
4.8 Evaluación preliminar de Socoplanner.....	67
 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	69
5. 1. Aumentos de presupuesto por atraso en entrega de proyectos	69
5.2 Ahorro por reprogramación de los 4 proyectos estudiados	72
5.2.1 Vicuña Mackenna	72
5.2.3 Alto Los Bravos	79
5.2.3 Mirador de Singular.....	81
5.2.4 La Marina.....	83
5.3 Encuesta CayMo	85
5. 4 Costo generación Socoplanner.....	86
 6. CONCLUSIONES	88
 7. REFERENCIAS.....	90
 8. ANEXOS	92
1. Crecimiento sector construcción	92
2. Indicadores Empresas Socovesa.....	93
3. Indicadores Inmobiliaria Socovesa Santiago	94
4. Itemizado casas y departamentos.....	95
5. Diagrama de Flujo CayMo	99

Índice de Imágenes

Imagen N° 1: “Planilla de Control de Avances – CayMo”	37
Imagen N° 2: “Planilla de Avances Parciales – CayMo”	41
Imagen N° 3: “Planilla de Control de Mano de Obra – CayMo”	42
Imagen N° 4: “Planilla de Informe Proyección a Término – CayMo”	44
Imagen N° 5: “Nivel de esquema 6 en MS Project”	46
Imagen N° 6: “Ingreso de Avance en CayMo”	47
Imagen N° 7: “Ingreso en planilla de Avance en CayMo”	48
Imagen N° 8: “Ingreso en planilla de Mano de Obra en CayMo”	49
Imagen N° 9: “Extracción del Avance de la semana en CayMo”	50
Imagen N° 10: “Avance acumulado en CayMo”	50
Imagen N° 11: “Avance acumulado en CayMo”	51
Imagen N° 12: “Cuadro de mando Socoplanner”	56
Imagen N° 13: “Creación de un nuevo proyecto en Socoplanner”	57
Imagen N° 14: “Diagrama Gantt - Socoplanner”	58
Imagen N° 15: “Ingreso de Avance y Validación a la derecha - Socoplanner”	58
Imagen N° 16: “Restricciones y bitácora de avance a la derecha - Socoplanner”	59
Imagen N° 17: “Reporte Panel - Socoplanner”	60
Imagen N° 18: “Reporte de Avance Parciales - Socoplanner”	60
Imagen N° 19: “Reporte de Mano de Obra - Socoplanner”	61
Imagen N° 20: “Reporte de Proyección - Socoplanner”	61
Imagen N° 21: “Reporte de Curva S - Socoplanner”	62
Imagen N° 22: “Curva S de una partida - Socoplanner”	62
Imagen N° 23: “Tablero de actividades de la semana - Socoplanner”	63
Imagen N° 24: “Reporte de estado - Socoplanner”	64
Imagen N° 25: “Maqueta inicio de sesión – App Socoplanner”	65
Imagen N° 26: “Maqueta ingreso de avance y validación - App Socoplanner”	65
Imagen N° 27: “Maqueta Reporte de Estado – App Socoplanner”	66
Imagen N° 28: “Maqueta de Control de Avance Gráfico - Socoplanner”	66

Índice de Gráficos

Gráfico N° 1: “Evaluación de presupuesto menos proyección y aumento de plazos”	70
Gráfico N° 2: “Evaluación de presupuesto, superficie construida y cantidad de viviendas”	71
Gráfico N° 3: “Evolución Promesas Santiago”	92
Gráfico N° 4: “Evolución Promesas Departamentos en Santiago”	92
Gráfico N° 5: “Evolución de los Ingresos Consolidados de Empresas Socovesa”	93

Gráfico N° 6: “Evolución ROE de Empresas Socovesa”	93
Gráfico N° 7: “Evolución de las Utilidades de Empresas Socovesa”	94
Gráfico N° 8: “Margen Ebitda de Empresas Socovesa”	94
Gráfico N° 9: “Ingresos Totales y Margen Bruto Total de la Constructora Socovesa”	94
Gráfico N° 10: “Utilidad Controlada y Margen Neto de la Constructora Socovesa”	95

Índice de Tablas

Tabla N° 1: “Comparativo de herramientas de control de planificación”	29
Tabla N° 2: “Proyectos intervenidos en su programación – Programas iniciales”	36
Tabla N° 3: “Comparativo de Socoplanner con otras herramientas de control de planificación”	68
Tabla N° 4: “Evaluación de presupuesto y atrasos de los proyectos, entre el 2011 y 2016”	69
Tabla N° 5: “Evaluación de presupuesto, superficie construida y cantidad de viviendas”	71
Tabla N° 6: “Costo adicional por Incentivo Mano de Obra – Vicuña Mackenna”	73
Tabla N° 7: “Costos por Insumos Adicionales – Vicuña Mackenna”	73
Tabla N° 8: “Análisis de impacto de la Reforma Tributaria en Proyecto Vicuña Mackenna”	74
Tabla N° 9: “Evaluación del impacto de la aceleración del proyecto Vicuña Mackenna”	78
Tabla N° 10: “Costo adicional por Incentivo Mano de Obra – Alto Los Bravos”	79
Tabla N° 11: “Costos por Insumos Adicionales – Alto Los Bravos”	79
Tabla N° 12: “Análisis de impacto de la Reforma Tributaria en Proyecto Alto Los Bravos”	80
Tabla N° 13: “Evaluación del impacto de la aceleración del Alto Los Bravos”	81
Tabla N° 14: “Costo adicional por Incentivo Mano de Obra – Mirador de Singular”	81
Tabla N° 15: “Costos por Insumos Adicionales – Mirador de Singular”	81
Tabla N° 16: “Análisis de impacto de la Reforma Tributaria en Proyecto Mirador de Singular”	82
Tabla N° 17: “Evaluación del impacto de la aceleración del Mirador de Singular”	83
Tabla N° 18: “Costo adicional por Incentivo Mano de Obra – La Marina”	83
Tabla N° 19: “Costos por Insumos Adicionales – La Marina”	83
Tabla N° 20: “Análisis de impacto de la Reforma Tributaria en Proyecto La Marina”	84
Tabla N° 21: “Evaluación del impacto de la aceleración del proyecto La Marina”	85
Tabla N° 22: “Evaluación del impacto de la aceleración en los proyectos estudiados”	85
Tabla N° 23: “Preguntas cerradas – Encuesta CayMo”	86
Tabla N° 24: “Costos informáticos de Socoplanner”	87
Tabla N° 25: “Itemizado Obra gruesa de Casas”	95
Tabla N° 26: “Itemizado Terminaciones Interiores de Casas”	96
Tabla N° 27: “Itemizado Terminaciones y Obras Exteriores de Casas”	96
Tabla N° 28: “Itemizado R0 y Certificación de Casas”	96
Tabla N° 29: “Itemizado Obras previas y Estructura de Edificios”	97
Tabla N° 30: “Itemizado Terminaciones de Edificios”	97
Tabla N° 31: “Itemizado Áreas comunes y Primer piso de Edificios”	97

Tabla N° 32: “Itemizado Exteriores de Edificios”	98
Tabla N° 33: “Itemizado Otros y Certificación de Edificios”	98

Índice de Esquemas

Esquema N° 1: “Factores que restringen un proyecto”	17
Esquema N° 2: “Ciclo de control de Gestión de un proyecto” correctivas	19
Esquema N° 3: “5 Porqué”	26
Esquema N° 4: “Flujo de información en Socoplanner”	67
Esquema N° 5: “Diagrama de Flujo CayMo”	99

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas los mercados se han vuelto cada vez más competitivos, por lo que las empresas han tenido que buscar métodos para volver más eficientes sus procesos implementando herramientas que permitan optimizar recursos, y así disminuir los costos, lo que se traduce en aumentar los beneficios de la empresa. De esta manera las empresas buscan ser líderes en su sector y además aumentar las ganancias de los proyectos que desarrollan, por lo que parten estudiando estos para encontrar el método de optimizarlos.

Todo proyecto para ser realizado debe contar con un programa, los cuales son cada vez más complejos, ya que deben considerar más incertidumbres como la económica, lo cual genera presión en los equipos de trabajo que deben desarrollar el proyecto, pues deben cumplir con lo programado. Es por lo que contar con un correcto sistema de programación, facilita su trabajo y les permite proyectar el futuro del proyecto, para así tomar medidas al respecto. Es aquí donde una correcta planificación de un proyecto es un pilar fundamental, para determinar las variaciones durante la ejecución, por lo que se hace necesario contar con un seguimiento y control del programa, para verificar que el proyecto se esté ejecutando de manera organizada y eficiente.

Específicamente, los proyectos de construcción cuentan con programas de ejecución estrechos, donde su planificación debe ser lo más cercana a la realidad de cada proyecto, y por ende se debe controlar de manera constante. Es por lo anterior que el control de avance físico es necesario dentro de cualquier tipo de proyecto de construcción, ya que sin un programa de actividades, el desarrollo del proyecto puede resultar nefasto, y es necesario que los altos ejecutivos de los proyectos tengan una visión de ellos.

Como se mencionó anteriormente, es importante considerar que todo proyecto de construcción cuente con un programa para efectuarse, el cual si presenta algún atraso debe ser corregido lo más pronto posible, ya que las multas por atraso en la entrega del proyecto por parte de la constructora a la inmobiliaria, llegan a montos entre el 0,01 y 0,05% del contrato por día de atraso, con un límite del 15%.

Por otro lado, en los últimos cinco años se ha presentado un crecimiento económico en el sector construcción, principalmente en cuanto a las promesas de departamentos nuevos, que ha

aumentado en más de un 70% en Santiago¹, donde el año 2015 fue el con mayor crecimiento y mostró que los departamentos más vendidos correspondían a los de valores cercanos a las 2.000 y 3.500 UF. Además, las Empresas Socovesa sitúan al 2016 como el mejor año de la historia², y en particular la empresa Inmobiliaria Socovesa Santiago ha generado ingresos cercanos a los 7.300 MUF entre los años 2011 y 2016³. Para este mismo periodo la empresa construyó más de 5.000 casas, donde los proyectos han aumentado su plazo de construcción en aproximadamente un 14%, lo que se traduce en un aumento de sus presupuestos, donde para el año 2011 llegó a ser casi de un 3%.

La Constructora Socovesa Santiago es parte de uno del holding inmobiliario más importante en Chile, llamado Empresas Socovesa, que cuenta con 4 inmobiliarias y 3 constructoras, entre las que se destaca Almagro y Pilares. La Inmobiliaria y Constructora Socovesa fue fundada en 1965 por don Eduardo Graz Díaz en la ciudad de Temuco, donde se construyeron solo 16 casas, para luego en 1979 extenderse a la ciudad de Valdivia y Puerto Montt, y finalmente en 1983 se expandió a la capital de la Región Metropolitana, lo que les permitió extenderse al resto del país, llegando en la actualidad a estar presente en 13 regiones. Además, esta empresa se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, y también tiene inscritas sus acciones a partir del 2007, por lo que se volvió una Sociedad Anónima Abierta trazada en la Bolsa de Comercio, de Valores y Electrónica de Chile.

El 2014 la empresa Constructora Socovesa Santiago buscó la manera de optimizar sus procesos, para lo que contrató a una empresa consultora, la que señaló que lo más importante era generar un adecuado sistema de gestión de planificación y control de proyectos, para así evitar y corregir desviaciones en el plazo de los proyectos. Es por lo cual, la presente memoria busca desarrollar conceptualmente una herramienta para el seguimiento de control de proyectos, y además maquetas para la creación de una plataforma en línea de control de avance físico para la empresa Constructora Socovesa Santiago.

Por consiguiente, esta memoria comenzará enmarcando el tema en un marco teórico que contempla conceptos tan importantes como los sistemas de programación, filosofía Lean, Last Planner System, softwares de programación de proyectos, para luego mostrar la evaluación inicial

¹ Anexo 1 – Crecimiento sector construcción

² Anexo 2 – Indicadores Empresas Socovesa

³ Anexo 3 – Indicadores Constructora Socovesa Santiago

realizada a la gestión de la empresa Constructora Socovesa Santiago, con el sistema de control de programación que se utilizaba, y la nueva plataforma de seguimiento proyectos implementada en la empresa constructora, la que sirve de base para la nueva plataforma en línea que se desea realizar para la empresa, y se encuentra respaldada con datos estadísticos de aprobación de los profesionales de obras, por medio de encuestas. Para finalmente mostrar los beneficios de un sistema de programación en los costos y plazos de un proyecto.

2. ANTECEDENTES

2.1 Problemática

Específicamente en la industria de la construcción, sector en que se centra esta investigación, la economía ha cambiado muchísimo en los últimos años, lo que ha generado que las rentabilidades de los proyectos sean más ajustadas, por lo que las empresas constructoras han estado motivadas a optimizar los elementos más relevantes en un proyecto de construcción, los cuales van acompañados de una correcta planificación y control de esta.

Además, día a día los proyectos se vuelven más complejos, donde sus Administradores cada vez necesitan más herramientas que le ayuden a tomar decisiones y le entreguen la perspicacia necesaria para mantener el proyecto y los compromisos adquiridos, dentro de lo presupuestado. Es por lo que ellos necesitan plataformas en las que pueden integrar los recursos del proyecto con el programa de ejecución de este, para así asegurar el éxito de él.

Es por lo anterior, que es necesario contar en toda empresa constructora con un sistema correcto de control de la planificación, para de esta manera programar de acuerdo a la realidad de cada proyecto, donde además se pueda proyectar el término de este. Específicamente en la empresa Constructora Socovesa Santiago siempre éste fue un elemento faltante, por lo que muchas veces los profesionales de obra se daban cuenta que sus proyectos estaban atrasados casi al terminar la obra, volviendo muy difícil la tarea de revertir esta situación, lo que afecta directamente los costos del proyecto.

2.2 Justificación

Los proyectos y demandas de los clientes sufren cambios, por lo que se debe contar con procesos y herramientas para hacer frente a dichos requerimientos de manera efectiva, para que los proyectos no sufran un aumento en su plazo y costo. Si se cuenta con las capacidades y los procesos adecuados, se puede responder estratégicamente a variables y cambios inesperados del proyecto. Es por lo cual, la problemática planteada muestra que existe la necesidad de contar con un sistema adecuado de planificación y control de programación, para que así las empresas constructoras, en específico Socovesa Santiago, logren optimizar la duración de sus proyectos, y por ende sus costos y recursos.

La solución que se busca, puede ayudar a tener una mejor cartera de gestión para la toma de decisiones, proporcionando visibilidad de extremo a extremo y con información en tiempo real. Además, permite determinar si se tiene suficientes recursos y miembros del equipo con las habilidades adecuadas para realizar el trabajo, evaluando riesgos y recompensas asociadas en los programas de los proyectos. Por lo que se consigue que el proyecto administre sus capacidades en pro del éxito en la entregar de los proyectos a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad y el diseño previstos.

Por otro lado, Chile ha experimentado un aumento importante en el costo de la construcción, causado por el aumento del valor de la mano de obra y materiales. Este aumento hizo necesario buscar cuales eran los puntos de control más relevantes en el proceso. Es por lo que la empresa Constructora Socovesa Santiago contrató a la empresa consultora Matrix Consulting, para realizar un levantamiento del proceso de construcción en la empresa. En este levantamiento, se detectó que unos de los mayores aumentos de los costos de las obras y que afecta directamente los márgenes de los proyectos, están asociados a 2 elementos, el plazo de construcción y el costo de la mano de obra.

Analizando las dos problemáticas mencionadas anteriormente, se puede extraer que el mayor impacto se logra atacando los plazos de los proyectos, ya que el costo de la mano de obra está ligado directamente con cómo se mueve el mercado. Es por lo que, la presente memoria busca investigar el nuevo enfoque que le dio la empresa Constructora Socovesa Santiago a la nueva

gestión de los plazos de los proyectos, generando una nueva propuesta. Donde es importante destacar, que al generar un cambio en la gestión de planificación de las obras, se favorece de manera directa con la disminución de costos en la mano de obra, ya que al controlar los plazos de un proyecto, se colabora con que no se desvíe la cantidad de mano de obra presupuestada, ya que el tener un proyecto en funcionamiento por un mayor plazo que el proyectado, implica mantener trabajadores contratados por más tiempo.

Finalmente, es importante destacar que uno de los motivos del porque se atrasan los proyectos está dado por los inconvenientes que se dan en obra para generar el avance físico, los cuales son difíciles de analizar si no se tienen bien documentados, lo que también sirve para luego poder prevenirlos. Por estos motivos es que, con el fin de generar una herramienta que permita mejorar la gestión de las obras de construcción surgió la idea de generar una plataforma de control de avance físico en línea, de manera de conseguir que se informe en el mismo día la “restricción” por la que no se pudo ejecutar la faena o tarea programada, de esta forma conseguir una reacción y pronta solución a la restricción. Además con esta herramienta se pretende obtener una serie de indicadores de rendimiento de la mano de obra y ritmos de construcción, para así generar alertas que impulsen a tomar las medidas de acción necesarias y a tiempo.

2.3 Objetivos

Objetivo General

Diseñar conceptualmente una plataforma, que permita realizar un seguimiento de la planificación realizada, para los proyectos habitacionales que realiza la empresa Constructora Socovesa Santiago. Para que posteriormente se realice un desarrollo informático de la propuesta, en base a maquetas que se realizarán en la presente memoria.

Objetivos específicos

- Generar un marco teórico sobre la programación de proyectos, que contemple un levantamiento de los sistemas de control de avance que existen en el mercado para el área de la construcción.
- Analizar la magnitud de los atrasos que presentan los proyectos habitacionales de la empresa Constructora Socovesa Santiago.
- Estandarizar un itemizado de programación de los proyectos de acuerdo al tipo de proyecto, casas o edificios.
- Construir e implementar un prototipo y maqueta de una plataforma de control de avance, para analizar el impacto que puede generar en proyectos de la empresa Constructora Socovesa Santiago.
- Mostrar los beneficios económicos de tener un adecuado sistema de control de avance.
- Evaluar con los Profesionales de Terreno, Administradores y Gerentes de Proyecto, la propuesta inicial del sistema de control de planificación, para obtener así información sobre cómo mejorarla, y poder generar una plataforma definitiva a presentar en la empresa Constructora Socovesa Santiago.

2.4 Alcance

La información y propuestas de este informe tienen origen en una investigación realizada en el tema de planificación y programación de proyectos, principalmente del sector construcción, donde las propuestas se centraron para ser implementadas en la empresa Constructora Socovesa Santiago. Dicha investigación fue realizada desde Febrero del 2016 hasta Marzo del presente año, específicamente sobre proyectos de edificación desarrollados por la empresa desde el 2011 hasta finales del 2016.

En la presente memoria se utilizarán métodos de evaluación estadística por medio de encuestas a profesionales dentro del área, donde se quiere extraer la valoración del prototipo de Control de Avance y Mano de Obra, para así mejorar e idear una nueva plataforma web. La cual, se probará en 4 proyectos de la empresa Constructora Socovesa Santiago, para ver si ésta cumple con los objetivos planteados.

Finalmente, se realizarán valorizaciones económicas a los cambios en el presupuesto de las obras, como también en el cambio de la duración de los proyectos, al cambiar estos su sistema de control de planificación, como también el ahorro generado en los 4 proyectos probados y el costo de generar una plataforma en línea para llevar y controlar el programa de los proyectos de la empresa Constructora Socovesa Santiago.


Es importante destacar, que queda fuera del alcance de esta investigación la materialización e implementación de una plataforma de planificación y control de proyectos en línea, pero si se dejarán planteados los requerimientos que se deben tener, donde también se dejarán maquetas para la herramienta de planificación en base al modelo creado y testeado.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Conceptos claves sobre programación de proyectos

Un **Proyecto** consiste en un esfuerzo que persigue un objetivo específico y único, que tiene un alcance, presupuesto y programación. Todos los proyectos son de tipo temporal, con objetivos definidos, de carácter único y tienen un ciclo de vida que involucran stakeholders, donde además están afectos a riesgos potenciales e incertidumbres (Ferrada, 2016). Estos son gestionados para alcanzar sus requerimientos a tiempo y dentro del costo aprobado.

Esquema N° 1: “Factores que restringen un proyecto”



Fuente: (Chavarría, 2010)

Todo proyecto debe tener una **visión y estrategia** clara, donde se evalúe la perspectiva financiera, que satisface las expectativas de los accionistas, la perspectiva del cliente, que cumple con los requerimientos de ellos, perspectiva de procesos internos, que señala en que procesos se debe destacar para satisfacer al cliente, y finalmente se debe tener en cuenta la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la cual busca como mejorar para asegura la eficiencia de los procesos.

Por otro lado, la **misión o propósito** de un proyecto indica lo que se quiere conseguir con la realización de este, la cual es única, y da respuesta a lo que se va a hacer, para quién y por qué, donde los objetivos deben ser SMART:

- Specific : Específico
- Measurable: Medible

- Attainable: Alcanzable
- Realistic: Realista
- Time-limited: En el tiempo establecido

Además, los proyectos deben ser gestionados a partir de su **alcance**, indicando como va a ser definido, validado y controlado, lo que incluye varias actividades importantes (PMI, 2013):

- 1º. Planificación de la gestión del alcance: Orienta cómo va a ser gestionado el alcance.
- 2º. Recolección de requerimientos: Determina, documenta y maneja las necesidades y expectativas de los interesados.
- 3º. Definición del alcance: Descripción detallada del proyecto y del producto, cómo serán los entregables finales del proyecto y sus criterios de aceptación.
- 4º. Desarrollo de la estructura de subdivisión del proyecto (EDT): Descomposición jerárquica de las etapas de desarrollo del producto, para lograr los objetivos del proyecto.
- 5º. Validación del alcance: Aceptación de los entregables del proyecto que se han completado.
- 6º. Control del alcance: Monitoreo del estado del proyecto y del alcance del producto, y se gestionan cambios.


Para cumplir con los objetivos de un proyecto es necesario contar con una **estrategia**, que indique el enfoque que tendrá el proyecto, donde se deben alinear las necesidades del cliente con la estrategia corporativa, para realizar la estrategia operacional, viendo las competencias centrales y tomando decisiones, para finalmente extraer los procesos, infraestructura y capacidades que se requieren.

Otro punto importante analizar de un proyecto es la **planificación**, que busca definir cómo, cuándo, dónde, por quién y de qué forma se va a realizar un proyecto. Sirve para analizar y definir lo que se hará, anticipándose principalmente en la programación de recursos, coordinando y controlando posteriormente. Donde en primer lugar se debe planificar, luego ejecutar y realizar un

seguimiento de las tareas, para finalmente controlar y tomar decisiones sobre los resultados del control. Esta planificación puede ser estratégica, táctica y/o operacional, en la búsqueda de disminuir las incertidumbres del proyecto, donde a la vez se aumenta la compresión de él y mejora la eficiencia.

Para planificar se suele realizar **estructuras de subdivisión EDT/WBS**, que permiten dividir los entregables del proyecto en trabajos más pequeños y fáciles de manejar, entregando una visión estructurada de manera jerárquica del alcance total del proyecto. Donde el nivel más bajo corresponde al Paquete de Trabajo, que debe ser programado, estimado, seguido y controlado.

Esquema N° 2: “Ciclo de control de Gestión de un proyecto” correctivas

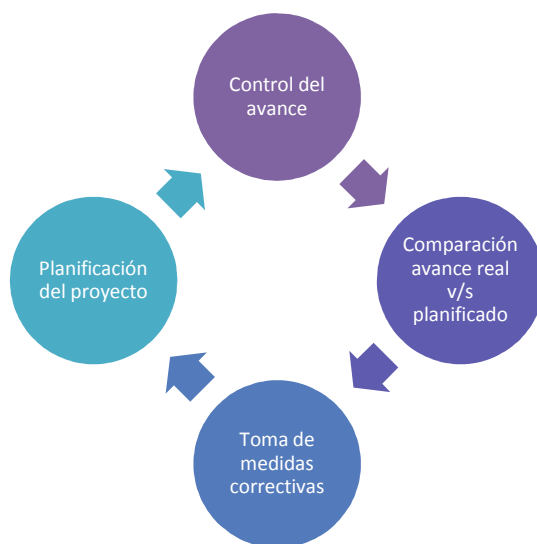

Fuente: Elaboración propia

Las subdivisiones de los trabajos se pueden llevar a una **Carta Gantt**, que consiste en una representación gráfica de la planificación de proyecto por etapas. Esta permite analizar y especificar las tareas o actividades a realizar, por medio de barras que indican el tiempo estimado requerido para realizar cada faena. Si bien esta herramienta de planificación permite entregar información útil en una forma gráfica simple, facilita la comunicación y permite programar proyectos o actividades de manera sencilla, no muestra en forma explícita las relaciones secuenciales entre las actividades, lo que puede ocasionar que no exista el detalle suficiente para tener un control oportuno, ni tampoco se pueden observar los atrasos en el término del proyecto.

Dentro de las **relaciones lógicas entre las tareas o actividades**, se tienen las siguientes situaciones (Ferrada, 2016):

- Precedente: La actividad A es precedente de B, si al menos parte de A debe ser completada antes que la actividad B pueda comenzar ($A < B$).
- Subsecuentes: Si la actividad B es subsecuente de A, entonces la actividad B no puede comenzar hasta que al menos parte de A se haya completado.
- Concurrente: Si una actividad A no es ni precedente, ni subsecuente de B, entonces las actividades A e B pueden realizarse en forma concurrente sin que esto signifique simultaneidad. Solo indica que no hay relación de precedencia entre ellas.

Dentro de programación de un proyecto, hay actividades o tareas que pueden presentar **holguras**, es decir se pueden variar su término o duración sin afectar el término final del proyecto. Existen 2 tipos de holguras (Ferrada, 2016):

- Holgura o flotamiento total (HT): Número de unidades de tiempo que la actividad puede alargar su duración o atrasar su inicio más temprano o su término más temprano sin afectar la duración del proyecto

$$\text{Holgura Total} = \text{Término más tardío} - \text{Comienzo más temprano} - \text{Duración} \quad (1)$$

- Holgura libre (HL): Número de unidades de tiempo que la actividad puede alargar su duración o atrasar su inicio más temprano o su término más temprano sin atrasar el inicio más temprano de sus actividades subsecuentes. Sólo existe este tipo de holgura cuando inciden dos o más actividades en un evento.

$$\text{Holgura libre} = \text{Comienzo más temprano}_{\text{Act subsiguiente}} - \text{Comienzo temprano} - \text{Duración} \quad (2)$$

Por otro lado, es importante considerar que los proyectos se pueden **acelerar**, lo que tiene un impacto directo sobre los costos de este, donde siempre se trata de buscar la duración más económica para el proyecto, la cual es en la que el costo total, incluyendo costos directos,

indirectos y otro, es el mínimo. Para encontrar este punto se deben reducir las duraciones de las actividades que determinan la duración total del proyecto (**actividades críticas**).

3.2 Programación en el sector construcción

Los proyectos de construcción tienen ciertas particularidades, como que se construyen por etapas, tienen ciclo de vida, permanencia de la fuerza de trabajo, presentan ciertas características en las metas de producción, es un trabajo artesanal con movilidad en el lugar de trabajo e implica ciertas precauciones extras en el tema de seguridad.

Es por lo que los proyectos se deben planificar durante el estudio de la propuesta, para apoyarla y poder establecer un periodo de contrato realista, para posteriormente comenzar una planificación luego de la adjudicación del proyecto y previo al inicio de la construcción, donde se debe hacer (Ferrada, 2016):

- Reuniones para definir la forma de iniciar los trabajos
- Contacto y negociación con subcontratistas
- Planificación de la distribución del terreno
- Definición de los métodos de construcción
- Programación de requerimientos
- Programa maestro
- Presupuesto del contrato
- Evaluación de riesgos
- Preparación y aprobación de los planes de calidad y seguridad

Es aquí donde se deben definir las **actividades e hitos** del proyecto, donde una actividad corresponde a los elementos en que se subdivide el proyecto para ser ejecutado, con inicio y

término específico, mientras que un hito es un acontecimiento que ocurre en un instante dado, con un nombre y fecha específica, pero tiene una duración despreciable, ya que se asocia al inicio o término de una actividad. Para determinar la duración de una actividad se debe hacer un análisis de los requerimientos y del nivel de recursos, como también se debe aplicar la experiencia, en base a conocer el volumen o cantidad de trabajo a realizar y el rendimiento de los recursos que se utilizan en la actividad.

$$Duración = \frac{Cantidad\ de\ trabajo\ a\ realizar}{Rendimiento\ de\ los\ recursos} \quad (3)$$

Al tener definidas los hitos y actividades, con sus duraciones, del proyecto, se debe comenzar a trabajar el **plan maestro**, el que muestra el objetivo final del proyecto con sus productos intermedios para tener una visión de los logros de este. Además, permite controlar y evaluar el avance del proyecto, como también controla la evolución del alcance para todos los participantes del proyecto.

Los proyectos de construcción se caracterizan por lo general por tener una **programación rítmica**, ya que son de una naturaleza repetitiva o parte de ellos, construcción en que se repiten viviendas o pisos de edificios, por la implementación de una tecnología en varias unidades. Esta programación se fundamenta porque las actividades tienen una duración común, que se denomina “ritmo”, que consiste en el tiempo necesario para producir o ejecutar una unidad.

Por otro lado, es importante realizar un seguimiento y control a los proyectos, para consolidar datos del desempeño real de la obra, identificar variaciones con lo planificado, proyectar el desempeño futuro y así actuar sobre los factores que están produciendo estas variaciones. Es aquí donde se debe medir el **avance físico**, que puede ser en función de:

- Unidades completadas: Se utiliza en tareas que involucren la ejecución de trabajos fáciles de medir.

$$Avance\ (\%) = \frac{Unidades\ ejecutadas}{Unidades\ totales} * 100 \quad (4)$$

- Hitos incrementales: El porcentaje de avance corresponde al determinado por la última tarea completada.
- Por Comienzo / Término: Para actividades en que es difícil la medición, por lo que se asigna un porcentaje al iniciar la actividad (entre 20 y 50%) y una vez terminada la actividad se le asigna el resto.
- Por opinión subjetiva: Se utiliza sólo en tareas menores y no hay otra forma de medir el avance.

$$Avance (\%) = Opinión o juicio \quad (5)$$

- Por razón de costo: Para actividades de carácter continuo, donde se estima en función de su presupuesto.

$$Avance (\%) = \frac{Costo\ real\ o\ HH\ a\ la\ fecha}{Costo\ total\ o\ HH\ al\ término} * 100 \quad (6)$$

- Por unidades equivalentes: También conocido como avance ponderado, donde combina el avance de actividades distintas, en base a una ponderación que mejor refleja el esfuerzo y avance asociado (HH, costo, etc.).

$$Avance (\%) = \alpha * Avance_{Actividad\ 1} + \beta * Avance_{Actividad\ 2} + \dots + \omega * Avance_{Actividad\ x} \quad (7)$$

3.3 Filosofía Lean

La filosofía Lean indica que se deben reducir las actividades que no agregan valor en los procesos, donde para la construcción se identifican que un 21% de las actividades no agregan valor, por lo que es de suma importancia identificarlas, para así erradicarlas. Lo que indica esta filosofía es que se deben cambiar los tiempos que no agregan valor, por tiempo ganado. Los 8 tipos de desperdicios de la construcción corresponden a:

- Producción innecesaria: Cuando se producen cantidades más grandes o fuera del tiempo en que se solicitó, o también cuando se utiliza equipamiento más sofisticado de lo necesario.
- Tiempos de espera o inactivos: Se produce cuando se espera mayor información, materiales o equipos, que la cancha esté lista, aprobaciones, personal, retraso en el transporte, o repetición del trabajo por cambios en el diseño u otra razón.
- Transporte innecesario: Cuando se hace un movimiento de recursos de manera innecesaria al interior de la obra, dado por una mala logística de almacenamiento, por lo que se pierde tiempo y energía principalmente.
- Sobreprocesamiento: Procesos adicionales en la construcción o instalación de elementos que causan el uso excesivo de materiales, energía o equipos.
- Sobre stock: Corresponde a los inventarios innecesarios o antes de tiempo, que pueden llevar a una pérdida de material y aumento de los costos financieros.
- Movimientos innecesarios o ineficientes: Esto se puede dar por utilizar equipos inadecuados, mal acondicionamiento del lugar de trabajo o métodos de trabajo ineficaces.
- Defectos de calidad: Puede ser ocasionado por problemas con planos, uso de métodos de trabajo incorrectos o mano de obra poco calificada.
- Talento: Se causa por no motivar o escuchar a los trabajadores.

3.4 Sistema Last Planner

Corresponde a una metodología que se basa en comprometer al último planificador, donde se integra lo que se debiera /puede y se hará, es decir, se busca una planificación comprometida, donde la planificación indica lo que se debería hacer, luego se ve si se puede, para luego ejecutarla de acuerdo a lo comprometido. Esta metodología está enfocada en mejorar la confiabilidad de la planificación y con ello aumentar la productividad de los proyectos:

- ✓ Lograr compromisos confiables de planificación
- ✓ Proteger la producción y disminuir la variabilidad contribuyendo así, a lograr un flujo de trabajo más eficiente y estable.

- ✓ Planificando de esta manera se mantienen los objetivos siempre presentes para el equipo del proyecto (involucramiento)
- ✓ Ayuda a identificar y a remover obstáculos para alcanzar los objetivos

Para realizar el sistema LPS se deben confeccionar lo siguiente:

- Plan Maestro: Consiste en una secuencia de actividades que comprende el proyecto, desarrollado al detalle que permite controlarlo. Además, posee hitos y puede ser modificado según el ritmo del proyecto
- Planificación intermedia: Corresponde a un intervalo de tiempo futuro de entre 4 a 6 semanas, que busca establecer actividades a ser analizadas, en cuanto a recursos, responsables y fecha de cierre, para extraer sus restricciones.
- Planificación semanal: Es un programa detallado de los compromisos de la semana, es decir, lo que se puede ejecutar, donde se deben analizar los recursos disponibles, ver que las actividades estén bien definidas, tengan una secuencia lógica y cantidad acorde.

Dentro de las reuniones de planificación semanal, es importante aprender de lo acontecido la semana anterior, para que no se vuelvan a repetir. Además, en estas reuniones se deben presentar los compromisos para la próxima semana en base a lo que se puede realizar (actividades liberadas) y revisar indicadores como:

- Porcentaje de Actividades Iniciadas en Plazo (PAIP)
- Nivel de Confiabilidad (NC): Confiabilidad del responsable de los recursos y probabilidad de iniciar en plazo.
- Porcentaje de Actividades Completadas (PAC): Confiabilidad del programa semanal.
- Causas de No Cumplimiento (CNC)

Las Causas de No Cumplimiento se pueden analizar en base a los “5 porqué”, para así llegar a la causa raíz del no cumplimiento, por ejemplo:

Esquema N° 3: “5 Porqué”



Fuente: (Malabares, 2017)

3.5 Plataformas y herramientas para el control de planificación

Existen en la actualidad diversas plataformas para llevar una planificación y control de avance, dentro de las cuales destaca MS Project, Foco en obra y ProPlanner.

3.5.1 MS Project

Microsoft Project (o MSP) consiste en un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft, que trabaja en la confección y trabajo de una Carta Gantt, la cual tiene un objetivo y alcance, que define lo que está y no está incluido en el proyecto, es decir, el trabajo que debe ser realizado, en cuanto a costos, tiempo y alcance. Los proyectos deben ser definidos desde:

- Fecha de inicio hacia adelante: Aquí la fecha de fin es calculada, en base a la restricción de lo antes posible (LAP)
- Fecha de fin hacia atrás: Aquí la fecha de inicio es calculada, en base a la restricción de lo más tarde posible (LMTP)

Es importante señalar, que se debe determinar un calendario base de trabajo para el proyecto, donde se señalan los días de trabajo para las tareas y recursos humanos, definiendo horas y días laborales (indicando feriados), para que así calcule la duración del proyecto en base a las jornadas realmente trabajables.

MS Project permite generar EDT, estructuras desagregadas del proyecto, una descomposición jerárquica de las actividades de un proyecto, donde cada subnivel es parte del nivel anterior. Los niveles más bajos de una EDT son los cuales pueden ser programados, supervisados y se les realizan estimaciones de costos, por lo que la suma de ellos da el total del nivel superior. El primer nivel por lo general es el nombre del proyecto, luego el segundo indica los subproyectos o faenas, que dan muestra de los entregables del proyecto. A continuación, el tercer nivel descompone los entregables indicados en el segundo, y así sucesivamente. Es aquí necesario analizar si la descomposición llega al nivel necesario y suficiente para obtener una buena comprensión del proyecto y sus entregables, donde el nivel más bajo indicará el “Paquete de Trabajo”.

Dentro de los paquetes de trabajos, es donde se indican las tareas e hitos a realizar según orden de ejecución, donde se deben indicar las precedencias. Además, la herramienta MS Project permite asignar recursos (trabajo, material o costo) y tiempo a las tareas, dependiendo si los trabajos son fijos o la duración es fija, y además permite imprimir informes tanto generales, como de actividades actuales, costos, asignaciones, carga de trabajo y otros que el usuario puede personalizar.

3.5.2 ProPlanner

Esta aplicación permite planificar proyectos por medio de una carta Gantt, la cual puede ser importada desde MS Project o Primavera P6, para luego trabajar sobre la planificación maestra, intermedia y semanal. En la plataforma se permite crear tareas y subtareas, para generar planificaciones mensuales, semanales y diarias, a las cuales se les pueden poner restricciones y asignarles subcontratos y responsables dentro de una obra, a quienes se le informa por medio de una notificación en su Smartphone. Además, la carta Gantt cuenta con un sistema de visualización completa o filtrada según la necesidad del visualizador, pudiendo filtrar la información por término clave o fecha.

Una de las misiones principales de esta aplicación, consiste en que permite llevar un control del avance en terreno, por medio del levantamiento de información directamente a la aplicación, donde también se pueden agregar observaciones, fotos y causas de no cumplimiento, sin necesidad de estar conectado a internet, donde además la plataforma permite reprogramar actividades.

Por otro lado, la plataforma permite asignar recursos a las diferentes tareas, lo que facilita generar indicadores de rendimientos y contrarrestar cubicaciones de manera automática. Donde también se pueden generar checklists, protocolos de calidad y curvas de progreso, que indican velocidades, rendimientos e índices de producción.

Finalmente, la plataforma cuenta con un tablero de control que almacena todo lo ingresado, ya sea por la página web o por la aplicación móvil, en tiempo real. Y además, permite configurar reportes para gestionar el proyecto, según la periodicidad que el usuario desee, donde se grafica información como las causas de no cumplimiento, restricciones, plan completado e índice de tareas ejecutables, y además se señala una fecha estimativa de finalización del proyecto, con su correspondiente curva S de avance.

3.5.3 Foco en obra

Esta es una herramienta utilizada para levantar el avance físico de las obras, por medio de un profesional externo proporcionado por la empresa que administra el software, que visita el proyecto una vez a la semana. Este control puede ser integrado con una Carta Gantt, planilla de productividad y Control de Costos. El profesional de Foco en Obra genera informes semanales de control de avance, curvas de velocidad, control de plazo y ruta crítica, como también control de productividad de diez a quince partidas más importantes del proyecto.

Dichos informes muestran tanto el avance físico del proyecto, como el económico, haciendo una comparación de lo real versus lo programado o presupuestado. Además, esta herramienta permite analizar los ritmos de avance del proyecto, por medio del registro de avances parciales semanales que genera la obra, los que se muestran en tablas y curvas de velocidad. Por otro lado, busca medir la eficiencia de la mano de obra presente en el proyecto, por fecha, supervisor, área y especialidad, lo cual se valoriza en base a las actividades productivas, no contribuyentes y

contribuyentes. Donde también se extraen los niveles de productividad semana a semana, por cada una de las partidas del proyecto, según recursos o agrupación de partidas.

Finalmente, es importante señalar que existen otras herramientas para llevar el control de avance en obra, como de recursos, las cuales son Notrasnoche, Nubix y Primavera, pero ellas no son consideradas en la presente memoria, por el gran impacto que tuvo el ingreso de la plataforma MS Project al mercado y por la reciente creación de la plataforma ProPlanner que se especializa en proyectos de construcción, al igual que Foco en Obra.

3.5.4 Análisis comparativo entre las plataformas de programación

Si bien en el mercado se cuenta con variadas herramientas o plataformas para controlar el avance de los proyectos, es necesario analizarlas para extraer lo positivo y faltante de ellas, para así generar un antecedente que sirva para la creación de un nuevo software de seguimiento y proyección de la programación de los proyectos.

Tabla N° 1: “Comparativo de herramientas de control de planificación”

	MS Project	ProPlanner	Foco en obra
Carta Gantt	X	X	X
Plataforma online		X	
Asignación de costos	X		X
Asignación de personal	X	X	X
Asignación de Subcontratos		X	X
Filosofía Lean		X	
Informes costos	X		X
Informes de asignaciones	X	X	X
Informe de actividades actuales	X	X	X
Reprogramar		X	
Indicadores de rendimientos		X	X
Cálculo de ritmos			X
Registro de avances parciales		X	X
Curvas de progreso		X	X
Proyección de término			X
Proyección de mano de obra			
Filtro en tablero		X	X
Aplicación móvil		X	

Fuente: Elaboración propia

De la tabla anterior se puede observar, que ninguna de las herramientas existentes cumple con todos los requerimientos, donde ninguna proyecta la mano de obra necesaria para cumplir con la

fecha de término del proyecto o actividad, lo que dificulta la toma de medidas para revertir los atrasos. Es por lo cual, que se hace necesario buscar una herramienta que junte todas estas herramientas para llevar el control de avance físico de los proyectos, y que proporciona la información necesaria para generar un análisis completo del estado y proyección del proyecto.

4. DESARROLLO

4.1 Estudio a la empresa Constructora Socovesa Santiago

En el año 2014, en la búsqueda de potenciar el área de Construcción de Socovesa Santiago, se contrató a Matrix Consulting, quienes luego de realizar un estudio de la empresa, entregaron un informe con herramientas para potenciar la empresa, lo cual está enfocado en hechos concretos a realizar con responsables claros.

En primer lugar se buscó conocer la percepción de los ejecutivos sobre el modelo operacional de la Constructora, para así identificar posibles oportunidades de mejora de alto nivel, además de detectar posibles barreras en la implementación de estas. Entre las oportunidades de mejoras detectadas se encontraron los siguientes frentes:

- i. Planificación efectiva: Confeccionar una metodología efectiva para una planificación de proyectos confiable, que cuente con alarmas tempranas. Para lo cual es necesario contar con los antecedentes y requisitos mínimos, que permitan contar con riesgos e incertidumbres moderadas. Donde entre los entregables mínimos se destaca:

- Carta Gantt: Debe contener responsables y todas las etapas de un proyecto:

- ✓ Desarrollo
- ✓ Ejecución
- ✓ Entrega

Con plazos establecidos para un proyecto tipo, adaptable según la envergadura y complejidad de cada proyecto.

- Requerimientos mínimos para comenzar una obra, que debe contemplar:

- ✓ Riesgo controlado
- ✓ Presupuesto confiable

- Herramientas e instancias para realizar una buena Planificación semanal
 - ✓ Reunión de obra: Para realizar seguimiento al avance y estipular modificaciones que requiere el proyecto, con periodicidad semanal o quincenal, si se justifica.
 - ✓ Reunión de control subcontratista: Para controlar el avance de los subcontratistas, revisando metas, multas y estándares de calidad, con periodicidad semanal.
 - ✓ Reunión de programación semanal: Para programar las actividades semanales de la obra respecto a la Carta Gantt, con periodicidad semanal.

- Control de costos y plazos: Generar un sistema de control efectivo para tomar decisiones de forma proactiva y generar conocimiento en la ejecución de futuros proyectos, en términos de confección de presupuestos y AFF, control de costos e información de subcontratos y MO, entre otros. El plan de implementación consiste en:
 - ✓ Detalle de presupuestos
 - ✓ Diseño y cierre de presupuestos
 - ✓ Aumentos
 - ✓ Informe de remuneraciones
 - ✓ Control de inventarios
 - ✓ Cierre de subcontratos
 - ✓ Control de costos
 - ✓ Estandarización de planilla AFF
 - ✓ Indicadores de desempeño

- Organización y equipos de obra: Contar con mano de obra capacitada y enfocada en tareas críticas, para lo que se debe:
 - ✓ Capacitar
 - ✓ Definir roles y responsabilidades a todo nivel
 - ✓ Elaborar un convenio para la atracción de talentos (semillero)

- Innovación y buenas prácticas: Contar con un proceso que permita innovar y levantar buenas prácticas, para identificar oportunidades y compartir experiencias.

- Calidad y entrega de producto: Asegurar un control de calidad que cumpla con los altos estándares y que se ajuste a la realidad de la obra.

4.2 Sistemas iniciales de programación en la empresa Constructora Socovesa Santiago

La empresa Constructora Socovesa Santiago cuenta con un Departamento de Estudio y Control de Gestión, el cual tiene línea directa con el Gerente General de la Empresa, este departamento se subdivide en 2 áreas, donde la primera se encarga del estudio de presupuestos y la segunda del control de gestión. El área de estudio de presupuestos analiza los futuros proyectos que desarrollará la empresa, donde después de tener el proyecto de Arquitectura, este departamento hace un presupuesto de todo lo que contemplará la obra, para luego revisarlo en conjunto con los futuros profesionales de la obra y además, generar en conjunto una estimación de los plazos, Carta Gantt, con lo que se puede presupuestar los gastos generales de la obra y la curva de mano de obra. Posterior a este proceso, se envía un informe a la Gerencia General, para su aprobación y así finalmente enviar la documentación a la Inmobiliaria. Por otra parte, el área de control de gestión debe controlar la planificación de los proyectos de manera semanal, como también sus costos pero estos de manera mensual, donde se hacen reuniones mensuales con el Gerente de Construcción para revisar ambos aspectos.

Como se mencionó anteriormente, los proyectos de la empresa Constructora Socovesa Santiago son programados en la etapa de concepción del proyecto, en conjunto con sus Administradores de Obra para analizar las singularidades de cada proyecto. Dichas programaciones al inicio del 2016 podían ser generadas en formato Excel o MS Project, donde las Cartas Gantt en general debían contener los siguientes apartados:

- 1.- Obra Gruesa
- 2.- Terminaciones Húmedas
- 3.- Terminaciones Finas
- 4.- Instalaciones
- 5.- Certificaciones

Donde por medio de esta programación se extraía un ritmo para realizar la obra gruesa del proyecto y uno para las terminaciones. Luego gracias a esta programación maestra, se ingresaba el avance semanal, para así realizar reuniones en obra y analizar el Porcentaje de Actividades Completadas (PAC), extrayendo las problemáticas que sucedieron en el periodo anterior, para poder solucionarlas.

El PAC o Porcentaje de Actividades Completadas, consiste en un sistema en que se entrega a cada capataz responsable las actividades que debe realizar en una semana de acuerdo al programa global del proyecto, y se controla su cumplimiento la siguiente semana en una reunión semanal denominada “Reunión de PAC”, en ella se verifica si se han logrado cumplir las actividades programadas, y si alguna de estas actividades no logró completarse, se resuelven las “restricciones” que se presentaron y dificultaron el avance del proyecto. A esta reunión asisten los capataces, Jefe de obra, Subcontratistas, Profesional de terreno y Administrador de obra.

Contando con este sistema de programación, no se apreciaba cuando los proyectos terminarían las faenas, es decir, no se tenía proyección para tomar medidas de corrección, por lo que muchos proyectos salían atrasados, lo que afectaba en gran medida su presupuesto. Es por lo que se decidió reunir a los profesionales de obra y gerentes, para consultarles sobre los sistemas de programación, y de esta manera encontrar una solución a los problemas de atrasos que se estaban originando. Donde lo importante era saber sobre el sistema que utilizaban para llevar el control de avance físico, si este era confiable, los problemas que se presentaban en la ejecución de él, y finalmente se preguntaba a los profesionales como se podría mejorar el sistema actual y si les gustaría que fuera en línea.

Gracias a los resultados de esta reunión, el Departamento de Control de Gestión de la empresa reafirmó la necesidad de contar con un sistema de programación de proyectos que incluyera ciertos indicadores de rendimiento. Es por lo que se escogieron 2 proyectos para probar un nuevo sistema, y luego de tener reuniones y presentaciones con varios proveedores, se decidió probar la plataforma de IPSUM, ProPlanner. Los proyectos seleccionados por la empresa fueron Casa Quinta y Los Bravos, que estaban iniciando sus faenas en la comuna de Maipú y Lo Barnechea respectivamente, ambos proyectos de edificación en extensión. Luego de utilizar la plataforma un tiempo, se pudo apreciar que si bien la plataforma funcionaba, esta no entregaba los indicadores que se necesitaban, ya que la información no ayudaba visualizar la proyección de las tareas si estas

seguían su curso, y además carecía de la información de los recursos necesarios para cumplir con el programa. Por otro lado, el soporte de la plataforma demoraba de 2 a 3 semanas en cargar la programación de la obra, y la velocidad de respuesta respecto a cualquier problema de lectura de la información o caída del sistema era muy lenta. Es por lo que la plataforma ProPlanner fue utilizada solo por 2 meses, y se decidió comenzar a idear una nueva plataforma, pero esta vez propia de la empresa Socovesa.

4.3 Generación de herramienta para Control de Avance y Mano de Obra – CayMo

En el año 2016 surgió una nueva necesidad, la de contar con un sistema efectivo de programación y control de ésta, debido principalmente porque se requería acortar los programas actuales de 4 proyectos, para que terminaran antes del 31 de Diciembre del 2016, por la aplicación de la nueva Reforma Tributaria, que indicaba que la venta de inmuebles no pagaban el IVA, si las viviendas contaban con permiso de construcción previo al año 2016, pero que terminarían su construcción durante el 2016 e ingresarán la solicitud de recepción definitiva de la obra a la Dirección de Obras Municipales, con la recepción de las carpetas y todos los antecedentes, antes del 31 de Diciembre del 2016. Aplicación que luego fue aplazada hasta el 31 de Marzo del 2017, por gestiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Es importante señalar, que los proyectos después de ser construidos deben ser aprobados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) correspondientes, para lo cual la Inmobiliaria debe hacer primero el ingreso de la carpeta a la municipalidad, para que después de que la DOM apruebe que se cuenta con toda la documentación, se coordine la visita de revisión a la obra. La carpeta que se ingresa a la municipalidad contiene una serie de certificados, en los que se encuentra la declaración del calculista, certificado de instalaciones sanitarias de agua potable y alcantarillado, anexo TE 1 de la SEC correspondiente a la instalación eléctrica interior, anexo TC 6 de la SEC correspondiente a la instalación interior de gas, certificado de sello verde, certificado SERVIU de recepción de las obras de pavimentación, certificado de extracción de basuras otorgado por la dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad, certificado de ensaye de hormigones, tabiques, puertas, resistencia de vidrios, entre otros.

Por otro lado, los proyectos de edificación en altura por lo general duran de 18 a 24 meses, en cambio los de edificación en extensión tienen un programa que contempla 10 a 14 meses. Los 4 proyectos seleccionados para ser intervenidos en cuanto a su duración, pertenecen a la empresa Constructora Socovesa, y corresponden a los que se describen a continuación:

Tabla N° 2: “Proyectos intervenidos en su programación – Programas iniciales”

PROYECTO	Vicuña Mackenna	Alto los Bravos	Mirador de Singular	La Marina
INMOBILIARIA	Pilares	Socovesa Santiago	Socovesa Santiago	Pilares
COMUNA	La Florida	Lo Barnechea	Colina	San Miguel
TIPOLOGÍA	Edificio	Casas	Casas	Edificio
UNIDADES	182	22	32	220
SUPERFICIE (M²)	16.860	3.220	5.700	20.749
PRESUPUESTO (UF)	229.747	176.817	159.001	265.680
FECHA DE INICIO	Agosto 2015	Marzo 2016	Marzo 2016	Julio 2015
FECHA DE TÉRMINO	Marzo 2017	Enero 2017	Marzo 2017	Febrero 2017
INGRESO CARPETA MUNICIPAL	Febrero 2017	Diciembre 2016	Febrero 2017	Diciembre 2016

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Dentro de los proyectos antes mencionados, el tratado con mayor seguimiento con respecto a este tema, fue “Vicuña Mackenna”, ya que se debía ajustar su programa a 18 meses y se adelantó en 3 meses la entrega de la carpeta a la Municipalidad correspondiente. Por otro lado, el proyecto “Mirador de Singular” tenía un ritmo de 1 casa a la semana, pero debió aumentarlo a 3 casas a la semana, por lo que se debía analizar lo que se necesitaba para conseguir lo propuesto. En cambio, el proyecto “La Marina” si bien se contaba con fecha de ingreso de la carpeta municipal en el plazo permitido, dado que cuando se programó ya se sabía del tema del IVA, se necesitaba controlar el proyecto, ya que se generaron atrasos en obra gruesa, por lo que se tuvo que comprimir la programación de las terminaciones para compensar el atraso, lo cual se debía vigilar. Finalmente, en el proyecto “Alto los Bravos” se tuvo que comprimir su programa para adelantar el ingreso de la carpeta, resultando un proyecto de 10 meses, dado que este se atrasó en su etapa de diseño.

El control de la programación, se comenzó haciendo cada 15 días, donde al tener el avance programado, este se podía comparar con el avance real tenido en obra. Para esto se generó la

herramienta “CayMo – Control de Avance y Mano de Obra”, donde en primera instancia se propuso un itemizado de partidas tanto para edificios como para casas, para que de esta manera todos los proyectos se controlaran con respecto a las mismas partidas generales⁴, el cual fue aprobado por la empresa. Con este itemizado se generó una Carta Gantt en MS Project del programa de la obra, donde con el itemizado se establece un orden, jerarquía, duración y en algunos casos recursos para cada actividad, lo que permite visualizar el porcentaje de avance del mismo. Este programa es el que permite ver el estado de avance de la obra, donde surgió la primera planilla de control de CayMo, “Control de Avances”, que indicaba cuantas unidades se podían hacer por semana, es decir, el nuevo ritmo que se debía tomar para alcanzar la fecha de término programada para la tarea o partida, todo esto gracias a que la información del avance de MS Project se ingresa a la planilla.

Imagen N° 1: “Planilla de Control de Avances – CayMo”

SOCOVESA® TODO ES DISEÑO		CONTROL DE AVANCES		SOCOV-CG-PR-002-R001		
27-09-2016		REV 1		PAG 1 DE 1		

FECHA DE CONTROL 25-11-2016	←	SEMANA N°	67	→	INGRESO DATOS
		FECHA SEMANA	21-11-2016		FECHAS REPROG. POSTERIORES
					FECHAS REPROG. ANTERIORES

RITMO PROGRAMADO OBRA GRUESA (PISOS/SEM)	0,09
RITMO PROGRAMADO TERMINACIONES (PISOS/SEM)	0,56

EDIFICIO VICUÑA MACKENNA	
--------------------------	--

PARTIDAS	SEMANA		ACUMULADO				RITMOS			
	PROGRAMADO	AVANCE	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL	SEMANAS A TERMINO	UNIDADES A TERMINO	NUEVO RITMO PROGRAMADO (VIV/SEM)	RITMO REAL (VIV/SEM)	COMIENZO REAL	FECHA TERMINO (PROGRAMA)
EDIFICIO VICUÑA MACKENNA										
OBRAS PRELIMINARES										
SUBTERRANEO										
RITMO OBRA GRUESA	-	-	1,00	1,00	OK	0,00		0,02	08-01-2016	14-10-2016
Estructura Techumbre	-	-	1,00	1,00	OK	0,00		0,03	04-05-2016	31-05-2016
Cubierta	-	-	1,00	1,00	OK	0,00		0,05	28-06-2016	14-10-2016
TERMINACIONES GRUESAS										
Barandas departamentos	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,31	15-03-2016	08-07-2016
Remate rasgos	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,31	15-03-2016	05-07-2016
Yesos losas y muros	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,31	15-03-2016	06-07-2016
Tabiques	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,31	21-03-2016	12-09-2016
Aluminios	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,31	21-03-2016	30-09-2016
Impermeabilización interior	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,33	01-04-2016	12-09-2016
Tinas y antepechos	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,33	01-04-2016	23-09-2016
Marcos y Puertas	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,33	01-04-2016	30-09-2016
Piernas closet	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,42	23-05-2016	07-10-2016
Cornisas	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,33	01-04-2016	07-10-2016
Ceramica Pavillos	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,35	18-04-2016	28-10-2016
TERMINACIONES FINAS										
Ceramica pisos y muros	-	-	11,00	10,94	-6	0,06	0,06	0,35	18-04-2016	14-10-2016
Guardapolvos	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,39	05-05-2016	14-10-2016
Remates yeso	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,41	16-05-2016	30-09-2016
Empaste cielos y muros	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,43	25-05-2016	14-10-2016
Pintura T. mano	-	-	11,00	10,71	-5	0,29	0,29	0,54	04-07-2016	21-10-2016
Pintura 2. mano	-	0,25	11,00	8,51	-4	2,49	2,49	0,46	14-07-2016	28-10-2016
Muebles cocina, baño, closet	-	0,02	11,00	10,77	-5	0,23	0,23	0,52	28-06-2016	17-10-2016
Colocación artefactos	-	-	11,00	10,33	-4	0,07	0,07	0,55	04-07-2016	16-11-2016
Papel mural	-	0,14	11,00	10,33	-4	0,67	0,67	0,75	16-08-2016	28-10-2016
Alfombra, piso fotolaminado y vinílico	-	0,10	11,00	10,42	-4	0,58	0,58	0,75	16-08-2016	28-10-2016
Pintura Terminación	0,80	0,78	10,66	2,83	1	8,17	8,17	0,22	24-08-2016	28-02-2017
PREPARACION Y ENTREGA										
Ascensores	0,04	-	0,82	1,00	OK	0,00		0,05	04-07-2016	27-12-2016
Sala de basura	-	-	1,00	1,00	OK	0,00		0,04	06-05-2016	29-07-2016
Certificación	0,10	-	1,00	0,99	-1	0,01	0,01	0,20	18-10-2016	17-11-2016
Carpeta RM	0,27	-	1,00	0,90	-1	0,10	0,10	0,35	03-11-2016	18-11-2016
MUEBLES										
MUEBLE BASE	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,50	20-06-2016	06-09-2016
MUEBLE AEREO	-	0,02	11,00	11,00	OK	0,00		0,52	27-06-2016	26-10-2016
INSTALACION CUBIERTA	-	-	11,00	11,00	OK	0,00		0,52	27-06-2016	07-09-2016

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

⁴ Anexo 4 – Itemizado casas y departamentos

La planilla Control de Avance, como se aprecia en la imagen n°1, contempla una lista de actividades, partidas o tareas, las que componen el programa de la obra y se agrupan de acuerdo a su importancia, criticidad o forma. Además, en la planilla existen una serie de términos explicados a continuación:

- Fecha de control: Fecha de corte, es decir, día viernes de la semana que se está controlando.
- Semana N°: Corresponde al número de la semana del proyecto, que se está controlando
- Fecha semana: Corresponde a la fecha del día lunes de la semana que se está controlando
- Ritmo programado Obra gruesa/ Terminaciones: Corresponde a la cantidad de pisos a la semana que se deben hacer en un edificio, o a la cantidad de casas a la semana que se deben hacer para un proyecto de casas. Se calcula por medio del promedio de los ritmos programados para las partidas agrupadas.

$$\text{Ritmo programado} = \text{Prom} (\text{Ritmo programado}_{\text{Partida } i}; \text{Ritmo programado}_{\text{Partida } i+1} \dots) \quad (8)$$

$$\text{Ritmo programado}_{\text{Partida } i} = \frac{\text{Avance programada}_{\text{Total}}}{\text{Duración partida}} \quad (9)$$

- Semana
 - Programado: Es la cantidad de unidades programadas de cada partida o tarea, que deben ejecutarse durante la semana de trabajo. Se calcula como la diferencia de la cantidad acumulada programada y la cantidad acumulada programada de la semana anterior.

$$\text{Avance programado}_{\text{semana}} = \text{Avance programada}_{\text{acum.}} - \text{Avance programado}_{\text{acum. semana anterior}} \quad (10)$$

- Avance real: Es la cantidad de unidades de cada partida o tarea, que se ejecutaron realmente durante la semana de trabajo. Se calcula como la diferencia entre el avance real acumulado en la semana de control, menos el avance real acumulado la semana anterior.

$$Avance\ real_{semana} = Avance\ real_{acum.} - Avance\ real_{acum.\ semana\ anterior} \quad (11)$$

- Acumulado

- Avance programado: Es la cantidad de unidades programadas de cada partida o tarea, que deben haberse ejecutado desde el inicio del proyecto hasta la fecha de control.

$$Avance\ programado_{acum.} = \frac{Cantidad\ prog_{total}}{Duración\ partida} * (Fecha\ de\ control - Fecha\ comienzo\ prog) \quad (12)$$

- Avance real: Es la cantidad de unidades de cada partida o tarea, que se ejecutaron realmente desde su inicio hasta la fecha de control. Este valor se obtiene directamente de la obra.
- Semanas a término: Corresponde a la cantidad de semanas que quedan disponibles de acuerdo a lo programado, para terminar la partida o tarea. Se calcula restando la fecha de término programada con la fecha de control, y si la partida ha finalizado, se señala con un "OK".

$$Semanas\ a\ término = Término\ programado - Fecha\ de\ control \quad (13)$$

- Unidades a término: Cantidad de unidades que falta por ejecutar para terminar la partida o tarea. Se calcula restando las unidades totales menos el avance real acumulado.

$$Unidades\ a\ término = Avance\ programada_{total} - Avance\ real_{acum.} \quad (14)$$

- Ritmos

- Nuevo ritmo programado: Este indicador corresponde a la cantidad de unidades que se necesita ejecutar semanalmente, para poder cumplir con la fecha de término programada de la partida o tarea. Se calcula como la diferencia entre las unidades totales menos las realmente ejecutadas divididas por la cantidad de semanas que quedan desde la semana de control al término.

$$\text{Nuevo ritmo programado} = \frac{\text{Unidades a término}}{\text{Semanas a término}} \quad (15)$$

El nuevo ritmo cuenta con un semáforo, el cual indica con rojo si el nuevo ritmo es superior al 60% del ritmo programado, o amarillo si está entre el 40 y 60%, o verde si es menor al 40% del ritmo programado.

- Ritmo real: Corresponde a la cantidad de unidades efectivamente ejecutadas durante el período de una semana. Se calcula como las unidades ejecutadas dividido por la cantidad de semanas que se ha ejecutado la partida o tarea.

$$\text{Ritmo real} = \frac{\text{Avance real}_{\text{acumulado}}}{\text{Fecha comienzo real} - \text{Fecha de control}} \quad (16)$$

- Comienzo real: Corresponde a la fecha real de inicio de la partida o tarea en obra. Este valor se obtiene directamente de la obra.
- Fecha término: Corresponde a la fecha final programada de cada partida o tarea. Este valor viene dado por la programación inicial del proyecto.

Luego se generó la necesidad de guardar registros de rendimientos, ya que solo se trabajaba con rendimientos en base a la experiencia de los Profesionales de obra, por lo que se implementó la planilla de “Avances Parciales”, la cual guarda el avance real parcial logrado cada semana por partida o tarea, ritmos reales promedios y máximos.

Imagen N° 2: “Planilla de Avances Parciales – CayMo”

SOCOVESA [®] TODO ES DISEÑO									SOCOV-CG-PR-002-R004		
									27-09-2016	REV 1	PAG 1 DE 1
FECHA DE CONTROL 25-11-2016											
EDIFICIO VICUÑA MACKENNA											
PARTIDAS											
PISOS/SEMANA											
EDIFICIO VICUÑA MACKENNA	04-11-2016	11-11-2016	18-11-2016	25-11-2016	02-12-2016	09-12-2016	16-12-2016	23-12-2016	ACUMULADO	RITMO PROM REAL (VIV/SEM)	RITMO MAX REAL (VIV/SEM)
OBRAS PRELIMINARES											
SUBTERRANEO											
Estructura Techumbre									1,00	0,20	0,30
Cubierta									1,00	0,17	0,50
TERMINACIONES GRUESAS											
Barandas departamentos									11,00	1,10	1,84
Remate rasgos									11,00	1,10	2,40
Yesos losas y muros									11,00	1,10	2,00
Tabiques									11,00	0,65	1,78
Aluminios									11,00	0,61	2,22
Impermeabilización interior									11,00	0,79	1,83
Tinas y antepechos									11,00	0,61	1,27
Marcos y Puertas									11,00	0,55	1,84
Piernas closet									11,00	0,61	1,66
Cornisas			0,01						11,00	0,50	2,10
Ceramica Pasillos	0,05	0,10							11,00	0,48	2,50
TERMINACIONES FINAS											
Ceramica pisos y muros	0,04	0,03	0,03						10,94	0,44	2,00
Guardapolvos			0,02						11,00	0,58	1,94
Remates yeso	0,02								11,00	0,48	1,18
Empaste cielos y muros	0,03	0,12	0,06						11,00	0,46	1,42
Pintura 1ª mano	0,32	0,81	0,16						10,71	0,45	1,38
Pintura 2ª mano	2,67	1,17	0,10	0,25					8,51	0,77	2,80
Muebles cocina, baño, closet	0,01	0,29	0,06	0,02					10,77	0,47	1,11
Colocación artefactos	0,03	0,09	1,00						10,93	0,50	1,71
Papel mural	1,19	0,77	0,50	0,14					10,33	0,61	1,62
Alfombra, piso fotolaminado y vinílico	0,73	0,76	0,18	0,10					10,42	0,61	2,18
Pintura Terminación		0,72		0,78					2,83	0,40	0,78
PREPARACION Y ENTREGA											
Ascensores	0,01								1,00	0,08	0,25
Sala de basura									1,00	0,20	0,40
Certificación	0,06	0,02	0,01						0,99	0,20	0,55
Carpeta RM		0,50	0,40						0,90	0,45	0,50
MUEBLES											
MUEBLE BASE									11,00	0,92	2,45
MUEBLE AEREO			0,09	0,02					11,00	0,73	2,31
INSTALACION CUBIERTA									11,00	0,58	2,48

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

En esta planilla se identifican los siguientes términos:

- Acumulado: Que corresponde al avance real acumulado hasta la fecha de control.
- Ritmo real prom: Corresponde velocidad promedio con que se realizó la cantidad de unidades ejecutadas, considerando solamente las semanas en que efectivamente se realizó la faena, es decir, no se consideran las semanas que tienen cero avance. Se calcula como las unidades ejecutadas dividido por la cantidad de semanas que realmente se ejecutó la partida o tarea.

$$Ritmo\ real_{promedio} = \frac{Avance\ real_{acumulado}}{N^{\circ}\ Semanas\ (Avance \neq 0)}$$


(17)

- Ritmo real máx.: Corresponde a la cantidad máxima de unidades que se ejecutaron en una semana. Se obtiene extrayendo el avance de mayor valor.

$$\text{Ritmo real}_{\text{máximo}} = \text{Avance real}_{\text{mayor}} \quad (18)$$

Posteriormente, como se sabía cuántas unidades se necesitaba hacer en un periodo, ahora se requería conocer con cuantas personas se podía lograr este avance, por lo que se generó la planilla de “Control de Mano de Obra”, en la cual los profesionales de obra deben ingresar la cantidad de hombres /días (HD) que necesitan para cumplir con ritmo promedio programado, especificando los cargos para estos hombres días. Con esta información CayMo calcula cuantos HD se necesitan para cumplir con el nuevo ritmo que es necesario para llegar a la fecha de término programada, sin generar atrasos en los plazos.

Imagen N° 3: “Planilla de Control de Mano de Obra – CayMo”

				CONTROL DE MANO DE OBRA										27-09-2016		REV 1	
CONTROL DE MANO DE OBRA POR UNIDAD SEMANA																	
UNIDAD: VIVIENDA																	
PARTIDA	HD	REND. TEORICO	OBRA		UN	PROGRAMA			AVANCE		SEM. A TERMINO	NUEVO RITMO					
			CARGOS			TOTAL UNIDADES	RITMO PROMEDIO	SEMANAS	PROG	REAL		HD	PROGRAMADO (VIV/SEM)				
Remates yeso					UNID	11	0,55	20	11,00	11,00	OK						
Empaste cielos y muros					UNID	11	0,52	21	11,00	11,00	OK						
Pintura 1ª mano	3	0,05	1 Pintor zonas secas + 2 pintores zonas húmedas		UNID	11	0,69	16	11,00	10,71	-5,00	1,26	0,29				
Pintura 2ª mano	15	0,01	5 Pintores zonas secas + 10 pintores zonas húmedas		UNID	11	0,69	16	11,00	8,51	-4,00	54,13	2,49				
Muebles cocina, baño, closet	6	0,02	2 Carpinteros interiores de closet + 3 Carpinteros puertas de closet y tiradores de closet + 1 Carpintero instalando		UNID	11	0,69	16	11,00	10,77	-5,00	2,00	0,23				
Colocación artefactos	2	0,07	1 Gásfiter instalador de artefactos + 1 gásfiter reposición		UNID	11	0,65	17	11,00	10,93	-4,00	0,22	0,07				
Papel mural	2	0,10	Empapeladores		UNID	11	1,00	11	11,00	10,33	-4,00	1,34	0,67				
Alfombra, piso fotolaminado y vinílico	1	0,20	Maestro instalador de alfombra rematando junquillos		UNID	11	1,00	11	11,00	10,42	-4,00	0,58	0,58				
Pintura Terminación	20	0,01	10 Pintores zonas secas + 10 maestros zonas húmedas		UNID	11	0,79	14	10,66	2,83	1,00	206,84	8,17				
PREPARACION Y ENTREGA																	
Ascensores					UNID	1	0,04	26	0,82	1,00	OK						

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Es por lo anterior, que en la planilla de “Control de Mano de Obra” fue necesario agregar nuevos términos:

- HD: Corresponde a la cantidad de hombres días que se requieren para cumplir con el ritmo programado promedio. Este valor es dado por los profesionales de obra, dadas las particulares de cada proyecto.

- Rend. Teórico: Corresponde al rendimiento teórico que relaciona el ritmo programado con las HD de una semana. Se calcula como el ritmo programado dividido por las HD y los 5 días trabajados de la semana

$$Rendimiento\ teórico = \frac{Ritmo\ real_{promedio}}{HD * 5} \quad (19)$$

- Cargos: Señala la especialidad de los HD señaladas, esto es definido por los profesionales de obra.
- HD nuevo ritmo: Corresponde a la cantidad de hombres días que se necesitan para llegar al nuevo ritmo programado. Se obtiene multiplicando los HD por el nuevo ritmo programado, y dividido por el ritmo programado promedio.

$$HD_{nuevo\ ritmo} = \frac{HD * Nuevo\ ritmo\ programado}{Ritmo\ programado\ prom} \quad (20)$$

Cuando ya se manejaba todo este sistema se creó una nueva necesidad, la cual era proyectar el programa en una banda, entre el ritmo real promedio y máximo, para así saber cuándo terminaría la faena de acuerdo a estos ritmos de avance y por ende el proyecto. Es por lo anterior, que se creó una planilla nueva dentro de CayMo, el “Informe Proyección a Término”, la cual indica cuándo terminará cada faena basado en los ritmos reales que ha conseguido la obra, donde además, se permite dejar observaciones de los atrasos, los que son indicados con semáforos rojos, amarillos y verdes.

Imagen N° 4: “Planilla de Informe Proyección a Término – CayMo”

<div>SOCOYESA*</div> <div>TODO ES DISEÑO</div>	INFORME PROYECCIÓN A TÉRMINO						SOCOV-CG-PR-002-R005				
							27-09-2016	REV 1	PAG 1 DE 1		
<div>FECHA DE CONTROL</div> <div>25-11-2016</div>	<div><div><div>RITMO PROGRAMADO OBRA GRUESA (PISOS/SEM)</div><div>0,09</div></div><div><div>RITMO PROGRAMADO TERMINACIONES (PISO/CEFA)</div><div>0,56</div></div></div>										
EDIFICIO VICUÑA MACKENNA											
PARTIDAS	COMIENZO PROGRAMADO	FIN PROGRAMADO	FIN PROYECTADO (PROM)	FIN PROYECTADO (MAX)	UNID. A TÉRMINO	SEM. A TÉRMINO PROGRAMADA	RITMO PROM. REAL	RITMO MAX. REAL	SEM. ATRASO C/REND. PROM.	SEM. ATRASO C/REND. MAX.	OBSERVACIONES
EDIFICIO VICUÑA MACKENNA											
OBRAS PRELIMINARES SUBTERRANEO											
Estructura Techumbre	04-05-2016	31-05-2016	31-05-2016	31-05-2016	0,00	OK	0,20	0,30	0,00	0,00	
Cubierta	28-06-2016	14-10-2016	14-10-2016	14-10-2016	0,00	OK	0,17	0,50	0,00	0,00	
TERMINACIONES GRUESAS											
Barandas departamentos	15-03-2016	08-07-2016	08-07-2016	08-07-2016	0,00	OK	1,10	1,84	0,00	0,00	
Remate rasgos	15-03-2016	05-07-2016	05-07-2016	05-07-2016	0,00	OK	1,10	2,40	0,00	0,00	
Yesos losas y muros	15-03-2016	06-07-2016	06-07-2016	06-07-2016	0,00	OK	1,10	2,00	0,00	0,00	
Tabiques	21-03-2016	12-09-2016	12-09-2016	12-09-2016	0,00	OK	0,65	1,78	0,00	0,00	
Aluminios	21-03-2016	30-09-2016	30-09-2016	30-09-2016	0,00	OK	0,61	2,22	0,00	0,00	
Impermeabilización interior	01-04-2016	12-08-2016	12-08-2016	12-08-2016	0,00	OK	0,79	1,83	0,00	0,00	
Tinas y antepechos	01-04-2016	23-09-2016	23-09-2016	23-09-2016	0,00	OK	0,61	1,27	0,00	0,00	
Marcos y Puertas	01-04-2016	30-09-2016	30-09-2016	30-09-2016	0,00	OK	0,55	1,84	0,00	0,00	
Piernas closet	23-05-2016	07-10-2016	07-10-2016	07-10-2016	0,00	OK	0,61	1,66	0,00	0,00	
Cornisas	01-04-2016	07-10-2016	07-10-2016	07-10-2016	0,00	OK	0,50	2,10	0,00	0,00	
Ceramica Pasillos	18-04-2016	28-10-2016	28-10-2016	28-10-2016	0,00	OK	0,48	2,50	0,00	0,00	
TERMINACIONES FINAS											
Ceramica pisos y muros	18-04-2016	14-10-2016	25-11-2016	25-11-2016	0,06	-6	0,44	2,00	-6,14	-6,03	Esta partida debió haber terminado el 14/10/2016 según programa oficial. A la
Guardapolvos	05-05-2016	14-10-2016	14-10-2016	14-10-2016	0,00	OK	0,58	1,94	0,00	0,00	
Remate yeso	16-05-2016	30-09-2016	30-09-2016	30-09-2016	0,00	OK	0,48	1,18	0,00	0,00	
Empaste cielos y muros	25-05-2016	14-10-2016	14-10-2016	14-10-2016	0,00	OK	0,46	1,42	0,00	0,00	
Pintura 1° mano	04-07-2016	21-10-2016	29-11-2016	26-11-2016	0,29	-5	0,45	1,38	-5,65	-5,21	Esta partida debió haber terminado el 21/10/2016 según programa oficial. A la
Pintura 2° mano	14-07-2016	28-10-2016	17-12-2016	01-12-2016	2,49	-4	0,77	2,80	-7,22	-4,89	Esta partida debió haber terminado el 29/10/2016 según programa oficial. A la
Muebles cocina, baño, closet	28-06-2016	17-10-2016	28-11-2016	26-11-2016	0,23	-5	0,47	1,11	-6,06	-5,78	Esta partida debió haber terminado el 17/10/2016 según programa oficial. A la
Colocación artefactos	04-07-2016	26-10-2016	25-11-2016	25-11-2016	0,07	-4	0,50	1,71	-4,43	-4,33	Esta partida debió haber terminado el 26/10/2016 según programa oficial. A la
Papel mural	16-08-2016	28-10-2016	02-12-2016	27-11-2016	0,67	-4	0,61	1,62	-5,10	-4,41	Esta partida debió haber terminado el 28/10/2016 según programa oficial. A la
Alfombra, piso fotolaminado y vir	16-08-2016	28-10-2016	01-12-2016	26-11-2016	0,58	-4	0,61	2,18	-4,95	-4,27	Esta partida debió haber terminado el 29/10/2016 según programa oficial. A la
Pintura Terminación	24-08-2016	28-11-2016	15-04-2017	06-02-2017	8,17	1	0,40	0,78	-19,78	-10,05	Esta partida debe terminar el 28/11/2016 según programa oficial. A la fecha de
PREPARACION Y ENTREGA											
Ascensores	04-07-2016	27-12-2016	27-12-2016	27-12-2016	0,00	OK	0,08	0,25	0,00	0,00	
Sala de basura	06-05-2016	29-07-2016	29-07-2016	29-07-2016	0,00	OK	0,20	0,40	0,00	0,00	
Certificación	18-10-2016	17-11-2016	25-11-2016	25-11-2016	0,01	-1	0,20	0,55	-1,19	-1,16	
Carpetas RM	03-11-2016	18-11-2016	26-11-2016	26-11-2016	0,10	-1	0,45	0,50	-1,22	-1,20	

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

En esta nueva planilla, se incorporaron los siguientes conceptos:

- Fin proyecto (prom): Corresponde a la fecha de cuándo terminará la partida o faena, si ésta continúa realizándose con el rendimiento real promedio. Se calcula sumándole a la fecha de control, la división entre las unidades que aún faltan por realizar por el rendimiento real promedio, multiplicado por 7 días.

$$Fin\ proyectado_{promedio} = Fecha\ control + \frac{Unidades\ a\ término}{Ritmo\ real_{promedio}} * 7$$

(21)

- Fin proyectado (máx.): Corresponde a la fecha en que terminará la partida o faena, si ésta continúa realizándose según el rendimiento real máximo alcanzado. Se calcula sumándole a la fecha de control, la división entre las unidades que aún faltan por realizar por el rendimiento real máximo, multiplicado por 7 días.

$$Fin\ proyectado_{máximo} = Fecha\ control + \frac{Unidades\ a\ término}{Ritmo\ real_{máximo}} * 7 \quad (22)$$

- Sem. Atraso c/rend prom: Indica las semanas de atraso con las que saldrá la partida o tareas, si se realiza según su rendimiento real promedio. Se calcula como la diferencia entre el término programado y el proyectado con rendimiento promedio, dividido por los 7 días de una semana.

$$Semana\ atraso_{Rend\ promedio} = \frac{Término\ programado - Fin\ proyectado_{promedio}}{7} \quad (23)$$

- Sem. Atraso c/rend máx.: indica las semanas de atraso con las que saldrá la partida o tareas, si se realiza según su rendimiento real máximo alcanzado. Se calcula como la diferencia entre el término programado y el proyectado con rendimiento máximo, dividido por los 7 días de una semana.

$$Semana\ atraso_{Rend\ máximo} = \frac{Término\ programado - Fin\ proyectado_{máximo}}{7} \quad (24)$$

Además, las semanas de atraso se grafican con semáforos, donde aparece uno de color rojo si la partida saldrá con un atraso superior a las 3 semanas, menor a esto el semáforo es amarillo, pero si no saldrá con retraso, el semáforo será de color verde.


4.4. Llenado y utilización de herramienta CayMo

Para la utilización de la herramienta CayMo se definieron diversas responsabilidades, entre las que se destacan:

- Profesional de Terreno: Actualizar la información de avance y recursos.
- Administrador de Obra: Firmar el informe a Gerente del CayMo.
- Gerente de Proyecto: Firmar el informe a Gerente del CayMo.

El procedimiento de ejecución de la herramienta CayMo consiste en que, primero el Profesional de Terreno, luego de constatar el avance físico semanal de la obra, debe registrarlo en MS Project, de manera de actualizar el estado de cada unidad de cada partida, en formato de porcentajes. Luego es necesario copiar todas las partidas con todas sus unidades y sus porcentajes de avance. Para esto se debe hacer click en “Mostrar”, y luego “Nivel de Esquema 6”.

Imagen N° 5: “Nivel de esquema 6 en MS Project”

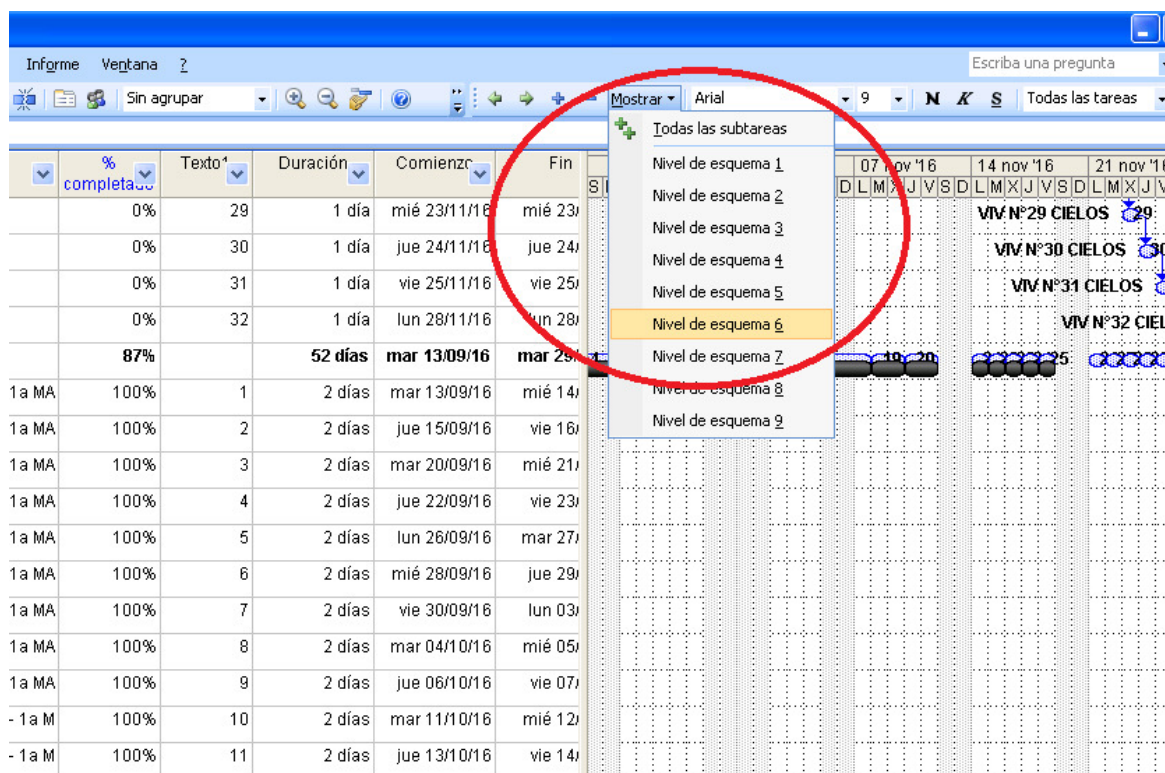

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Después se deben copiar, desde el primer, hasta el último dato de las columnas “Nombre de tarea” y “% completado” y pegarlos en la hoja ingreso avance del CayMo, encima de las 2 primeras columnas que tienen los nombres de las partidas y los porcentajes de éstas. La última columna calculará de modo automático la cantidad de unidades completadas desde el inicio de la obra, hasta la fecha de control (avance acumulado), de acuerdo a los porcentajes ingresados.

Imagen N° 6: “Ingreso de Avance en CayMo”

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Control 2017_02_03_CA y MO Singular II - Microsoft Excel'. The active sheet is 'SINGULAR ETAPA III (32 VIVIENDAS)'. The table contains the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	SINGULAR ETAPA III (32 VIVIENDAS)	93%										
2	VIVIENDAS	94%										
3	OBRA GRUESA	99%										
4	ESCARPE, CORTE ARCILLA	100%	100%	32,00								
37	RELLENO, REPLANTEO Y NIVELETAS	100%	100%	32,00								
70	TRAZADO	100%	100%	32,00								
103	EXCAVACION DE CIMENTOS	100%	100%	32,00								
136	PLASTICO	100%	100%	32,00								
169	EMPLANTILLADO	100%	100%	32,00								
202	FIERRO FUNDACION	100%	100%	32,00								
235	PASADAS PARA INSTALACIONES	100%	100%	32,00								
268	HORMIGON DE FUNDACIONES H20	100%	100%	32,00								
301	MOLDAJE SOBRECIMIENTO	100%	100%	32,00								
334	HORMIGON SOBRECIMIENTO	100%	100%	32,00								
367	DESCIMBRE MOLDAJE SOBRECIMIENTO	100%	100%	32,00								
400	RELLENO COMPACTADO BAJO RADIER	100%	100%	32,00								
433	BASE RIPIO (8 cm)	100%	100%	32,00								
466	HORMIGON RADIER 1º PISO	100%	100%	32,00								
499	MOLDAJE MUROS 1º PISO	100%	100%	32,00								
532	HORMIGON MUROS 1º PISO	100%	100%	32,00								
565	DESCIMBRE MUROS 1º PISO	100%	100%	32,00								
598	MOLDAJE ESCALERA	100%	100%	32,00								
631	MOLDAJE DE LOSA Y CADENAS 1º	100%	100%	32,00								
664	1a MALLA FIERRO	100%	100%	32,00								
697	INSTALACIONES DE LOSA	100%	100%	32,00								
730	2da MALLA FIERRO/ ELEVACIONES 2 DO PISO	100%	100%	32,00								
763	HORMIGÓN DE LOSAS	100%	100%	32,00								
796	MOLDAJE MUROS 2º	100%	100%	32,00								
829	HORMIGON MUROS 2º	100%	100%	32,00								
862	DESCIMBRE MUROS 2º	100%	100%	32,00								
895	REMATE DE RASGOS	100%	100%	32,00								
928	ESTUCOS LINEALES	100%	100%	32,00								
961	ESTRUCTURA TECHUMBRE 2º PISO	100%	100%	32,00								
994	EMPLACADO DE TECHUMBRE-	100%	100%	32,00								
1027	CUBIERTA HOJALATERIA	100%	100%	32,00								
1060	FORROS HOJALATERIA	100%	100%	32,00								
1093	CUADRO LINE 2 DO PISO ESTRUCTURA	100%	100%	32,00								
1126	REVESTIMIENTO CUADRO LINE	100%	100%	32,00								

Red arrows in the image point to the 'C' and 'D' columns, labeled 'Copiado desde Project' and 'Avance Real Acumulado' respectively.

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Luego, en la hoja “Avances” del CayMo se debe actualizar:

- Cambio de Fecha de Control.
- Cambio de número de semana: Se debe verificar con la hoja “Ganttsem”, (se debe verificar que la fecha de término de semana coincida con la fecha de control, que debe ser el día viernes).
- Ingreso de avance semanal.

- Ingreso de avance acumulado.

- Chequeo y/o modificación de fecha de comienzo real.

Imagen N° 7: “Ingreso en planilla de Avance en CayMo”

SOCOVESA
TODO ES DISEÑO

CONTROL DE AVANCES

SOCOV-CG-PR-002-R001

18-11-2016 REV 0 PAG 1 DE 1

FECHA DE CONTROL
10-03-2017

SEMANA N°
60

FECHA TERMINO SEMANA
10-03-2017

FECHA INICIO SEMANA
06-03-2017

INGRESO DATOS

FECHAS REPROG. POSTERIORES
FECHAS REPROG. ANTERIORES

RITMO PROGRAMADO OBRA GRUESA (PISO/SEM)
0,34

RITMO PROGRAMADO TERMINACIONES INT
0,68

RITMO PROGRAMADO AREAS
0,95

RITMO PROGRAMADO FACHADAS
0,20

EDIFICIO CONDE MAULE II (297 DEPTOS-18 PISOS)

PARTIDAS	PARCIAL SEMANA		ACUMULADO		SEMANAS A TERMINO	UNIDADES A TERMINO	RITMOS			FECHA TERMINO (PROGRAMADA)
	PROGRAMADO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE REAL			NUEVO RITMO PROGRAMADO (VIV/SEM)	RITMO REAL (VIV/SEM)	COMIENZO REAL	
18 ESTRUCTURA EDIFICIO	-	-	1,00	1,00	OK	0,00	-	0,02	14-04-2016	25-05-2017
19 FUNDACIONES	-	-	20,00	20,00	OK	0,00	-	0,47	17-05-2016	17-02-2017
10 OG-MUROS	-	-	20,00	20,00	OK	0,00	-	0,48	25-05-2016	23-02-2017
11 OG-LOSAS	-	-	1,00	0,96	1	0,04	0,04	0,42	23-02-2017	02-03-2017
12 SALA MAQ. Y CORONACION	-	-	0,40	-	2	1,00	0,50	-	03-03-2017	23-03-2017
13 ESTRUCTURA CUBIERTA	0,35	0,35	-	-	-	1,00	-	-	24-03-2017	06-04-2017
14 CUBIERTA	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
15 TERMINACIONES EDIFICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 BARANDAS DEPARTAMENTOS	0,70	0,70	16,60	12,25	1	4,75	4,75	0,52	26-09-2016	15-03-2017
17 REMATE RASGOS	0,70	0,59	15,90	11,99	2	5,01	2,51	0,53	03-10-2016	22-03-2017
18 YESOS LOSAS Y MUROS	0,70	0,50	15,19	9,22	3	7,79	2,59	0,43	11-10-2016	23-03-2017
19 TABIQUES	0,70	0,69	14,32	13,73	4	3,27	0,82	0,67	18-10-2016	07-04-2017
20 IMPERMEABILIZACION INTERIOR	0,70	0,60	13,78	9,42	5	7,58	1,52	0,48	25-10-2016	12-04-2017
21 ALUMINIO	0,71	0,69	12,95	9,69	6	7,31	1,22	0,53	03-11-2016	20-04-2017
22 TINAS Y ANTEPECHOS	0,70	0,73	11,77	8,53	8	8,47	1,06	0,51	14-11-2016	02-05-2017
23 MARCOS PUERTAS	0,71	0,71	11,07	11,47	9	5,53	0,61	0,73	21-11-2016	09-05-2017
24 PERNAS CLOSET	0,70	0,69	10,36	9,34	10	7,06	0,71	0,68	29-11-2016	16-05-2017
25 GUARDAPOLVOS Y CORINAS	0,71	0,53	9,66	5,13	11	11,87	1,08	0,37	05-12-2016	23-05-2017
26 REMATE YESO	0,70	0,70	8,90	9,12	12	7,88	0,66	0,73	13-12-2016	30-05-2017
27 EMPASTE CIELOS Y MUROS	0,71	0,70	8,15	6,40	13	10,60	0,82	0,55	20-12-2016	07-06-2017
28 PINTURA Y MANO	0,71	0,50	7,49	4,25	14	12,75	0,91	0,40	27-12-2016	13-06-2017
29 PINTURA CIELOS Y MUROS	0,71	0,71	6,78	7,57	15	9,68	0,65	0,76	03-01-2017	20-06-2017

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Posteriormente, en la hoja “Mano de Obra” del CayMo se debe actualizar:

- Cálculo de HD de obra.

- Ingreso de cargos asociados a HD de obra.

- Observaciones: Para ingresar comentarios y/u observaciones a las partidas que las requieran, si es que las hubiere (Ejemplo: causas de no cumplimiento, planes de acción, necesidad de evaluar nueva fecha de término de partidas, etc.).

Imagen N° 8: “Ingreso en planilla de Mano de Obra en CayMo”

SOCOVESA® TODO ES DISEÑO		CONTROL DE MANO DE OBRA						SOCOV-CG-PR-002-R001				
								18-11-2016	REV 0	PAG 1 DE 1		
CONTROL DE MANO DE OBRA POR UNIDAD SEMANA								INGRESO DATOS				
UNIDAD: PISO/ UNIDAD												
PARTIDA	NO	REND. SEMANAL	OBRA	CARGOS	UNI	TOTAL UNIDADES	PROGRAMA	AVANCE ACUM		SEM. A TERMINO	NUEVO RITMO	
							RITMO PROMEDIO	SEMANAS	PROG	REAL	PROGRAMADO (VW/SEM)	OBSERVACIONES
EDIFICIO CONDE MAULE II (297 DEPTOS- 18 PISOS)												
OBRAS PREVIAS												
SOCIALIZADO					PISO	1,00	0,08	12	1,00	1,00	OK	
EXCAVACION MASIVA					PISO	1,00	0,10	10	1,00	1,00	OK	
FUNDACION GRUAS					UN	1,00	0,50	2	1,00	1,00	OK	
DREN AALL					UN	1,00	0,50	2	1,00	1,00	OK	
ESTRUCTURA EDIFICIO												
FUNDACIONES					PISO	1,00	0,14	7	1,00	1,00	OK	
OG-MUROS					PISO	20,00	0,50	40	20,00	20,00	OK	
OG-LOSAS					UN	20,00	0,50	40	20,00	20,00	OK	
SALA MAQ. Y COORDINACION					UN	1,00	0,50	2	1,00	0,96	-1,00	0,04
ESTRUCTURA CUBIERTA					1,00	0,25	4	0,40	0,00	2,00		0,50
CUBIERTA					UN	1,00	0,35	3	0,00	0,00		
TERMINACIONES EDIFICIO												
BARANDAS DEPARTAMENTOS					PISO	17,00	0,68	25	16,60	12,25	1,00	4,75
REIMATE RASGOS					PISO	17,00	0,68	25	15,90	11,99	2,00	2,51
YESOS LOSAS Y MUROS					PISO	17,00	0,68	25	15,19	9,22	3,00	2,59
TABIQUE					PISO	17,00	0,68	25	14,32	13,73	4,00	0,82
IMPERMEABILIZACION INTERIOR					PISO	17,00	0,68	25	13,78	9,42	5,00	1,52
ALUMINIO					PISO	17,00	0,68	25	12,95	9,69	6,00	1,22
TINAS Y ANTEPECHOS					PISO	17,00	0,68	25	11,77	8,53	8,00	1,08
MARCOS PUERTAS					PISO	17,00	0,68	25	11,07	11,47	9,00	0,61
PIERNAS CLOSET					PISO	17,00	0,68	25	10,36	9,84	10,00	0,71
GUARDARPOLOS Y CORNISAS					PISO	17,00	0,68	25	9,66	5,13	11,00	1,08
REIMATE YESO					PISO	17,00	0,68	25	8,90	9,12	12,00	0,66
EMPASTE CIELOS Y MUROS					PISO	17,00	0,68	25	8,15	6,40	13,00	0,82
PINTURA 1ª MANO					PISO	17,00	0,68	25	7,49	4,25	14,00	0,91
CERAMICA PISOS Y MUROS					PISO	17,00	0,68	25	6,78	7,32	15,00	0,65

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Es importante señalar, que en caso de que una partida esté finalizada, se mostrará “OK” en la columna “Sem a Término” y se deberán limpiar los valores de esta hoja.

Luego, en la página “Ganttsem” del CayMo no se debe ingresar ninguna información, sólo se debe marcar la semana que se está controlando. Después, en la hoja “Avances parciales” se debe actualizar:

- Avance semanal: Se deben copiar desde la hoja “Avances” los datos de la columna Avance real, de la sección Semanal, y pegarlos como valor en la hoja avances parciales, en la semana de control.
- Dejar en blanco las celdas con valor 0
- En la columna “Acumulado”, se debe chequear que sus valores coincidan con los registrados en el avance acumulado a la fecha de control, ingresados en la hoja “Avances” con anterioridad.

Imagen N° 9: “Extracción del Avance de la semana en CayMo”

SOCOYESA <small>TODO ES DISEÑO</small>		CONTROL DE AVANCES		<small>SOCOV-CG-PR-002-R001</small>	
<small>FECHA DE CONTROL</small> 10-03-2017		<small>SEMANA N°</small> 60		<small>INGRESO DATOS</small> FECHAS REPROG. POSTERIORES FECHAS REPROG. ANTERIORES	
<small>FECHA TERMINO SEMANA</small> 10-03-2017		<small>FECHA INICIO SEMANA</small> 06-03-2017		<small>RITMO PROGRAMADO OBRA GRUESA (PISO/SEM)</small> 0,34	
<small>EDIFICIO CONDE MAULE II (297 DEPTOS-18 PISOS)</small>		<small>RITMO PROGRAMADO TERMINACIONES INT (PISO/SEM)</small> 0,68		<small>RITMO PROGRAMADO AREAS COMUNES</small> 0,95	
				<small>RITMO PROGRAMADO FACHADAS</small> 0,20	
<small>PARTIDAS</small>		<small>PARCIAL SEMANAL</small>		<small>ACUMULADO</small>	
		<small>PROGRAMADO</small>		<small>AVANCE REAL</small>	
		<small>AVANCE PROGRAMADO</small>		<small>SEMANAS A TERMINO</small>	
		<small>UNIDADES A TERMINO</small>		<small>NUEVO RITMO PROGRAMADO (VIV/SEM)</small>	
		<small>RITMO REAL (VIV/SEM)</small>		<small>COMIENZ REAL</small>	
<small>EDIFICIO CONDE MAULE II (297 DEPTOS-18 PISOS)</small>					
<small>OBRA PREVIAS</small>					
<small>SOCIALIZADO</small>					
<small>EXCAVACION MASIVA</small>					
<small>FUNDACION GRUAS</small>					
<small>DREN AALL</small>					
<small>ESTRUCTURA EDIFICIO</small>					
<small>FUNDACIONES</small>					
<small>CG-MUROS</small>					
<small>CG-LOSAS</small>					
<small>SALAMAD Y CORONACION</small>					
<small>ESTRUCTURA CUBIERTA</small>					
<small>CUBIERTA</small>					
<small>TERMINACIONES EDIFICIO</small>					
<small>BARANDAS DEPARTAMENTOS</small>					
<small>REIMATE RASGOS</small>					
<small>YESOS LOSAS Y MUROS</small>					
<small>TABIQUE</small>					
<small>IMPERMEABILIZACION INTERIOR</small>					
<small>ALUMINIO</small>					
<small>TINAS Y ANTEPECHOS</small>					
<small>MARCOS PUERTAS</small>					
<small>PIERNAS CLOSET</small>					
<small>GUARDAPOLVOS Y CORNISAS</small>					
<small>REIMATES YESO</small>					

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Imagen N° 10: “Avance acumulado en CayMo”

86	87	88	89	90		
2017	15-09-2017	22-09-2017	29-09-2017	06-10-2017	ACUMULADO	RITMO PROM REAL (PISOS/SEM)
					6,62	0,49
					1,00	0,08
					1,00	0,10
					1,00	0,50
					1,00	0,50
					10,49	0,37
					1,00	0,14
					20,00	0,50
					20,00	0,50
					0,96	0,32
					6,77	0,56
					12,25	0,51
					11,99	0,52
					9,22	0,42
					13,73	0,65

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Finalmente, la hoja proyección sólo entrega información acerca del fin proyectado de los trabajos, en base al ritmo promedio histórico de cada partida y a su ritmo máximo logrado. Además posee recomendaciones acerca de los planes de acción que puede tomar la obra para que las actividades

terminen en sus fechas programada, tanto oficiales como no oficiales. Es sólo una hoja de análisis de información, por lo que con ella deben trabajar para la toma de decisiones.

A partir del análisis realizado en la planilla se generará un informe, en la hoja “Informe Gte”, para el Gerente de Proyecto, el Jefe de Departamento de Estudio y Presupuesto y el Gerente de Construcción Socovesa Santiago. Deberá ser firmado por el Gerente de Proyecto y será entregado al analista de Control de Gestión.⁵

Imagen N° 11: “Avance acumulado en CayMo”

SOCOVESA® TODO ES DISEÑO		INFORME RESUMEN PROYECCIÓN A TÉRMINO				SOCOV-CG-PR-002-R001			
FECHA DE CONTROL 10-03-2017		18-11-2016				REV 0		PAG 1 DE 1	

el próximo avance. Esta herramienta fue diseñada para separar las distintas partidas de una obra y para analizarlas con respecto a:

- Fecha de Inicio y Término
- Semanas a término
- Ritmo promedio, máximo y nuevo ritmo
- Composición de cuadrillas

Y así extraer la necesidad de aumentar la cantidad de mano de obra de una faena, ya sea tanto de faenas realizadas por la empresa o por subcontratistas, o también, aumentar la cantidad de subcontratistas, siempre proyectando cómo y cuándo terminaría una partida.

Con respecto a las medidas tomadas en los 4 proyectos intervenidos con la herramienta CayMo, gracias a esta plataforma se pudo apreciar que por ejemplo en los edificios, “La Marina” y “Vicuña Mackenna” era necesario construir de manera anticipada la Piscina, donde en este último proyecto, la piscina fue confeccionada de fibra de vidrio por un proveedor y luego solamente se instaló en obra, gracias a que la posición de ésta no afectaba la normal ejecución del proyecto, dado el lugar físico donde se emplazaba. En el proyecto “La Marina” se presentó un atraso de mes y medio en su etapa de obra gruesa, lo que fue mostrado en CayMo, por lo que se tuvo que comprimir la programación de las terminaciones del edificio, lo que fue solucionado gracias a la duplicidad de equipos en la partida de cerámica, como también, que se contó con 3 subcontratos de pintura en forma paralela. Por otro lado, en el edificio “Vicuña Mackenna” se optó por contar con 2 equipos de trabajo en obra gruesa, por lo tanto se tuvieron 2 Profesionales de Terreno y 2 TDH (bombas hormigoneras), para aumentar de esta manera el ritmo de la obra gruesa, donde luego también la herramienta CayMo arrojó la necesidad de duplicar el subcontrato de instalación de cerámicas y ventanas, en la etapa de terminaciones del proyecto.

Además, gracias a la herramienta CayMo se pudo apreciar que en el proyecto “Mirador de Singular” se necesitaba aumentar el ritmo, por lo que solo la obra gruesa del proyecto fue realizada en serie, pero a mayor ritmo, y luego la etapa de terminaciones fue ejecutada por 2 frentes en paralelo, cada uno a cargo de un Profesional de Terreno distinto, además de contar con una duplicidad de contratistas, como por ejemplo en la instalación de muebles y ventanas.

Finalmente, en el proyecto “Alto Los Bravos” como se sabía desde un principio que el programa sería apretado, se hicieron 2 frentes de trabajo cada uno de 11 viviendas, contando con 2 grúas, 2 juegos de Moldajes, 2 equipos de carpinteros, entre otros.

Como se tuvo un buen resultado con los 4 proyectos trabajados, se decidió ampliar esta metodología al resto de las obras de la empresa, desde Noviembre del 2016, donde la implementación de CayMo fue paulatina, y fue pensada para levantar avance 1 vez a la semana, y así colaborar en las reuniones semanales de PAC. Donde también gracias a la información recolectada, se generan informes a la Gerencia de la empresa de manera mensual.

4.6 Evaluación de CayMo

En base a la experiencia de trabajar con la plataforma CayMo y analizando los otros software existentes para el control de programas, se generó la necesidad de juntar la herramienta CayMo con MS Project en un sistema en línea, para que de esta manera pudieran participar los diferentes entes en obra, desde capataces hasta el Administrador de Obra, ingresando avance y validándolo, o desde la gerencia de la empresa controlando estos avances. Es por lo anterior, que se decidió encuestar a los usuarios de CayMo y así extraer lo que les gustó de la herramienta, lo que había que mejorar y lo que ellos encontraban que aún faltaba. Esta encuesta fue contestada por 23 profesionales, lo cuales en su mayoría validaron la plataforma, y además dejaron sus comentarios para mejorarla por medio del sistema en línea que se está generando en base a CayMo.

Por otro lado, se realizó un análisis FODA a la herramienta CayMo para poder extraer lo mejor de ella y mejorar sus aspectos negativos, el cual se describe a continuación:

- Fortalezas: Factores críticos positivos con los que se cuenta
 - Experiencia en la planificación de proyectos
 - Es un proyecto participativo
 - Cuenta con una aceptación por parte de los profesionales de obra y gerencia, avalada por la encuesta realizada

- Puede generar cambios reales en la gestión de proyectos
- Se cuenta con personal calificado para desarrollar la plataforma (informáticos)
- Oportunidades: Aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas
 - La Industria de la Construcción es cada vez más competitiva, lo que ofrece la posibilidad de ir mejorando en forma continua los procesos para reducir las ineficiencias que se producen, además estamos en un periodo de poco movimiento en la Industria lo que deja recursos libres para poder realizar mejoras a los procesos.
 - Las ofertas del mercado no cubren todas las necesidades que cubre CayMo (indicadores)
- Debilidades: Factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir
 - CayMo es una herramienta Offline
 - El avance semanal debe ser llenado en forma manual, al igual que en toda plataforma, sólo entrega buenos datos en la medida en que se le ingresan buenos datos.
- Amenazas: Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestro objetivo
 - Los Organismos Públicos como municipalidades y Direcciones de Obras pueden generar retrasos en las recepciones que no son previsibles y podrían de igual forma afectar el logro de la meta programada.

Gracias a estas evaluaciones, se fortaleció la confección de la nueva plataforma de control de planificación. El diseño de la plataforma en línea se comenzó a trabajar después de haber generado la segunda planilla, es decir la de avances parciales, la que busca integrar todas las

planillas de CayMo, y además contar con la metodología Lean (Construcción sin pérdidas), es decir, que permita a los capataces ingresar reportes de dificultades presente en terreno, para que sean analizadas y resueltas por el Profesional de Terreno y Administrador de Obra. Como en todo proyecto es necesario conocer las causas de no cumplimiento del avance o tener una explicación de porqué se ha generado un atraso, es por lo que gracias a esta herramienta en línea, se podrán indicar de manera inmediata estas situaciones, entre las que se destacan:

- Falta de material, que se puede dar por problemas con el proveedor, una incorrecta cubicación o porque el material no fue solicitado a tiempo.
- Indefinición del proyecto, lo que se debe principalmente a que se necesitan mayores especificaciones del Arquitecto o que la entrega de planos es tardía.
- Condiciones de terreno, las que pueden ser generadas por problemas climáticos o que falta cancha en obra para avanzar.
- Falta de MO directa y/o indirecta.
- Falta de Equipo o Maquinaria.
- Prevención de riesgos, que se puede generar por accidentes o que el Prevencionista considera que no existen las condiciones de terreno adecuadas para trabajar.
- Mala ejecución de una faena, la que se debe reparar.

4.7 Plataforma nueva – Socoplanner

La nueva plataforma de control de avance para la empresa Constructora Socovesa Santiago, fue pensada en base a los requerimientos y necesidades que tiene puntualmente dicha empresa. Donde en primer lugar, se tienen los siguientes objetivos a cumplir con la plataforma nombrada como Socoplanner:


- Facilitar el control de avance físico de cada proyecto a través de una plataforma en línea de fácil acceso y alimentación, que entregue reporte de forma rápida a las obras.

- Contar con indicadores de rendimientos históricos por partida de cada una de las obras dentro de la empresa
- Detectar potenciales retrasos en función de los ritmos históricos observados en cada proyecto
- Reaccionar ante imprevistos para responder con los plazos de acuerdo a la información obtenida.
- Entregar la cantidad de mano de obra necesaria para alcanzar los ritmos de avance requeridos para terminar en los plazos, en función de un ritmo programado

La idea de Socoplanner es contar con la trazabilidad de los planes maestros, participación de todo el equipo de obra en el control del avance del proyecto, optimizar indicadores de cumplimiento, hacer más eficiente el registro de información, y contar con una historia para planificar proyectos futuros, donde Socoplanner entregará la información en base a reportes.

En primer lugar, esta plataforma cuenta con un “Cuadro de Mando”, el cual tendrá ciertos atributos de visualización de la información, dependiendo del perfil del usuario, como por ejemplo cantidad de proyecto, posibilidad de carga o edición de estos, entre otros. Es así, como los Profesionales de Obra y Administradores, podrán ingresar al proyecto que tienen a su cargo para ingresar y validar el avance, donde a su vez podrán extraer los reportes brindados por el sistema. Por otro lado, el Gerente de proyecto tendrá estos mismos atributos antes mencionados, pero de todos los proyectos que estén a su cargo, tanto la Gerencia de Construcción y el Departamento de Control de Gestión de la empresa, podrán ver todos los proyectos, y tendrán permisos adicionales, como la carga y descarga de programas, correcciones de avance y extracción de reportes.


Imagen N° 12: “Cuadro de mando Socoplanner”

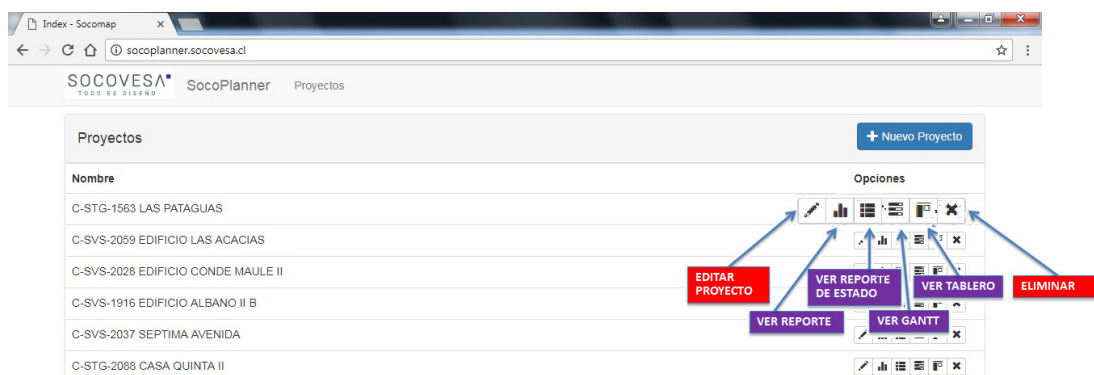

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

El Departamento de Control de Gestión será el responsable de cargar los programas de los proyectos, donde al crear uno nuevo les aparecerá una ventana que pedirá que se identifique la obra, indicando nombre del proyecto, Gerente de Proyecto, Administrador de Obra y Jefe de Bodega. También se solicita que se ingrese un programa en MS Project del proyecto, sobre el cual trabajará la plataforma.

Imagen N° 13: “Creación de un nuevo proyecto en Socoplanner”

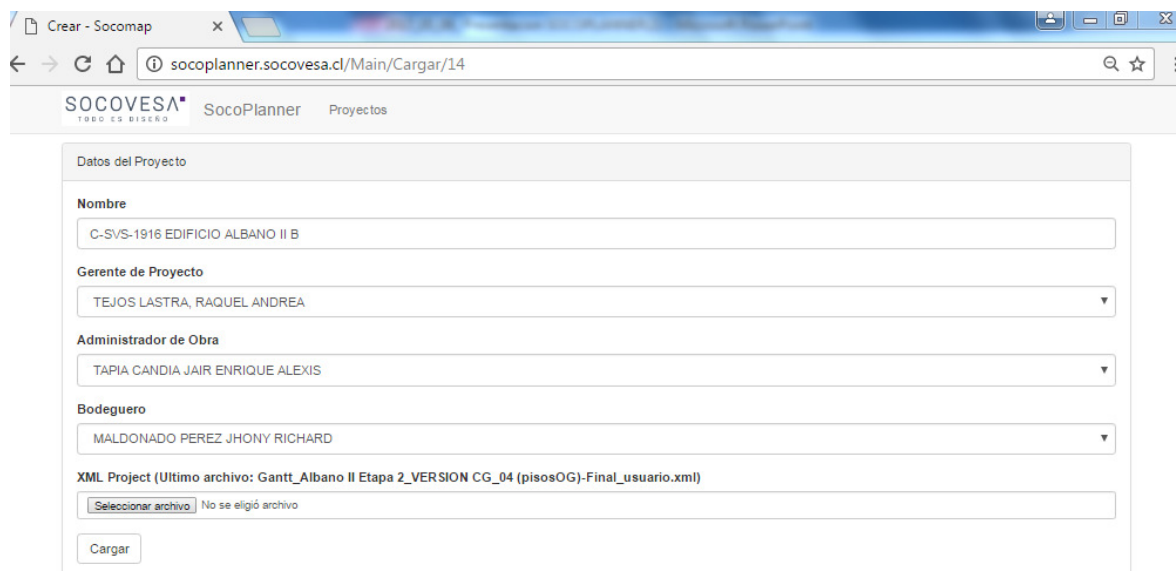


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'soco planner.socovesa.cl/Main/Cargar/14'. The page title is 'Crear - Socomap'. The header includes the 'SOCOVESA' logo and navigation links for 'SocoPlanner' and 'Proyectos'. The main form, titled 'Datos del Proyecto', contains the following fields:

- Nombre:** A text input field containing 'C-SVS-1916 EDIFICIO ALBANO II B'.
- Gerente de Proyecto:** A dropdown menu with 'TEJOS LASTRA, RAQUEL ANDREA' selected.
- Administrador de Obra:** A dropdown menu with 'TAPIA CANDIA JAIR ENRIQUE ALEXIS' selected.
- Bodeguero:** A dropdown menu with 'MALDONADO PEREZ JHONY RICHARD' selected.
- XML Project:** A section with the text '(Ultimo archivo: Gantt_Albano II Etapa 2_VERSION CG_04 (pisosOG)-Final_usuario.xml)' and a button labeled 'Seleccionar archivo'. Below the button, it says 'No se eligió archivo'.
- Cargar:** A button at the bottom of the form.

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Contando con el programa de la obra cargado, la plataforma permite observar una Carta Gantt, por medio del ícono que indica “Ver Gantt”, donde se puede ver el programa completo. Es aquí, donde se ingresa el avance, las restricciones, y además la plataforma permite imprimir el programa completo o parcial, lo que se puede seleccionar usando la herramienta de filtro de la página, donde se puede indicar una palabra, usuario, estado, periodo o fecha, para que se busquen los campos dentro de la Gantt. Además, entrega porcentajes de avance real acumulado de las partidas, procesos y proyecto en su totalidad.

Imagen N° 14: “Diagrama Gantt - Socoplanner”

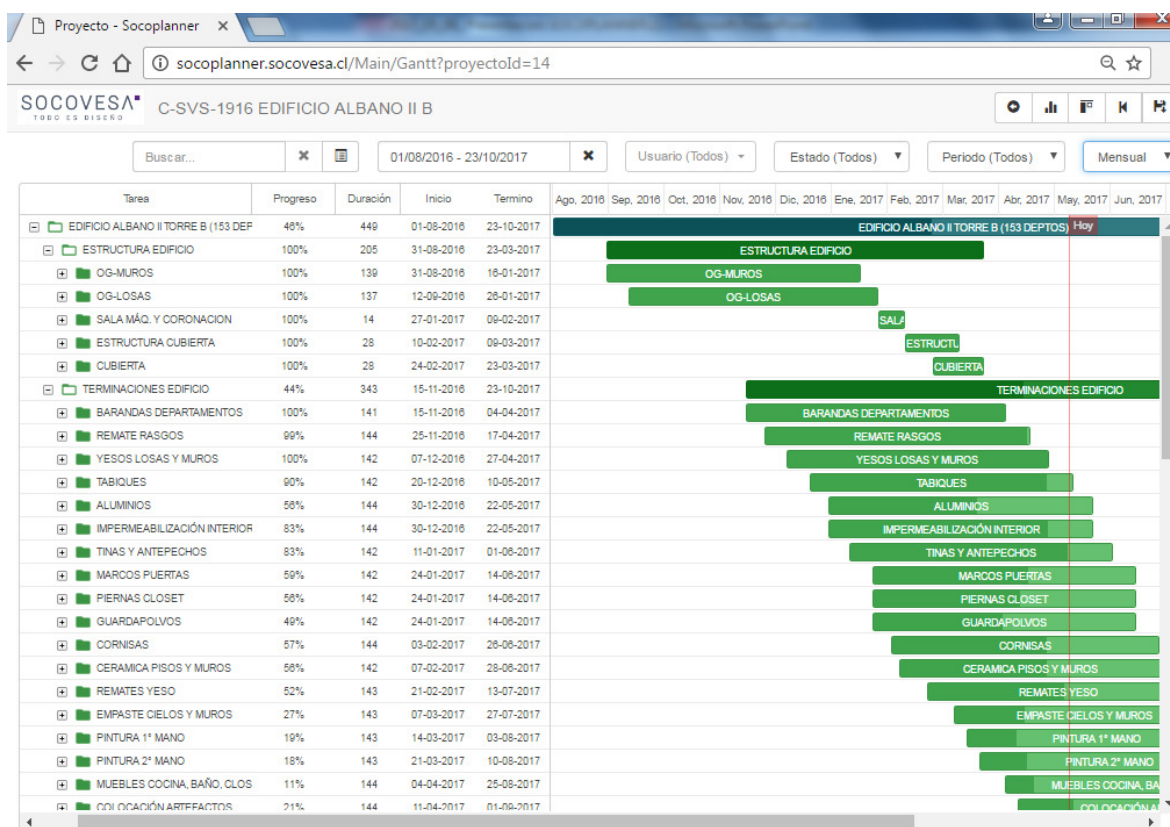

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Para ingresar avance a una partida, se debe hacer doble click sobre ella en su nivel más bajo de esquema. Luego, se desliza la barra de progreso hasta que se indique el porcentaje de avance buscado, como muestra la imagen n°15, posteriormente se debe guardar este avance. Finalmente, el Administrador de Obras o Profesional de terreno serán los encargados de validar o rechazar la información cargada, y de esta manera, esto será incluido en los reportes.

Imagen N° 15: “Ingreso de Avance y Validación a la derecha - Socoplanner”

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Es importante destacar, que en la pantalla anterior, se da la opción de indicar las restricciones de incumplimiento de los avances programados, observados a la fecha, como las que se indican en la Imagen N°16. Lo anterior, es con el fin de generar planes de acción que reviertan cualquier retraso que impacte el proyecto.

Además, al ingresar el avance se puede acceder a una bitácora de la actividad, donde se muestra que usuario ha ingresado avance a la partida, quién lo ha validado, cuándo fue ingresado, y qué porcentaje de avance se le dio, como también se señala el estado de este avance. El Departamento de Control de Gestión de la empresa, puede eliminar alguno de estos avances si es que presentan error, como también ingresarlos con fechas distintas a la del día de ingreso, ya que al ingresar avance, este se considera directamente para la semana en estudio.

Imagen N° 16: “Restricciones y bitácora de avance a la derecha - Socoplanner”

The image shows two overlapping windows from the Socoplanner software. The 'Editar Restricción' window is in the foreground, displaying a list of restriction types such as 'Indefinición de proyecto', 'Cambio planos', and 'Falta programación'. The 'Editar Tarea' window is visible in the background, showing task details for '17 CERAMICA PISOS Y MUROS', including a progress bar at 36% and a 'Bitácora' (log) table.

Usuario	Validador	Fecha	%	Estado
impachecog	impachecog	16-06-2017	12	Validada
grieto	grieto	24-06-2017	24	Validada

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Otro de los menús de Socoplanner es “Ver Reporte”, en ésta sección se pueden extraer informes, los que son equivalentes a cada uno de las planillas que contiene la herramienta CayMo, por lo que se llaman de igual manera, e excepción de la planilla de “Control de Avance”, que ahora se llama “Panel”. Estos reportes son:

- Panel
- Avances Parciales
- Mano de Obra
- Proyección
- Curva S

Es importante señalar, que se incorporó el reporte de “Curva S”, la cual puede ser generada para todo el proyecto o para una actividad puntual. Es aquí donde se grafica el avance real versus el programado, para poder realizar un análisis gráfico de la información.

Imagen N° 17: “Reporte Panel - Socoplanner”

PARTIDAS	TOTAL UNIDADES	SEMANA		ACUMULADO				RITMOS			
		PROGRAMADO	AVANCE	PROGRAMADO	AVANCE	SEM. A TERMINO	UNIDADES A TERMINO	NUEVO RITMO (PISO;VW/SEM)	RITMO REAL (PISO;VW/SEM)	COMIENZO REAL	FECHA TERMINO (PROGRAMA)
TERMINACIONES EDIFICIO											
BARANDAS DEPARTAMENTOS	14	0.00	0.00	14.00	14.00	0	0	0.00	1.17	18-11-2016	04-04-2017
REMATE RASGOS	14	0.00	0.00	14.00	13.91	-3	0.09	0.09	0.87	25-11-2016	17-04-2017
YESOS LOSAS Y MUROS	14	0.00	0.00	14.00	14.00	0	0	0.00	0.74	25-11-2016	27-04-2017
TABIQUE	14	0.33	0.00	14.00	12.56	0	1.44	1.44	0.66	09-12-2016	10-05-2017
ALUMINIOS	14	0.71	0.00	13.26	8.14	2	5.86	2.93	0.54	30-12-2016	22-05-2017
IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR	14	0.71	0.00	13.26	11.76	2	2.24	1.12	0.74	30-12-2016	22-05-2017
TINAS Y ANTEPECHOS	14	0.56	0.00	12.00	11.60	3	2.4	0.80	0.89	13-01-2017	01-06-2017
MARCOS PUERTAS	14	0.79	0.00	10.79	8.28	5	5.72	1.14	0.69	27-01-2017	14-06-2017
PIERNAS CLOSET	14	0.79	0.00	10.79	7.74	5	6.26	1.25	0.70	03-02-2017	14-06-2017
GUARDAPOLVOS	14	0.79	0.00	10.79	6.82	5	7.18	1.44	0.76	17-02-2017	14-06-2017
CORNISAS	14	0.74	0.00	9.67	8.04	7	5.96	0.85	0.67	27-01-2017	26-06-2017
CERAMICA PISOS Y MUROS	14	0.77	0.00	9.44	7.73	7	6.27	0.90	0.52	06-01-2017	28-06-2017

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Imagen N° 18: “Reporte de Avance Parciales - Socoplanner”

PARTIDAS	02-01-2017	09-01-2017	16-01-2017	23-01-2017	30-01-2017	06-02-2017	13-02-2017	20-02-2017	27-02-2017	06-03-2017	13-03-2017	20-03-2017
TERMINACIONES EDIFICIO												
BARANDAS DEPARTAMENTOS	0	0.45	1.37	1.82	1.46	0.18	0	0.18	0	0	0	0
REMATE RASGOS	2	0.14	1.51	1.16	1.18	0.97	0.86	0.88	0	0.13	0	0.01
YESOS LOSAS Y MUROS	2	0.5	0.59	0.64	1.18	1.27	1.54	0.46	0.63	0.59	0.28	0.13
TABIQUE	6	0.41	0.37	0.61	0.77	1.44	0.93	0.94	0.58	0.38	0.87	1.07
ALUMINIOS	4	0	0.21	0.29	0.07	0.35	0.55	0.5	0.68	0.61	0.73	0.78
IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR	4	0.6	0.84	0.34	0.89	0.93	1	1.18	0.66	0.87	0.42	1.02
TINAS Y ANTEPECHOS	0	0	1	1	1	0	1	0.5	1	0.3	1	1.2
MARCOS PUERTAS	0	0	0	0	0.99	0.44	0.03	0.21	2.47	0.4	0.9	0.93
PIERNAS CLOSET	0	0	0	0	0	0.3	0.96	1.08	1.15	0.28	1.03	0.18
GUARDAPOLVOS	0	0	0	0	0	0	0	1.16	1.12	0.92	0.45	0.33
CORNISAS	0	0	0	0	1.64	0.37	0.5	0.67	0.69	0.76	0.63	0.41
CERAMICA PISOS Y MUROS	0	0.18	0.45	0.39	0.52	0.32	0.78	0.43	0.73	0.38	0.82	0.46
REMATES YESO	0	0	0	0	0	0	1.92	0.5	0.49	0.33	0.51	1.09

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Imagen N° 19: “Reporte de Mano de Obra - Socoplanner”

Reporte - Socoplanner

socoplanner.socovesa.cl/Main/Reporte?proyectold=14

SOCOVESA[®] C-SVS-1916 EDIFICIO ALBANO II B

Panel Avances Parciales **Mano de Obra** Proyección Curva S

Semana 41 08-05-2017 al 14-05-2017

PARTIDAS	HD	CARGOS	PROGRAMADO	SEM. A TERMINO	NUEVO RITMO	HD	PROGRAMA	COMIENZO	FIN
			RITMO PROGRAMADO		PISO;VIV/SEM				
TERMINACIONES EDIFICIO									
BARANDAS DEPARTAMENTOS	2	--	0.70	0	0.00	0.00		15-11-2016	04-04-2017
REMATE RASGOS	4	--	0.67	-3	0.09	0.54		25-11-2016	17-04-2017
YESOS LOSAS Y MUROS	6	--	0.67	0	0.00	0.00		07-12-2016	27-04-2017
TABIQUES	15	--	0.67	0	1.44	32.40		20-12-2016	10-05-2017
ALUMINIOS	3	--	0.67	2	2.93	13.19		30-12-2016	22-05-2017
IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR	2	--	0.67	2	1.12	3.36		30-12-2016	22-05-2017
TINAS Y ANTEPECHOS	2	--	0.67	3	0.80	2.40		11-01-2017	01-06-2017
MARCOS PUERTAS	4	--	0.67	5	1.14	6.86		24-01-2017	14-06-2017
PIERNAS CLOSET	4	--	0.67	5	1.25	7.51		24-01-2017	14-06-2017
GUARDAPOLVOS	3	--	0.67	5	1.44	6.46		24-01-2017	14-06-2017
CORNISAS	3	--	0.67	7	0.85	3.83		03-02-2017	26-06-2017
CERAMICA PISOS Y MUROS	8	--	0.67	7	0.90	10.75		07-02-2017	28-06-2017

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Imagen N° 20: “Reporte de Proyección - Socoplanner”

Reporte - Socoplanner

socoplanner.socovesa.cl/Main/Reporte?proyectold=14

SOCOVESA[®]

TOOD ES DISEÑO

C-SVS-1916 EDIFICIO ALBANO II B

Panel

Avances Parciales

Mano de Obra

Proyección

Curva S

Semana 41

08-05-2017 al 14-05-2017

Ritmo Prog. Obra Gruesa 0,52

Ritmo Prog. Terminaciones 0,64


Avance Programado 56,62%

Avance Real 46,76%

PARTIDAS	PROGRAMA			ACUMULADO		CONTROL		PROYECCIÓN PROMEDIO			PROYECCIÓN MÁXIMO		
	TOTAL UNIDADES	COMIENZO	FIN	UNID. A TÉRMINO	SEM. A TÉRMINO	NUEVO RITMO PISO;VIVI/SEM	RITMO PROM. REAL	FIN PROYECTADO	SEM. ATRASO C/REND.	RITMO MAX. REAL	FIN PROYECTADO (MAX.)	SEM. ATRASO C/REND.	
			2017										
TERMINACIONES EDIFICIO													
BARANDAS DEPARTAMENTOS	14	15-11-2016	04-04-2017	0	0	0	1.17	09-04-2017	0	1.82	09-04-2017	0	
REMATE RASGOS	14	25-11-2016	17-04-2017	0.09	-3	0.09	0.87	08-05-2017	-3	2.74	08-05-2017	-3	
YESOS LOSAS Y MUROS	14	07-12-2016	27-04-2017	0	0	0	0.74	06-04-2017	0	1.54	06-04-2017	0	
TABIQUES	14	20-12-2016	10-05-2017	1.44	0	1.44	0.66	23-05-2017	-1.71	1.44	15-05-2017	-0.71	
ALUMINIOS	14	30-12-2016	22-05-2017	5.86	2	2.93	0.54	22-07-2017	-8	1.53	03-06-2017	-1	
IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR	14	30-12-2016	22-05-2017	2.24	2	1.12	0.74	29-05-2017	-1	1.18	21-05-2017	1	


Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Imagen N° 21: “Reporte de Curva S - Socoplanner”

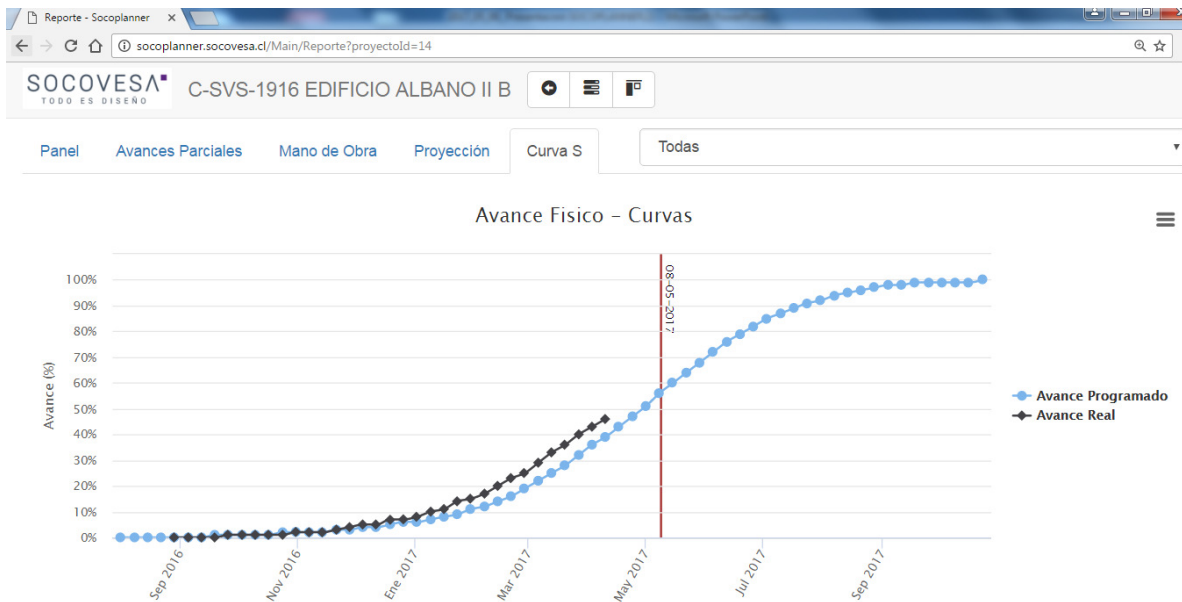

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Imagen N° 22: “Curva S de una partida - Socoplanner”

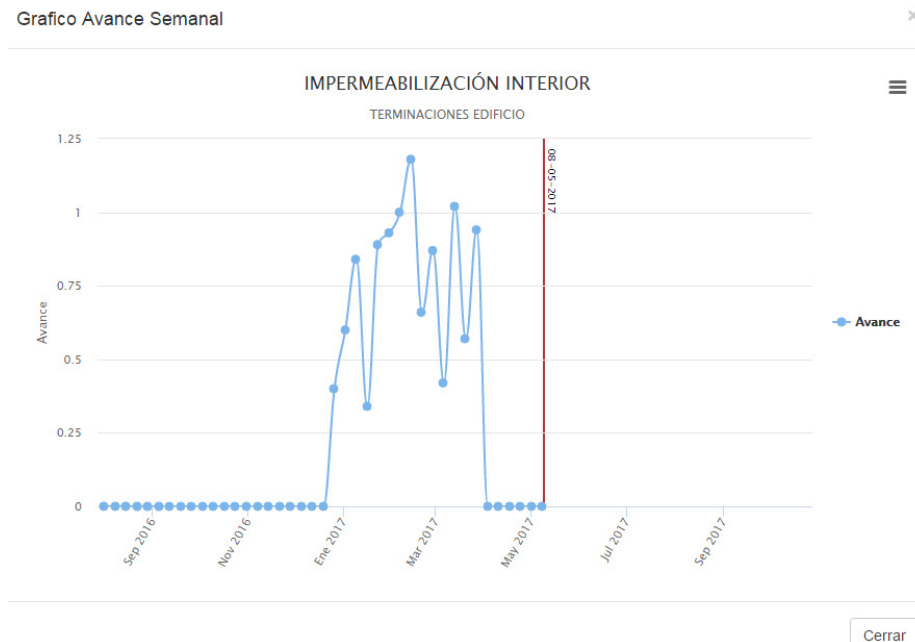

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Por otro lado, se encuentra la herramienta “Ver Tablero”, la que sirve para ver el proyecto en forma de calendario, donde se pueden analizar las actividades que se deben realizar en la semana en curso de manera más clara, como también ver las atrasadas. Además, se permite cambiar la semana en análisis, donde también al posicionar el cursos en una actividad, se colorear todas las actividades que llevan el mismo nombre, que se encuentran repartidas en la semana (como se muestra en la Imagen N°23).

Imagen N° 23: “Tablero de actividades de la semana - Socoplanner”

	Lunes, 03 jul.	Martes, 04 jul.	Miércoles, 05 jul.	Jueves, 06 jul.	Viernes, 07 jul.
VIV N°65-REHATE RASGOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°59-TAPADO CIELOS	VIV N°66-ESTRUCTURACIÓN DE CIELOS	VIV N°66-ESTRUCTURACIÓN DE CIELOS	VIV N°5-ESTUCOS EXTERIORES
VIV N°66-REHATE RASGOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°60-TAPADO CIELOS	VIV N°63-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CIELOS	VIV N°63-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CIELOS	VIV N°6-ESTUCOS EXTERIORES
VIV N°63-INSTALACIÓN DE ESCALA PRE FABRICADA	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°61-AISLACIÓN CIELOS	VIV N°64-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CIELOS	VIV N°64-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CIELOS	VIV N°3-PINTURA EXTERIOR 1ERA MANO
VIV N°64-INSTALACIÓN DE ESCALA PRE FABRICADA	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°62-AISLACIÓN CIELOS	VIV N°61-AISLACIÓN CIELOS	VIV N°61-AISLACIÓN CIELOS	VIV N°4-PINTURA EXTERIOR 1ERA MANO
VIV N°61-ESTRUCTURACIÓN DE CIELOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°63-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CIELOS	VIV N°62-AISLACIÓN CIELOS	VIV N°62-AISLACIÓN CIELOS	VIV N°1-PINTURA EXTERIOR 2a MANO
VIV N°64-ESTRUCTURACIÓN DE CIELOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°64-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CIELOS	VIV N°59-TAPADO CIELOS	VIV N°59-TAPADO CIELOS	VIV N°2-PINTURA EXTERIOR 2a MANO
VIV N°62-ESTRUCTURACIÓN DE CIELOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°65-ESTRUCTURACIÓN DE CIELOS	VIV N°60-TAPADO CIELOS	VIV N°60-TAPADO CIELOS	VIV N°5-ESTRUCTURACIÓN DE CIELOS
VIV N°59-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CIELOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°66-ESTRUCTURACIÓN DE CIELOS	VIV N°57-ESTRUCTURA TABIQUES	VIV N°57-ESTRUCTURA TABIQUES	VIV N°6-INSTALACIÓN ALC + AP TABIQUES
VIV N°60-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CIELOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°67-INSTALACIÓN DE ESCALA PRE FABRICADA	VIV N°58-ESTRUCTURA TABIQUES	VIV N°58-ESTRUCTURA TABIQUES	VIV N°3-REVESTIMIENTO TABIQUES
VIV N°57-AISLACIÓN CIELOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°68-INSTALACIÓN DE ESCALA PRE FABRICADA	VIV N°55-INSTALACIÓN ELÉCTRICA TABIQUES	VIV N°55-INSTALACIÓN ELÉCTRICA TABIQUES	VIV N°4-REVESTIMIENTO TABIQUES
VIV N°58-AISLACIÓN CIELOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°69-REHATE RASGOS	VIV N°56-INSTALACIÓN ELÉCTRICA TABIQUES	VIV N°56-INSTALACIÓN ELÉCTRICA TABIQUES	VIV N°1-REHATE YESO INTERIOR
VIV N°55-TAPADO CIELOS	30-06-2017 al 03-07-2017	VIV N°70-REHATE RASGOS	VIV N°53-INSTALACIÓN ALC + AP TABIQUES	VIV N°53-INSTALACIÓN ALC + AP TABIQUES	VIV N°2-REHATE YESO INTERIOR
VIV N°56-TAPADO CIELOS	30-06-2017 al 03-07-2017		VIV N°54-INSTALACIÓN ALC + AP TABIQUES	VIV N°54-INSTALACIÓN ALC + AP TABIQUES	VIV N°49-INTERHEABILIZACIÓN BAÑOS

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Finalmente, el último tablero que ofrece Socoplanner, consiste en la herramienta “Ver Reporte de Estado”. Este reporte fue el último en ser creado, y se generó por la necesidad de los Administradores de Obras, de saber que faenas estaban a la espera de validación de avance. Además, esta herramienta permite conocer que partidas se encuentran completadas, pendientes y atrasadas, como también filtrar la búsqueda o analizar las restricciones existentes.

Imagen N° 24: “Reporte de estado - Socoplanner”


ID	NOMBRE	COMIENZO PROC.	FIN PROC.	%	ESTADO	VALID. POBL.	TIENE RECTIF.
7322	SOCIALIZADO	16-09-2016	16-11-2016	100%	COMPLETADA	NO	0
7324	MOVIMIENTO DE TIERRA	03-11-2016	15-12-2016	97%	ATRASADA	NO	0
7327	FUNDACIONES	12-01-2017	06-03-2017	97%	ATRASADA	NO	0
7329	OG-2 SUBT-MUROS	26-01-2017	08-03-2017	95%	ATRASADA	NO	0
7330	OG-1 SUBT-MUROS	09-03-2017	20-04-2017	80%	ATRASADA	NO	0
7332	OG-2 SUBT-LOSAS	09-03-2017	05-04-2017	86%	ATRASADA	NO	0
7333	OG-1 SUBT-LOSAS	21-04-2017	19-05-2017	74%	ATRASADA	NO	0
7335	OG-SUBT-RAMPA, TRAMO 1	23-03-2017	29-03-2017	0%	ATRASADA	NO	0
7336	OG-SUBT-RAMPA, TRAMO 2	22-05-2017	26-05-2017	0%	ATRASADA	NO	0
7338	OG-2 SUBT-RADIER	13-02-2017	10-03-2017	85%	ATRASADA	NO	0
7341	OG-MUROS-1	28-04-2017	09-05-2017	96%	ATRASADA	NO	0
7342	OG-MUROS-2	09-05-2017	16-05-2017	67%	ATRASADA	NO	0
7343	OG-MUROS-3	11-05-2017	24-05-2017	41%	ATRASADA	NO	0
7344	OG-MUROS-4	25-05-2017	01-06-2017	3%	ATRASADA	NO	0
7345	OG-MUROS-5	02-06-2017	09-06-2017	0%	ATRASADA	NO	0
7346	OG-MUROS-6	12-06-2017	19-06-2017	0%	ATRASADA	NO	0
7347	OG-MUROS-7	20-06-2017	27-06-2017	100%	COMPLETADA	NO	0
7348	OG-MUROS-8	28-06-2017	06-07-2017	0%	PENDIENTE	NO	0
7349	OG-MUROS-9	07-07-2017	14-07-2017	0%	PENDIENTE	NO	0
7350	OG-MUROS-10	17-07-2017	24-07-2017	0%	PENDIENTE	NO	0
7351	OG-MUROS-11	25-07-2017	01-08-2017	0%	PENDIENTE	NO	0
7352	OG-MUROS-12	02-08-2017	09-08-2017	0%	PENDIENTE	NO	0
7353	OG-MUROS-13	10-08-2017	18-08-2017	0%	PENDIENTE	NO	0
7354	OG-MUROS-14	21-08-2017	29-08-2017	0%	PENDIENTE	NO	0
7355	OG-MUROS-15	29-08-2017	05-09-2017	0%	PENDIENTE	NO	0
7357	OG-LOSAB-1	09-05-2017	16-05-2017	79%	ATRASADA	NO	0
7358	OG-LOSAB-2	17-06-2017	24-06-2017	63%	ATRASADA	NO	0
7359	OG-LOSAB-3	25-05-2017	01-06-2017	41%	ATRASADA	NO	0
7360	OG-LOSAB-4	02-06-2017	09-06-2017	0%	ATRASADA	NO	0
7361	OG-LOSAB-5	12-06-2017	19-06-2017	0%	ATRASADA	NO	0

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

La creación inicial de esta plataforma web demoró 5 meses, donde su primera prueba fue en Febrero del 2017, donde se contaba con la Gantt y los Reportes, pero sin la curva S. Todas las planillas antes mencionadas, se encuentra actualmente en funcionamiento y está siendo utilizado por seis obras de la empresa Constructora Socovesa Santiago, pero de a poco se están incorporando el resto. Donde para fines del año 2017 se deberían haber incorporado todas a este nuevo sistema, y algunas estar usando ya la aplicación móvil, la cual aún se encuentra en desarrollo.

La aplicación móvil se encuentra actualmente en modelación, y debería estar lista a fines de Septiembre del 2017. Actualmente se está diseñando una aplicación móvil, donde los capataces de las obras por medio de un Smartphone ingresarán su usuario, y podrán acceder a la información de su proyecto.


Imagen N° 25: “Maqueta inicio de sesión – App Socoplanner”

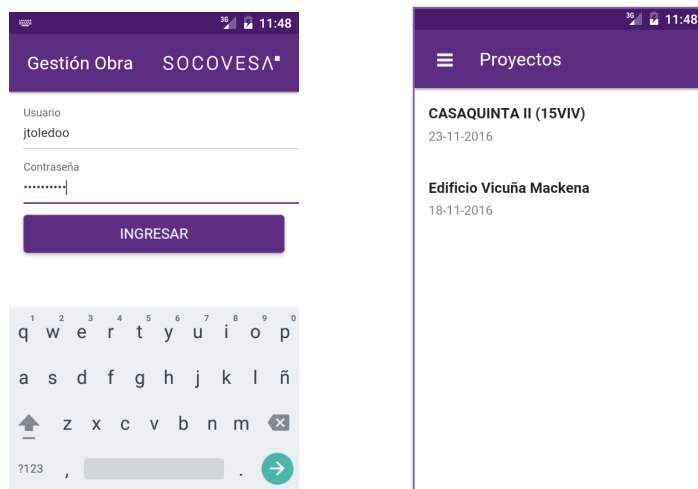

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)


Dentro de esta aplicación móvil, se han diseñado maquetas para el ingreso de avance por medio de los capataces, como también para la validación que deben realizar los Profesionales de Terreno y Administradores de Obra. Además, la aplicación muestra el estado de las diversas actividades, indicando cuando ellas se encuentran pendientes de ejecución, esperando validación, completados o atrasadas, como se muestra en la imagen n° 27. Lo importante es que la aplicación móvil muestre la misma información que la plataforma web.

Imagen N° 26: “Maqueta ingreso de avance y validación - App Socoplanner”

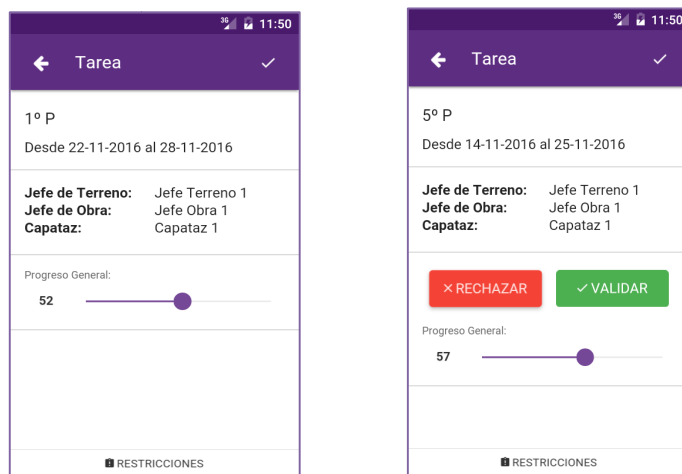

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Imagen N° 27: “Maqueta Reporte de Estado – App Socoplanner”

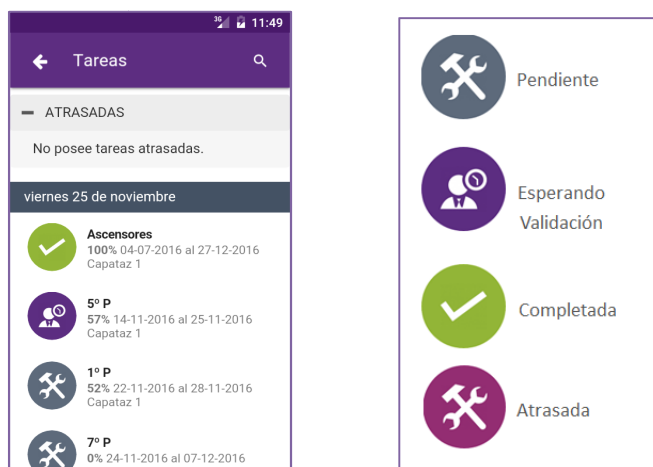

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Por otro lado, se está trabajando en la generación de nuevas herramientas, como lo es un “Reporte de Cumplimiento”, donde se muestre el PAC de cada capataz. Y también, la creación de “Control de Avance Gráfico”, donde por medio de planos, se pintarán las unidades que se deben realizar de una partida determinada, es decir, para un proyecto de edificación en extensión, se pintarán las casas en las que se debe realizar la faena consultada, esa semana, y para edificios, se pintarán los departamentos en donde se debe realizar la tarea seleccionada.

Imagen N° 28: “Maqueta de Control de Avance Gráfico - Socoplanner”




Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

4.8 Evaluación preliminar de Socoplanner

La plataforma Socoplanner, fue ideada para colaborar con el control de avance de la empresa Constructora Socovesa Santiago, con la finalidad de entregar indicadores, que a partir de una planificación programada, que proporciona datos como la duración del proyecto, el ritmo con que se debe realizar el proyecto, y con cuenta mano de obra, en conjunto con los datos obtenidos directamente de terreno, en cuanto al avance físico real, la plataforma proyecta el término del proyecto, como también es necesario que pueda indicar cómo se puede llegar a la fecha de término programada.

Esquema N° 4: “Flujo de información en Socoplanner”

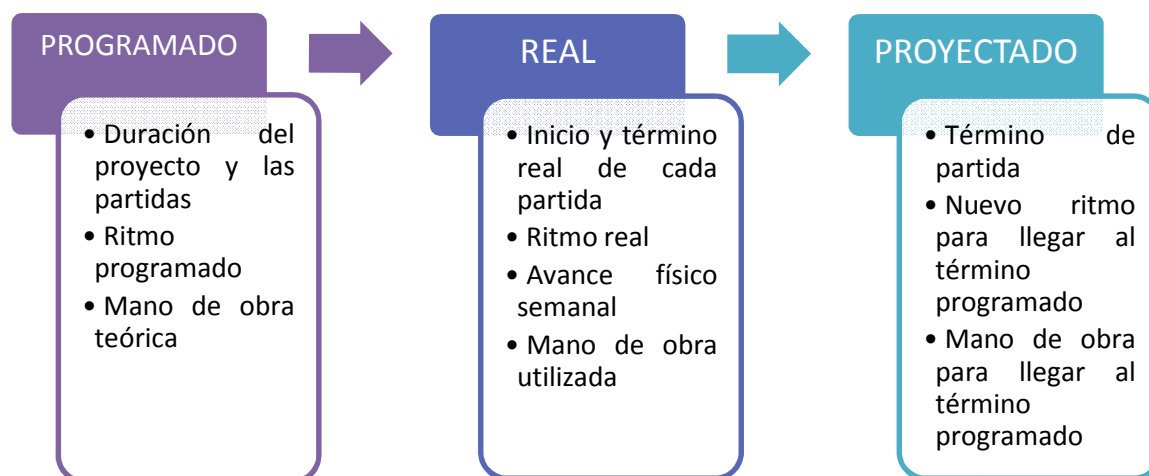

Fuente: Elaboración propia

Es importante que, de la misma manera en que se compararon las plataformas que existen actualmente en el mercado, para el control de la programación de proyectos, se genere una comparación incluyendo esta vez las plataformas de CayMo y Socoplanner, para así ver si existen fronteras que se deban evaluar a futuro.

Tabla N° 3: “Comparativo de Socoplanner con otras herramientas de control de planificación”

	MS Project	ProPlanner	Foco en obra	CayMo	Socoplanner
Carta Gantt	X	X	X	X	X
Plataforma online		X			X
Asignación de costos	X		X		
Asignación de personal	X	X	X	X	X
Asignación de Subcontratos		X	X		
Filosofía Lean		X			X
Informes costos	X		X		
Informes de asignaciones	X	X	X		X
Informe de actividades actuales	X	X	X		X
Reprogramar		X			
Indicadores de rendimientos		X	X	X	X
Cálculo de ritmos			X	X	X
Registro de avances parciales		X	X	X	X
Curvas de progreso		X	X		X
Proyección de término			X	X	X
Proyección de mano de obra				X	X
Filtro en tableros		X	X		X
Aplicación móvil		X			X

Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar en la tabla anterior, que Socoplanner no cuenta con elementos de control de costo, esto se da principalmente porque la empresa estudiada no ve la necesidad de juntar estos dos controles de gestión, por lo que prefieren hacer análisis separados. Es por lo anterior, que la propuesta de Socoplanner extrae la mayor cantidad de beneficios de cada una de las herramientas existentes en el mercado de control de planificación, y también utilizando como principal base la herramienta CayMo, de Control de Avance y Mano de Obra.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5. 1. Aumentos de presupuesto por atraso en entrega de proyectos

En el periodo analizado, entre el año 2011 y 2016, la empresa Constructora Socovesa Santiago ha ejecutado alrededor de 50 proyectos de edificación en extensión, casas, donde la duración de sus construcciones había sido estimada para ser realizada en un periodo promedio de 1,5 años. Pero se tuvo una desviación que llegó a ser de 12 meses, en un proyecto ejecutado el año 2013 en Graneros.

Es por lo anterior, que se hace necesario evaluar los aumentos de plazos que se han producido en este periodo, como también las ampliaciones en los presupuestos de los proyectos, debido a este mismo aumento de plazo. Para de esta manera, justificar la importancia de contar con un sistema de control de la planificación de un proyecto, cuyo resultado será finalizar los proyectos dentro del plazo y presupuesto planificado.


Tabla N° 4: “Evaluación de presupuesto y atrasos de los proyectos, entre el 2011 y 2016”

Año	Cantidad Proyectos	PRESUPUESTO			PLAZOS		
		Total [UF]	Aumento [UF]	%	Total [mes]	Atraso [mes]	%
2011	12	1.898.600	54.502	2,87%	212	24	11,5%
2012	15	3.272.797	65.041	1,99%	277	48	17,5%
2013	10	2.023.217	42.199	2,09%	146	42	29,1%
2014	3	469.131	1.797	0,38%	34	4	11,7%
2015	5	825.235	3.406	0,41%	53	5	9,6%
2016	4	500.498	782	0,16%	36	2	5,7%
TOTAL	49	8.989.479	167.729		758	126	
PROMEDIO PONDERADO				1,87%	PROMEDIO PONDERADO		16,7%
PRESUPUESTO PROMEDIO POR PROYECTO				183.459	PLAZO PROMEDIO POR PROYECTO		15,5
AUMENTO POR PROYECTO				3.423	ATRASO POR PROYECTO		2,6

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en promedio en los 6 años estudiados, los proyectos tuvieron un aumento de presupuesto de un 1,87%, que equivale a 3.423 UF en promedio para un proyecto, donde para el total de las obras estudiadas se tuvo un aumento de presupuesto de 167.729 UF, que es lo equivalente a construir un proyecto de 30 casas en la localidad de Chamisero, como el proyecto “Mirador de Singular”. Además, en cuanto al aumento de plazos se puede observar que se presentó para este periodo un atraso del 16,7%, es decir, a 2,6 meses por proyecto en promedio, donde el total del periodo corresponde a 126 meses.

Gráfico N° 1: “Evaluación de presupuesto menos proyección y aumento de plazos”

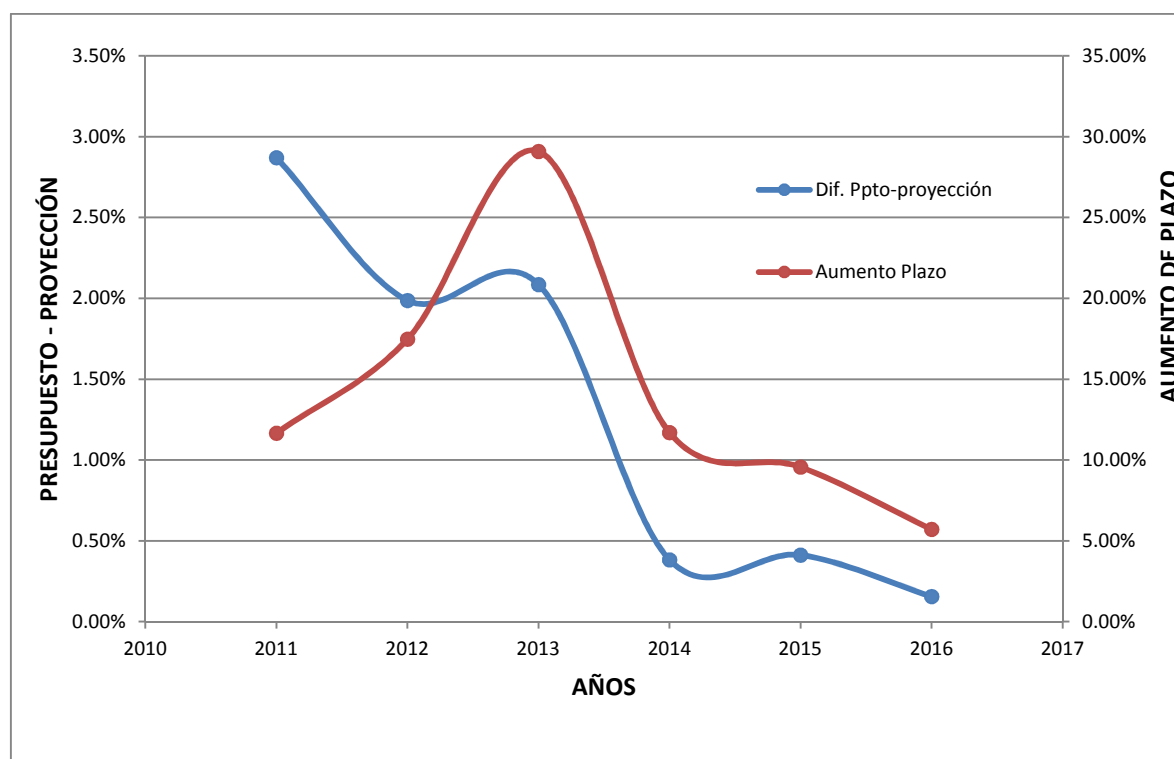

Fuente: Elaboración propia

La directa relación entre el aumento de plazos con la ampliación de presupuestos, está representada en la gráfica anterior, donde además se puede extraer que dicha tendencia fue en disminución en el año 2016, evidenciado también en la tabla n°4, que muestra una disminución significativa de los atrasos en los proyecto, esto dado por el comienzo de la utilización de la herramienta CayMo en los proyectos en que se implementó esta herramienta, los cuales equivalen a la mitad de los realizados en ese año.


Además, para este análisis es necesario tener en cuenta la cantidad de viviendas construidas, superficie de los proyectos, como también, los presupuestos que se dieron en estos 6 años, para así observar el movimiento del sector construcción al interior de la empresa Constructora Socovesa Santiago, como también, la directa relación entre dichos indicadores.

Tabla N° 5: “Evaluación de presupuesto, superficie construida y cantidad de viviendas”

	Cantidad de Viviendas	Superficie Construida (m ²)	Presupuesto Total (UF)
2011	946	89.814	1.898.600
2012	2.491	172.133	3.272.797
2013	771	69.165	2.023.217
2014	110	16.450	469.131
2015	630	40.833	825.235
2016	98	12.393	500.498

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 2: “Evaluación de presupuesto, superficie construida y cantidad de viviendas”

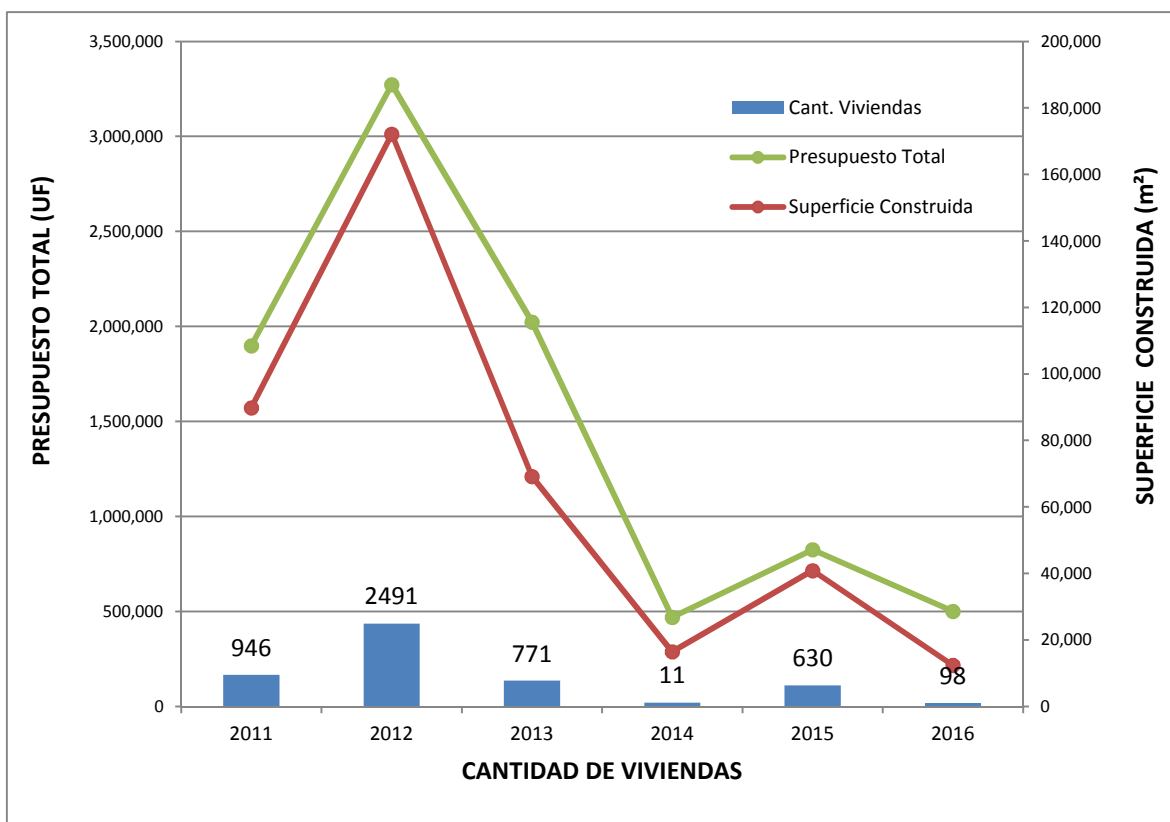

Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en la gráfica anterior, las tres variables se encuentran relacionadas, es decir, cuando se deseen construir una mayor cantidad de casas, se construirá una superficie mayor, y por ende, se necesitará más presupuesto para realizarlo. Donde también es necesario considerar el lugar en que se emplazará el proyecto, como también el costo de sus materiales de construcción, pero que para este análisis se tomarán como similares.

Es importante destacar, que en el año 2012 se construyeron la mayor cantidad de viviendas, y por ende, la superficie construida y el presupuesto total también fueron los mayores del periodo analizado. Es por lo que se puede deducir, que en este periodo los aumentos de plazos y presupuestos cuentan con un valor significativo, lo que corresponden a un 17% y 2% respectivamente, equivale a gastar más de 65.000 UF por un atraso total de 48 meses. Lo que se debe tener en cuenta, ya que con dicho monto se puede construir un proyecto de 40 viviendas en Machalí, de haber tenido un correcto sistema de control de planificación.

5.2 Ahorro por reprogramación de los 4 proyectos estudiados

5.2.1 Vicuña Mackenna

Los 4 proyectos intervenidos con la herramienta CayMo, para que terminaran antes del 31 de Diciembre del 2016, fueron evaluados primeramente para analizar si era conveniente o no acelerar sus programas. Esto dado que se debía invertir tanto en mano de obra como en materiales, para generar una aceleración dado el aumento de ritmo que sugería CayMo. Donde este valor debía ser menor al gasto de pagar el IVA por parte de la inmobiliaria, ya que el proyecto se estaba vendiendo sin IVA a los clientes, arriesgándose a pensar que el proyecto terminaría en Diciembre del 2016.

Para el proyecto Vicuña Mackenna, que corresponde a un edificio con 182 departamentos, que debía recoger su programa en alrededor de 2 meses, se generaron sobrecostos para acelerar el proyecto de 4.659 UF en cuanto a la mano de obra, en cambio en insumos adicionales, se gastaron 707 UF, lo que da un total de 5.366 UF invertidas para que el proyecto se pudiera vender sin IVA, lo cual como se mencionó antes ya se estaba haciendo. Así que en caso de no cumplir con el plazo,

y tener que vender con IVA, la empresa sería la encargada de absorber este gasto, ya que no se les podría cobrar a los compradores dicha diferencia.

Tabla N° 6: “Costo adicional por Incentivo Mano de Obra – Vicuña Mackenna”

	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Aumento dotación traslado materiales	GL	1	816	816
Incentivos Mandos Medios	GL	1	674	674
Incentivos Mandos Medios	GL	1	339	3402
Aumento Supervisión	GL	1	884	884
Incentivo Enfierradura	GL	1	194	194
Incentivo Moldajes	GL	1	141	141
Incentivo Subcontrato Tabiques	GL	1	141	141
Incentivo subcontrato Yeso	GL	1	150	150
Incentivo subcontrato Fachada y mezclas	GL	1	123	123
Incentivo subcontrato papel mural	GL	1	148	148
Arriendo Bimástil	GL	1	500	500
Aumento Arriendo Moldajes	GL	1	546	546
TOTAL DIRECTO				4.659

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 7: “Costos por Insumos Adicionales – Vicuña Mackenna”

	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Cambio Cerámicos por vinílicos	GL	1	252	252
Cambio retapes de piso	GL	1	354	354
Aumento dotación herramientas y lockers	GL	1	102	102
TOTAL DIRECTO				707

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Por otro lado, para analizar la diferencia entre que se tenga que aplicar o no el IVA, se debe hacer un comparación tanto de los ingresos de la inmobiliaria, como el precio final del proyecto y de una unidad de departamento, como se muestra en la tabla n° 8.

Tabla N° 8: “Análisis de impacto de la Reforma Tributaria en Proyecto Vicuña Mackenna”

	ANTES DE LA REFORMA TRIBUTARIA		CON LA REFORMA TRIBUTARIA	
INGRESOS	452.085	100,0%	405.570	100,0%
Costo Directo	185.027	40,9%	185.027	45,6%
Gastos Generales	47.051	10,4%	47.051	11,6%
Urbanización Int. + estructurante	0	0,0%	0	0,0%
GAV Constructora	12.738	2,8%	12.738	3,1%
Costos Construcción Total	244.815	54,2%	244.815	60,4%
IVA	46.515	10,3%	0	0,0%
Crédito Especial	-30.235	-6,7%	-30.235	-7,5%
IVA Neto	16.280	3,6%	-30.235	-7,5%
Terreno	71.114	15,7%	71.114	17,5%
Urbanización Estructurante	0	0,0%	0	0,0%
Otros Costos	24.591	5,4%	24.591	6,1%
Costo Total	356.801	78,9%	310.286	76,5%
Margen Contable	95.284	21,1%	95.284	23,5%
GAV + intereses	48.222	10,7%	48.222	11,9%
Utilidad	47.062	10,4%	47.062	11,6%
	TOTAL			
INGRESOS INMOBILIARIA	452.085		405.570	
IVA 19% (EXCEPTO TERRENO)	0		63.547	
PRECIO FINAL UF	452.085		469.117	3,8%
PRECIO FINAL UF/UNID	2.484		2.578	94
PRECIO FINAL UF/M²	45,5		47,2	1,7

Fuente: (Inmobiliaria Socovesa Santiago SA, 2016)

En la tabla anterior, se presentan los siguientes términos:

- Costo Directo: Es el gasto producido por construir la edificación, en el caso del edificación en altura, corresponde tanto al edificio, como a sus subterráneos. En cambio en edificación en extensión, el costo corresponde al costo de construir las casas.
- Gastos Generales: Corresponden a los gastos de administración del proyecto.
- Urbanización Int. + Estructurante: Para la edificación en altura, corresponde a todo el proyecto de pavimentación y obras que solicita el SERVIU, como el cuello de acceso al edificio, veredas, repavimentaciones, o solicitudes de análisis vial básico, como también pedidos realizados por la municipalidad. En cambio, para proyectos de edificación en

extensión, corresponde a todas las pavimentaciones interiores de un condominio, y también, todas las obras de urbanización, como alumbrado.

- GAV constructora: Corresponde a los gastos de administración y venta del proyecto, donde se considera lo que no es imputable directamente a los proyectos, es decir, lo generado por la administración central, oficina central, de la Constructora.
- Costo Construcción Total: Incluye todos los gastos que genera la construcción.

$$\text{Costo Const Total} = \text{Costo directo} + \text{Gastos Grales} + (\text{Urb Int} + \text{Estr}) + \text{GAV Const} \quad (25)$$

- Crédito Especial: Corresponde al Crédito Especial de Empresas Constructoras (CEEC), que tienen derecho las viviendas con destino habitacional que no superen las 4.500 UF. Puede ser utilizado por las empresas constructoras, donde el monto de beneficio no puede superar las 225 UF. Es importante señalar, que este beneficio tributario ha sufrido modificaciones dentro del último tipo, quedando su aplicación de la siguiente manera (SII, 2017):
 - En la venta de inmuebles para habitación y en los contratos generales de construcción a suma alzada, que se suscriban hasta el 31/12/2014 es de 4.500 UF.
 - En las ventas de inmuebles efectuadas a contar del 01/01/2015 al 31/12/2015 y en los contratos generales de construcción a suma alzada que se suscriban a contar del 01/01/2015 hasta el 31/12/2015, el tope al valor de construcción de las viviendas será de 4.000 UF. (Situación de los proyectos estudiados)
 - En las ventas de inmuebles efectuadas a contar del 01/01/2016 al 31/12/2016 y en los contratos generales de construcción a suma alzada que se suscriban a contar del 01/01/2016 hasta el 31/12/2016, el tope al valor de construcción de las viviendas será de 3.000 UF.
 - En las ventas de inmuebles efectuadas desde el 01/01/2017 en adelante y en los contratos generales de construcción a suma alzada que se suscriban desde el 01/01/2017 en adelante, el tope al valor de construcción de las viviendas será de 2.000 UF.

- Terreno: Corresponde al valor del terreno, el que sí es utilizado para construir antes de 3 años desde la compra, su valor corresponde a dos veces el avalúo fiscal. En caso de ser utilizado posterior a los 3 años de adquirido, su valor puede ser el equivalente al valor comercial.
- Urbanización Estructurante: Este costo se aplica solo en casas o proyectos de más de una etapa. Donde el valor corresponde a la urbanización y estructurante confeccionada en las etapas anteriores y que son atribuibles al proyecto.
- Otros costos: Este costo considera tanto los proyectistas, como los permisos municipales, mitigación vial, reforestación, mecánica de suelo, entre otros. Además, aquí se puede considerar el gasto que implica el marketing del proyecto, y el gasto financiero, que corresponde al interés del préstamo al banco.
- Costo total: Corresponde a la suma entre el costo construcción, su respectivo IVA neto, el costo del terreno y de urbanización estructurante, más los otros costos asociados.

$$\text{Costo Total} = \text{Costo Const Total} + \text{IVA neto} + \text{Terreno} + \text{Urb Estruct} + \text{Otros costos} \quad (26)$$

- Margen contable: Corresponde al saldo que queda entre los ingresos y el costo total.

$$\text{Margen Contable} = \text{Ingresos} - \text{Costo Total} \quad (27)$$

- GAV + intereses: Considera los gastos de administración y venta del proyecto, como también los intereses generados por la inmobiliaria. Aquí se incluye la mantención de stock, marketing y gastos a causa de la post venta.
- Utilidad: Corresponde al saldo existente entre el margen contable y el GAV de la inmobiliaria.

$$\text{Utilidad} = \text{Margen contable} - (\text{GAV} + \text{intereses}) \quad (28)$$

- Ingreso inmobiliaria: Considera la suma entre el costo total, GAV de la inmobiliaria y la utilidad.

$$\text{Ingreso Inmobiliaria} = \text{Costo Total} + (\text{GAV} + \text{intereses}) + \text{Utilidad} \quad (29)$$

- IVA: Es el Impuesto sobre el Valor Agregado, el cual antes de la reforma tributaria se aplicaba sobre el costo de construcción, al cual se le descontaba el Crédito Especial, para así considerar un IVA neto dentro del Costo Total. Luego de la aplicación de la reforma, se aplica sobre la suma de las utilidades, GAV inmobiliaria, Costo total, menos el terreno.

- Antes de la Reforma Tributaria:

$$\text{IVA} = \text{Costo Construcción Total} * 0,19 \quad (30)$$

- Con la Reforma Tributaria

$$\text{IVA} = [\text{Costo Total} + \text{Utilidad} + (\text{GAV} + \text{intereses}) - \text{Terreno}] * 0,19 \quad (31)$$

- Precio Final UF: Corresponde al precio final del proyecto. Se calcula sumando los ingresos de la inmobiliaria con el IVA, si es que el proyecto se realiza bajo la reforma tributaria, de caso contrario, corresponde a los ingresos de la inmobiliaria solamente.

- Antes de la Reforma Tributaria

$$\text{Precio Final UF} = \text{Ingresos Inmobiliaria} \quad (32)$$

- Con la Reforma Tributaria

$$\text{Precio Final UF} = \text{Ingresos Inmobiliaria} + \text{IVA} \quad (33)$$

- Precio final UF/UNID: Corresponde al valor que tendrá una vivienda, ya sea casa o departamento. Se calcula como el precio final del proyecto, dividido por la cantidad de viviendas.

$$\text{Precio Final (UF/Unid)} = \frac{\text{Precio Final UF}}{\text{Unidades}} \quad (34)$$

- Precio Final UF/M²: Corresponde al valor que tendrá, en UF, cada metro cuadrado construido. Se obtiene al dividir el precio final del proyecto, por su cantidad de metros cuadrados.

$$\text{Precio Final (UF/m}^2\text{)} = \frac{\text{Precio Final UF}}{\text{Metro Cuadrados Construidos}} \quad (35)$$

De los cálculos anteriormente mostrados en la Tabla n°8, se puede extraer que el proyecto tiene un precio inferior antes de la reforma tributaria, arrojando una diferencia de 17.032 UF, lo cual es sumamente mayor al sobrecosto que se tuvo por acelerar el ritmo de la obra, el que fue de 5.366 UF, lo que equivale a casi un tercio del valor ahorrado. Es por lo que en este proyecto se justifica totalmente la utilización de un sistema de control de planificación, para lograr construir dentro del plazo en que aún no regía la Reforma Tributaria. Donde CayMo mostró la necesidad de aumentar la mano de obra, por lo que se invirtieron más de 4.000 UF en esto.

Tabla N° 9: “Evaluación del impacto de la aceleración del proyecto Vicuña Mackenna”

Costo adicional por Incentivo Mano de Obra	4.659 UF	Precio antes de Reforma Tributaria	452.085 UF
Costos por Insumos Adicionales	707 UF	Precio con Reforma Tributaria	469.117 UF
Sobrecosto Total	5.366 UF	Ahorro Total	17.032 UF
DIFERENCIA		11.666 UF	

Fuente: Elaboración Propia

5.2.3 Alto Los Bravos

Para el proyecto Alto Los Bravos, condominio de 22 casas ubicadas en Lo Barnechea, se tuvo una programación más bien ajustada, por lo que se presentaron los siguientes sobrecostos de aceleración:

Tabla N° 10: “Costo adicional por Incentivo Mano de Obra – Alto Los Bravos”

	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Aumento de supervisión	Mes	3	37	111
Cuadrilla de Moldajes	Mes	3	40	120
Ayudantes de apoyo a Subcontratos	Mes	6	19	114
TOTAL DIRECTO				345

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 11: “Costos por Insumos Adicionales – Alto Los Bravos”

	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2da Grúa	Mes	3	181	543
Moldajes	Mes	3	80	240
TOTAL DIRECTO				783

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Por lo tanto, se tuvo un gasto de 1.128 UF, entre insumos adicionales e incentivos a la mano de obra. En cuanto a la diferencia del precio final del proyecto, considerando las situaciones en que aplica y no la Reforma Tributaria, se tiene la siguiente situación:

Tabla N° 12: “Análisis de impacto de la Reforma Tributaria en Proyecto Alto Los Bravos”

	ANTES DE LA REFORMA TRIBUTARIA		CON LA REFORMA TRIBUTARIA	
INGRESOS	314.600	100,0%	286.437	100,0%
Costo Directo	77.123	24,5%	77.123	26,9%
Gastos Generales	26.133	8,3%	26.133	9,1%
Urbanización Int. + estructurante	42.065	13,4%	42.065	14,7%
GAV Constructora	2.906	0,9%	2.906	1,0%
Costos Construcción Total	148.228	47,1%	148.228	51,7%
IVA	28.163	9,0%	0	0,0%
Crédito Especial	-4.950	-1,6%	-4.950	-1,7%
IVA Neto	23.163	7,4%	-4.950	-1,7%
Terreno	31.932	10,1%	31.932	11,1%
Urbanización Estructurante	14.027	4,5%	14.027	4,9%
Otros Costos	18.326	5,8%	18.326	6,4%
Costo Total	235.726	74,9%	207.563	72,5%
Margen Contable	78.874	25,1%	78.874	27,5%
GAV + intereses	45.500	14,5%	45.500	15,9%
Utilidad	33.374	10,6%	33.374	11,7%
	TOTALES			
INGRESOS INMOBILIARIA	314,600		286.437	
IVA 19% (EXCEPTO TERRENO)	0		48.356	
PRECIO FINAL UF	314.600		334.793	6,4%
PRECIO FINAL UF/UNID	14.300		15.218	918
PRECIO FINAL UF/M²	102,1		108,7	6,6

Fuente: (Inmobiliaria Socovesa Santiago SA, 2016)

Es importante considerar, que el proyecto Alto Los Bravos corresponde a la etapa 6 de un proyecto, por lo que considera una Urbanización Estructurante, explicada anteriormente.

De la tabla n°13 se puede extraer una diferencia de 20.193 UF, entre construir con o sin la aplicación de la Reforma Tributaria, lo que equivale casi 20 veces el valor invertido para acelerar el proyecto, lo cual dio excelentes resultados, por lo que se tomó la decisión correcta de acelerar el proyecto.

Tabla N° 13: “Evaluación del impacto de la aceleración del Alto Los Bravos”

Costo adicional por Incentivo Mano de Obra	345 UF	Precio antes de Reforma Tributaria	314.600 UF
Costos por Insumos Adicionales	783 UF	Precio con Reforma Tributaria	334.793 UF
Sobrecosto Total	1.128 UF	Ahorro Total	20.193 UF
DIFERENCIA		19.065 UF	

Fuente: Elaboración Propia

5.2.3 Mirador de Singular

Al igual que el proyecto Alto Los Bravos, el Condominio Mirador de Singular corresponde a una etapa de un proyecto, en este caso la segunda. Ésta contempla 32 casas ubicadas en la comuna de Colina, sector de Chamisero. Este programa se tuvo que recoger 2 meses para poder hacer el ingreso de la carpeta a la municipalidad, antes del 31 de Diciembre del 2016, donde se presentaron los siguientes sobrecostos:

Tabla N° 14: “Costo adicional por Incentivo Mano de Obra – Mirador de Singular”

	Unidad	Cantidad	P .Unitario	P. Total
Enfierradura	GL	1	117	117
Moldajes	GL	1	117	117
Cuadrilla Hormigón	GL	1	78	78
Cuadrilla andamios	GL	1	78	78
Capataz urbanización	Mes	4	36	142
Profesional terreno	Mes	3	95	285
TOTAL DIRECTO				817

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 15: “Costos por Insumos Adicionales – Mirador de Singular”

	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Bombeo hormigón fundación (80 %)	m³	390,6	0,31	121
Arriendo generador	Mes	3,5	43	151
Petróleo grupo generador	Mes	3,5	28	98
2da Grúa	Mes	3,5	161	564
Moldajes adicional, CASA 160	casa/mes	3,5	82	287
Andamios adicionales (20%)	Mes	3,5	150	525
Arriendo retroexcavadora	Mes	2	111	222
TOTAL DIRECTO				1.968

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Además de los sobrecostos generados en el proyecto, donde CayMo indicó aumentar el ritmo, lo que se tradujo en contratar otra máquina para bombear el hormigón y otra grúa, en otras maquinarias que se necesitaron, es necesario analizar la diferencia generada sobre el precio final del proyecto, al este caer dentro o fuera de la aplicación de la Reforma Tributaria, es decir, a la aplicación del IVA al momento de la venta, se tiene lo siguiente:

Tabla N° 16: “Análisis de impacto de la Reforma Tributaria en Proyecto Mirador de Singular”

	ANTES DE LA REFORMA TRIBUTARIA		CON LA REFORMA TRIBUTARIA	
INGRESOS	324.398	100,0%	292.313	100,0%
Costo Directo	104.309	32,2%	104.309	35,7%
Gastos Generales	33.280	10,3%	33.280	11,4%
Urbanización Int. + estructurante	27.918	8,6%	27.918	9,6%
GAV Constructora	3.363	1,0%	3.363	1,2%
Costos Construcción Total	168.870	52,1%	168.870	57,8%
IVA	32.085	9,9%	0	0,0%
Crédito Especial	-7.200	-2,2%	-7.200	-2,5%
IVA Neto	24.885	7,7%	-7.200	-2,5%
Terreno	41.642	12,8%	41.642	14,2%
Urbanización Estructurante	2.090	0,6%	2.090	0,7%
Otros Costos	9.777	3,0%	9.777	3,3%
Costo Total	247.265	76,2%	215.180	73,6%
Margen Contable	77.134	23,8%	77.134	26,4%
GAV + intereses	42.607	13,1%	42.607	14,6%
Utilidad	34.526	10,6%	34.526	11,8%
	TOTALES			
INGRESOS INMOBILIARIA	324.398		292.313	
IVA 19% (EXCEPTO TERRENO)	0		47.628	
PRECIO FINAL UF	324.398		339.941	4,8%
PRECIO FINAL UF/UNID	10.137		10.623	486
PRECIO FINAL UF/M²	61,1		64,0	2,9

Fuente: (Inmobiliaria Socovesa Santiago SA, 2016)

El análisis muestra un ahorro de 17.408 UF, que corresponde a más de seis veces lo que se tuvo que invertir para poder acelerar el proyecto, donde el gasto fue de 2.785 UF. Esto se pudo lograr, como ya se mencionó anteriormente, a que CayMo indico un ritmo de avance, que hacía necesario trabajar por dos frentes.

Tabla N° 17: “Evaluación del impacto de la aceleración del Mirador de Singular”

Costo adicional por Incentivo Mano de Obra	817 UF	Precio antes de Reforma Tributaria	314.600 UF
Costos por Insumos Adicionales	1.968 UF	Precio con Reforma Tributaria	334.793 UF
Sobrecosto Total	2.785 UF	Ahorro Total	20.193 UF
DIFERENCIA		17.408 UF	

Fuente: Elaboración Propia

5.2.4 La Marina

Finalmente, para el edificio La Marina, de 220 departamentos ubicados en San Miguel, se tuvo que controlar que el ingreso de la carpeta a la municipalidad fuera dentro del plazo planificado, es decir, en Diciembre del 2016. Dadas las condiciones de avance que se tuvieron, CayMo arrojó medidas a tomar, por lo que se incurrió en el siguiente sobrecosto:

Tabla N° 18: “Costo adicional por Incentivo Mano de Obra – La Marina”

	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Aumento supervisión	Mes	12	39	468
TOTAL DIRECTO				468

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 19: “Costos por Insumos Adicionales – La Marina”

	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Adicional Piscina	GL	1	317	317
Elementos de protección	GL	1	35	35
TOTAL DIRECTO				352

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Con respecto a la variación que se da en este proyecto, en cuanto al impacto del IVA antes y después de la Reforma Tributaria, se tiene lo siguiente:

Tabla N° 20: “Análisis de impacto de la Reforma Tributaria en Proyecto La Marina”

	ANTES DE LA REFORMA TRIBUTARIA		CON LA REFORMA TRIBUTARIA	
INGRESOS	530.424	100,0%	476.470	100,0%
Costo Directo	216.435	40,8%	216.435	45,4%
Gastos Generales	53.459	10,1%	53.459	11,2%
Urbanización Int. + estructurante	0	0,0%	0	0,0%
GAV Constructora	14.078	2,7%	14.078	3,0%
Costos Construcción Total	283.972	53,5%	283.972	59,6%
IVA	53.955	10,2%	0	0,0%
Crédito Especial	-35.071	-6,6%	-35.071	-7,4%
IVA Neto	18.884	3,6%	-35.071	-7,4%
Terreno	72.123	13,6%	72.123	15,1%
Urbanización Estructurante	0	0,0%	0	0,0%
Otros Costos	32.411	6,1%	32.411	6,8%
Costo Total	407.390	76,8%	353.436	74,2%
Margen Contable	123.034	23,2%	123.034	25,8%
GAV + intereses	53.849	10,2%	53.849	11,3%
Utilidad	69.184	13,0%	69.185	14,5%
	TOTALES			
INGRESOS INMOBILIARIA	530.424		476.470	
IVA 19% (EXCEPTO TERRENO)	0		76.826	
PRECIO FINAL UF	530.424		553.296	4,3%
PRECIO FINAL UF/UNID	2.411		2.515	104
PRECIO FINAL UF/M²	45,6		47,6	2,0

Fuente: (Inmobiliaria Socovesa Santiago SA, 2016)

Por lo tanto, se genera una diferencia de 22.872 UF al entregar el proyecto antes de la aplicación de la nueva Reforma Tributaria, lo que corresponde a haber aplicado casi 30 veces el sobrecosto. Es por lo anterior, que se vuelve a reafirmar la buena decisión de implementar CayMo en estos proyectos.

Tabla N° 21: “Evaluación del impacto de la aceleración del proyecto La Marina”

Costo adicional por Incentivo Mano de Obra	468 UF	Precio antes de Reforma Tributaria	530.424 UF
Costos por Insumos Adicionales	352 UF	Precio con Reforma Tributaria	553.296 UF
Sobrecosto Total	820 UF	Ahorro Total	22.872 UF
DIFERENCIA		22.052 UF	

Fuente: Elaboración Propia

Entre los 4 proyectos se ahorraron 75.640 UF, al no aplicarse el IVA de la Reforma Tributaria, pero se gastaron 10.092 UF en acelerar los proyectos, lo que genera un excedente de 65.548 UF para la inmobiliaria, que es equivalente a las utilidades que se pueden generar por la venta de un proyecto con las características del edificio “La Marina”.

Tabla N° 22: “Evaluación del impacto de la aceleración en los proyectos estudiados”

Proyecto	Sobrecostos	Diferencia Reforma Tributaria
Vicuña Mackenna	5.366 UF	17.032 UF
Alto Los Bravos	1.128 UF	20.193 UF
Mirador de Singular	2.778 UF	15.543 UF
La Marina	820 UF	22.872 UF
TOTAL	10.092 UF	75.640 UF
AHORRO	65.548 UF	

Fuente: Elaboración Propia

5.3 Encuesta CayMo

Esta encuesta fue diseñada con el objetivo de evaluar la plataforma CayMo, y así mejorar una futura plataforma de control de avance en línea. Fueron invitados a responder la encuesta todos los profesionales de las obras de la empresa Constructora Socovesa, como también Gerentes de Proyectos y Jefes del departamento de gestión de la empresa.

El primer apartado de la encuesta consideraba preguntas de Si o No, para así medir la aprobación de las distintas planillas de la herramienta CayMo, como también en suma, la aprobación de la herramienta en sí. A continuación se muestran las preguntas, con el porcentaje de las respuestas obtenidas a partir de las respuestas de 23 encuestados.

Tabla N° 23: “Preguntas cerradas – Encuesta CayMo”

Pregunta	SI	NO
¿Encuentra que la planilla CayMo es de utilidad para el control del avance de su obra?	95%	5%
¿Encuentra que es de utilidad la hoja de “Avances”?	89%	11%
¿Encuentra que es de utilidad la hoja “Mano de Obra”?	67%	33%
¿Encuentra que es de utilidad la hoja “Avances parciales”?	74%	26%
¿Encuentra que es de utilidad la hoja “Proyección”?	89%	11%
¿Encuentra que el llenado de la planilla es engorroso?	47%	53%
Promedio	77%	23%

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Luego, la encuesta hacía la siguiente pregunta abierta:

“¿Cuánto tiempo dedica en el llenado de la planilla? (Desde que ingresa los avances a CayMo hasta el análisis de la hoja “Proyección”)”

Donde las respuestas indican que se demoran en llenar la planilla entre 20 minutos y 2 horas.

5. 4 Costo generación Socoplanner

La plataforma online, diseñada especialmente para la empresa Constructora Socovesa Santiago, considera variados aspectos a considerar para su implementación. En primer lugar, se debe adquirir una licencia Web para crear ésta plataforma de control de programación, luego se debe hacer una evaluación de factibilidad, para así ver la funcionalidad y si cumple con los objetivos planteados. Posterior a esto, se deben generar maquetas, es decir, prototipos para ser aprobadas por el Departamento de Control de Gestión, a los cuales se les deben hacer pruebas internas de funcionamiento, analizando si las planillas responden a la solicitud, tanto de manera separada, como de manera conjunto, es decir, ver que la plataforma haga lo que tiene que hacer. Finalmente, se debe poner en funcionamiento la plataforma, haciendo que se utilice en proyectos pilotos, para así tener una validación del usuario, y poder corregir posibles errores antes de lanzar la plataforma al resto de la empresa.

Para todo lo anterior, se debe considerar tanto el costo de la licencia, como de los desarrolladores informáticos que se necesitarán para realizar lo deseado. Donde además, se considerará el costo de generar la plataforma en una aplicación móvil.

Tabla N° 24: “Costos informáticos de Socoplanner”

	Cantidad		US\$	Total US\$
Licencias para componentes WEB Gráficas	1	Licencia	1.500	1.500
Evaluación de Factibilidad Técnica de los componentes	2	Desarrollador Mes	3.000	6.000
Desarrollo de Maqueta Reusable	3	Desarrollador Mes	3.000	9.000
Implementación detallada de la versión final	6	Desarrollador Mes	3.000	3.000
Pruebas integrales y Piloto	1	Desarrollador Mes	3.000	3.000
Puesta en marcha en obras	1	Desarrollador Mes	3.000	3.000
Aplicación móvil	1	Desarrollador Mes	3.000	6.000
			TOTAL US\$	31.500
			TOTAL UF	810

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)

Por lo tanto, es necesario implementar 810 UF para poner en marcha la plataforma Socoplanner, con su respectiva aplicación móvil. Es importante destacar, que es necesario contar con un presupuesto destinado a la mantención de la plataforma, lo que se podría aproximar a 20 UF mensuales. Este costo considera cambio de pequeña envergadura, como reportes, corregir un mantenedor, agregar atributos o reglas de negocio, entre otros. De ser necesario hacer cambio importantes a Socoplanner, se deben tratar como proyectos independientes al soporte, donde en general, esto tiene un costo cercano a las 200 o 500 UF, dependiendo de la complejidad.

6. CONCLUSIONES

Todo proyecto de construcción, posee como principal objetivo materializar o edificar un diseño definido, el cual se debe ajustar a un presupuesto estudiado y por tanto una programación de actividades que avalen su cumplimiento. De ahí la importancia del seguimiento de la planificación, con el fin de obtener un mayor beneficio para la empresa ejecutora. Donde la planificación permite ordenar actividades, asignar recursos y plazos a estas, los cuales pueden ser controlados y proyectados en función de los avances reales, para así tomar medidas correctivas en caso de que se presenten desviaciones a lo largo del proyecto.

Es por lo anterior que nace la presente memoria, donde en primer lugar, fue necesario generar un marco teórico para conocer sistemas de planificación y programación, utilizando metodologías como el Sistema Last Planner y Lean, los que tienen como base de su filosofía el maximizar el valor y reducir pérdidas a través de una correcta utilización de los recursos. Luego, se conocieron las plataformas de control relacionadas al tema en estudio que existen en el mercado de la construcción, que permitieron realizar una evaluación para mejorar radicalmente el sistema de control de planificación que utilizaba la empresa Constructora Socovesa Santiago, empresa a la que se le busca proponer una plataforma online de control de programación de proyectos.

Según el levantamiento realizado en los proyectos de la Constructora Socovesa Santiago, se logró detectar la existencia de casos que llegaban a tener desviaciones de plazos de hasta 6 u 8 meses, lo que generaba gastos adicionales no reconocidos, y por consiguiente pérdidas que además de atentar contra los resultados de la compañía, ensuciaba la imagen de esta. Debido a aquello, era de suma importancia corregir los aumentos de plazos que se estaban generando. Para esto se propuso un itemizado estandarizado, que facilitó el control de los programas de los proyectos, tanto directamente en la obra, como desde el Departamento de Control de Gestión de la empresa.

Posteriormente, como el control en la planificación se realiza por medio del levantamiento de avance físico, se propuso a la empresa una herramienta de seguimiento y control denominada CayMo – Control de Avance y Mano de Obra- con la que se logró analizar el avance semanal de los proyectos, los ritmos históricos, semanales y los volúmenes de mano de obra necesarios para realizarlos, para de esta manera proyectar los término de cada partida de un proyecto. Por otro

lado, la herramienta entrega la información necesaria para detectar aquellas partidas o tareas críticas que requieran de alguna intervención o inyección de recursos de mano de obra, para lograr cumplir la fecha de término programada o en su defecto disminuir los retrasos lo máximo posible.

Por otro lado, gracias a CayMo se logró ahorrar más de 65.000 UF en 4 proyectos intervenidos a causa de la reforma tributaria, en los que se adelantó o controló su programación, para que esta tuviera término el 31 de Diciembre del 2016, y así no tuvieran que pagar el IVA que empezaba a regir en el año siguiente. Además, dado el impacto que tuvo CayMo, y las evaluaciones realizadas por los profesionales de obra, se perfeccionó el control de avance propuesto, donde también se generó la necesidad de tener una plataforma en línea y se propuso una maqueta para que se pueda crear una nueva plataforma, llamada Socoplanner, que cumple con los mismos requerimientos de CayMo, pero esta vez se incorpora un cuadro de cumplimiento, planos que grafican las tareas a realizar, curvas “S” de avance de cada partida y señala las restricciones que están impidiendo el logro de las tareas asignadas, además de incorporar la plataforma a un sistema de App Mobile.

A lo largo de la presente memoria de título, se logró demostrar cómo una plataforma de control de avance físico y proyección de los proyectos, permite lograr cumplir con los plazos y presupuestos programados en la concepción de ellos. Esto dado que se observó que al conocer un ritmo de avance necesario para cumplir con una fecha, más la mano de obra que se necesita para esto, es mucho más comprensible alcanzar la meta de una fecha de término programada.

Si bien se dejó planteado un prototipo de control de planificación de proyectos, se recomienda la materialización e implementación de la plataforma online, Socoplanner, para así generar un control de avance físico a nivel empresa, que permita cumplir con plazos establecidos, lo más cercano a lo proyectado, obteniendo de esta manera los beneficios que busca la empresa.

7. REFERENCIAS


1. Adimark. (2017). *Serie Historia (2006 -2016) - Crecimiento sector construcción*. Santiago: GFK.
2. BS Grupo. (2011). *Software para la gestión de Proyectos con Microsoft Project 2010*.
3. Chavarría, L. (2010). *Diseño de un sistema de control de gestión para una empresa de servicios de ingeniería de consulta en minería*. Santiago: Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Industrial.
4. Constructora Socovesa Santiago SA. (2016). *CayMo - Control de Avance y Mano de Obra*. Santiago: Vicuña Mackenna.
5. Constructora Socovesa Santiago SA. (Junio de 2016). *Control de Avance y Mano de Obra*. Recuperado el Junio de 2017, de SurveyMonkey: https://es.surveymonkey.com/summary/LaxIK69cFxL4gD4ij6vheI3hSfYhIOPd4FAI4JBjwFs_3D
6. Constructora Socovesa Santiago SA. (2016). *Itemizado de Casas y Departamentos*. Santiago.
7. Constructora Socovesa Santiago SA. (2016). *Notas de cambio aprobadas para aceleración de obra*. Santiago.
8. Constructora Socovesa Santiago SA. (2016). *Planilla de Asignaciones*. Santiago.
9. Constructora Socovesa Santiago SA. (2017). *Balances de obra de la Constructora*. Santiago.
10. Constructora Socovesa Santiago SA. (2017). *Procedimiento CayMo*. Santiago.
11. Constructora Socovesa Santiago SA. (Junio de 2017). *Socoplanner*. Obtenido de Edificio Albano II B: socoplanner.socovesa.cl
12. Constructora Socovesa Santiago SA. (Junio de 2017). *Socoplanner*. Obtenido de Las Pataguas: socoplanner.socovesa.cl
13. Constructora Socovesa Santiago SA. (Junio de 2017). *Socoplanner*. Obtenido de Septima Avenida: socoplanner.socovesa.cl
14. Constructora Socovesa Santiago SA. (2017). *Socoplanner - Sistema de control de avance*. Santiago.
15. Empresas Socovesa SA. (2016). *Memoria anual 2016*. Santiago: Empresas Socovesa - Diseño centrado en el habitar.

16. Ferrada, X. (2016). *Gestión de Proyectos*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
17. Foco en Obra. (2017). *Control de Avance*. Santiago.
18. Inmobiliaria Socovesa Santiago SA. (2016). *Presupuesto Inmobiliario*. Santiago: Departamento de Desarrollo.
19. Ipsum. (2016). *ProPlanner*. Recuperado el Junio de 2017, de Características: <http://ipsumapp.co/ipsum-caracteristicas.html>
20. Malabares. (2017). *Planificación - SLP*. Santiago.
21. Matrix Consulting. (2014). *Potenciar el área de Construcción de Socovesa Santiago*. Santiago.
22. Ministerio de Hacienda de la República de Chile. (2016). *Reforma Tributaria*. Recuperado el 2017, de IVA en materia Inmobiliaria: <http://reformatributaria.gob.cl/iva-en-materia-inmobiliaria/>
23. PMI. (2013). *Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos - PMBOK*. Pensilvania, EEUU: Project Management Institute.
24. SII, S. (23 de Enero de 2017). *Crédito especial de Empresas Constructoras*. Recuperado el Junio de 2017, de Preguntas frecuentes: http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/iva/001_030_5997.htm

8. ANEXOS


1. Crecimiento sector construcción

Gráfico N° 3: “Evolución Promesas Santiago”

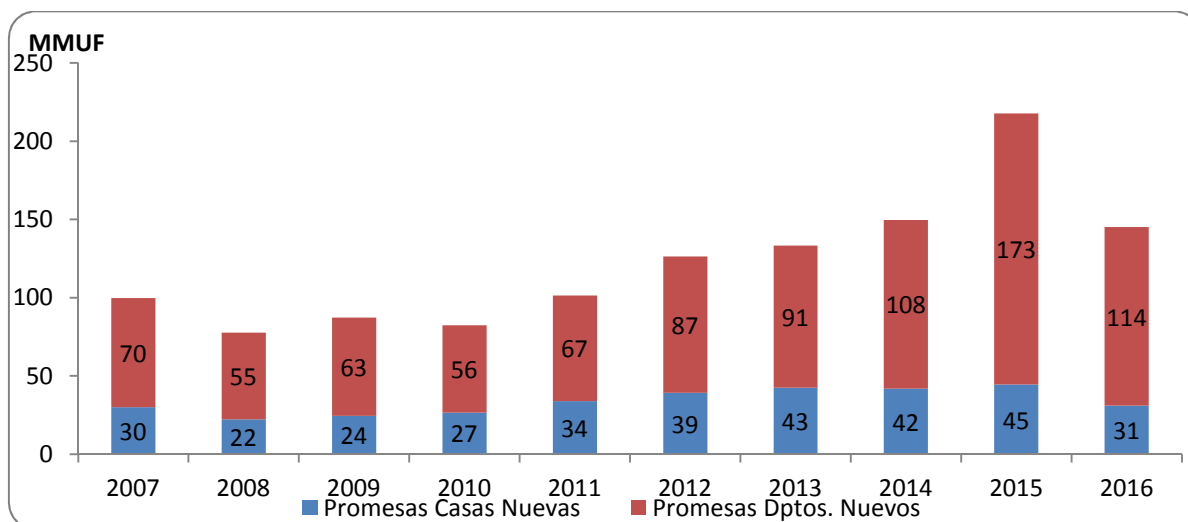

Fuente: (Adimark, 2017)

Gráfico N° 4: “Evolución Promesas Departamentos en Santiago”

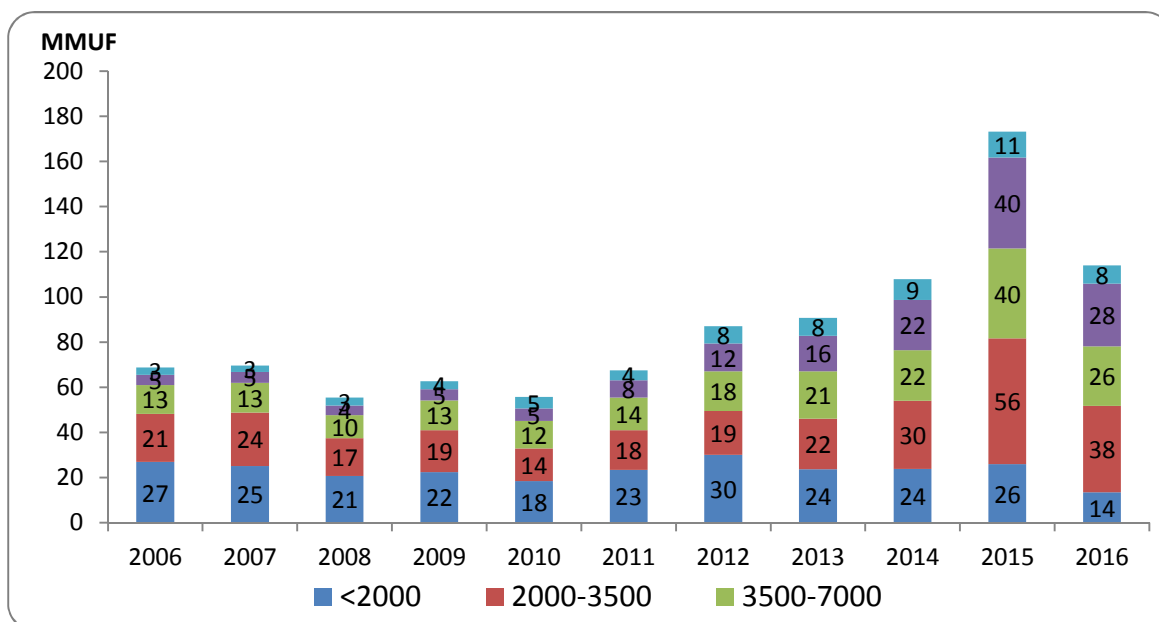


Fuente: (Adimark, 2017)

2. Indicadores Empresas Socovesa


En el año 2016, el margen bruto alcanza un 29,8%, a pesar de los menores ingresos registrados en este año. Además, durante los últimos años, el ROE crece significativamente, alcanzando 12,3% en el año 2016.

Gráfico N° 5: “Evolución de los Ingresos Consolidados de Empresas Socovesa”

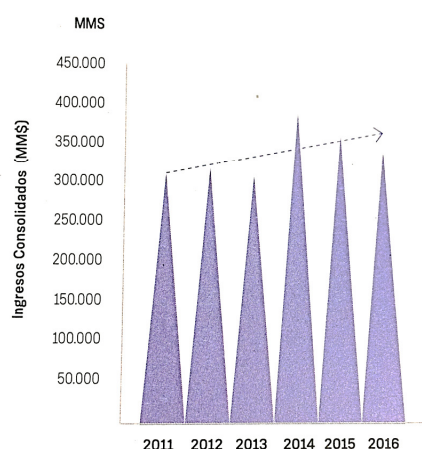

Fuente: (Empresas Socovesa SA, 2016)


Gráfico N° 6: “Evolución ROE de Empresas Socovesa”

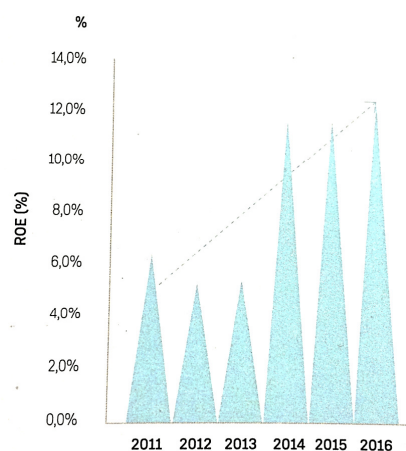

Fuente: (Empresas Socovesa SA, 2016)


Por otro lado, las utilidades alcanzan un nuevo record consolidando la estrategia de crecimiento con rentabilidad que ha seguido la compañía. Y el Ebitda consolidado aumentó un 6% respecto del 2015, donde el ratio Ebitda/Ventas mejora dos puntos porcentuales, alcanzando 20%.

Gráfico N° 7: “Evolución de las Utilidades de Empresas Socovesa”

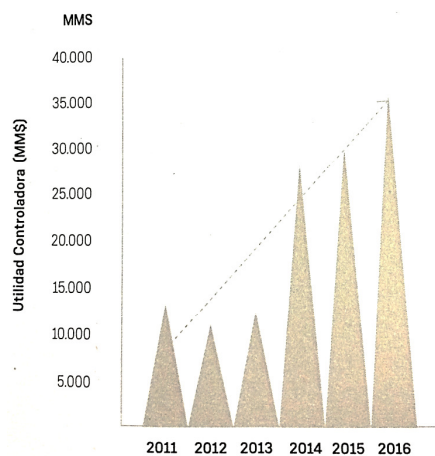

Fuente: (Empresas Socovesa SA, 2016)


Gráfico N° 8: “Margen Ebitda de Empresas Socovesa”

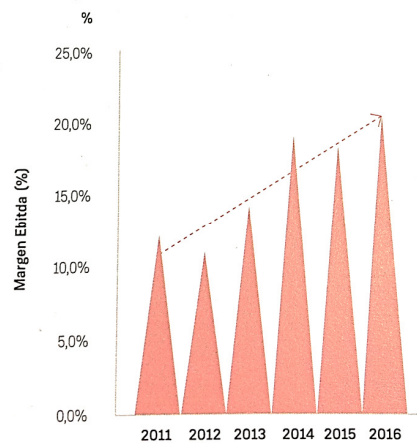

Fuente: (Empresas Socovesa SA, 2016)


3. Indicadores Inmobiliaria Socovesa Santiago

Gráfico N° 9: “Ingresos Totales y Margen Bruto Total de la Constructora Socovesa”

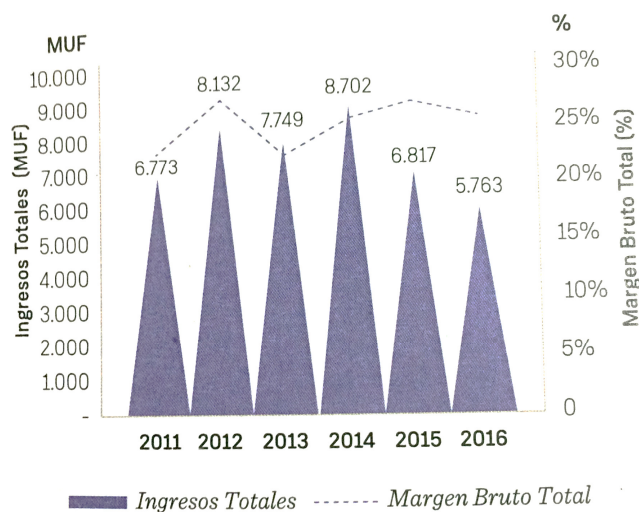

Fuente: (Empresas Socovesa SA, 2016)

Gráfico N° 10: “Utilidad Controlada y Margen Neto de la Constructora Socovesa”

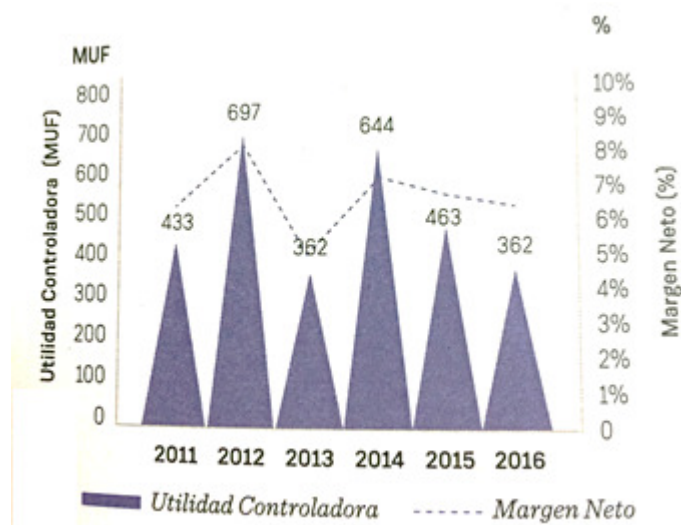

Fuente: (Empresas Socovesa SA, 2016)

4. Itemizado casas y departamentos

Tabla N° 25: “Itemizado Obra gruesa de Casas”

OBRA GRUESA	
ESCARPE, CORTE ARCILLA	HORMIGON PILARES-1° PISO
RELLENO, REPLANTEO Y NIVELETAS	DESCIMBRE MOLDAJE PILARES-1° PISO
TRAZADO DE FUNDACIONES	MOLDAJE LOSA
EXCAVACION DE FUNDACIONES	FIERRO LOSA +CADENAS Y VIGAS
EMPLANTILLADO + PERFILADO EXCAVACION	INSTALACIONES ELECTRICAS
TRAZADO DE FUNDACIONES	INSTALACIONES SANITARIAS
ENFIERRADURA FUNDACION	HORMIGON LOSA
PASADAS PARA INSTALACIONES	TRAZADO E INSTALACION DE ESCALA
HORMIGON DE FUNDACIONES	TRAZADO ALBAÑILERIA-2° PISO
ENFIERRADURA SOBRECIMIENTO	ALBAÑILERIA-2° PISO
MOLDAJE SOBRECIMIENTO	ENFIERRADURA PILARES-2° PISO
HORMIGON SOBRECIMIENTO	MOLDAJE PILARES-2° PISO
DESCIMBRE MOLDAJE SOBRECIMIENTO	HORMIGON PILARES-2° PISO
EXCAVACIÓN PLANTA ALCANTARILLADO	DESCIMBRE MOLDAJE PILARES-2° PISO
INSTALACIÓN PLANTA ALCANTARILLADO	ENFIERRADURA CADENAS-2° PISO
INSTALACIÓN PLANTA AP	MOLDAJE CADENAS-2° PISO
RELLENO COMPACTADO BAJO RADIER	HORMIGON CADENAS-2° PISO
COLOCACION DE POLIETILENO + BASE RIPIO	DESCIMBRE CADENAS-2° PISO
HORMIGON RADIER	ENFIERRADURA FROTON
TRAZADO ALBAÑILERIA-1° PISO	MOLDAJE CADENAS FRONTON
INSTALACIÓN REGLAS Y PREMARCOS-1° PISO	HORMIGON FRONTON
DISTRIBUCIÓN LADRILLOS	ESTRUCTURA TECHUMBRE
ALBAÑILERIA-1° PISO	INSTALACION OSB-FIELTRO
ANDAMIOS ALBAÑILERÍA	FORROS HOJALATERIA
ENFIERRADURA PILARES-1° PISO	CUBIERTA TECHUMBRE TEJAS
MOLDAJE PILARES-1° PISO	ALEROS
ANDAMIOS PARA HORMIGONADO	ASEO

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 26: “Itemizado Terminaciones Interiores de Casas”

TERMINACIONES INTERIORES	
ESTUCO INTERIOR	CERAMICA PISO BAÑO Y COCINAS
REMATE RASGOS	CERAMICA MUROS
YESO LOSA Y CADENAS	REPARACIÓN DE PISOS
RINCONEO YESO + REMATES YESO	INSTALACIÓN DE VENTANAS
ESTRUCTURACION DE CIELOS	INST. GUARDAPOLVOS Y CORNISAS
INSTALACIÓN ELECTRICA CIELOS	EMPASTE MUROS Y CIELO
ASLACIÓN CIELOS	PINTURA CIELOS
TAPADO CIELOS	PINTURA INTERIOR 1ERA MANO
ESTRUCTURA TABIQUES+1° CARA VOLCANITA	INST. QUINCALLERIA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TABIQUES	INST. MUEBLES, VANITORIOS Y COCINAS
INSTALACIÓN ALC + AP TABIQUES	CUBIERTAS Y ACC. DE BAÑO
REVESTIMIENTO TABIQUES	ARTEFACTOS SANITARIOS-GRIFERIA-ESPEJOS
HUINCHAS Y ESQUINEROS TABIQUE	PINTURA INTERIOR 2a MANO
IMPERMEABILIZACION BAÑOS	INSTALACIÓN PISO FOTOLAMINADO Y ALFOMBRA
INSTALACION TINAS	ARTEFACTOS ELECTRICOS
ANTEPECHO TINA	PINTURA INTERIOR 3a MANO
INSTALACIÓN KIT DE PUERTAS	ASEO GRUESO

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 27: “Itemizado Terminaciones y Obras Exteriores de Casas”

TERMINACIONES EXTERIORES
ESTUCO EXTERIOR
QUEMADO Y LAVADO DE FACHADA
PINTURA EXTERIOR 1ERA MANO
INSTALACION CALEFONT + CASETA
PINTURA EXTERIOR 2a MANO
COLOCACION CANALETAS Y BAJADAS DE ALL
NUMERACION Y SEÑALIZACION
OBRAS EXTERIORES
ACOMETIDA GAS
ACOMETIDA AGUA Y ALCANTARILLADO
CIERROS MEDIANEROS
EMPAREJAMIENTO PATIO
REJAS METALICAS
NICHO AGUA
NICHO GAS
INSTALACION DE MEDIDORES
EMPALME ELECTRICO
PASTELONES DE ACCESO
EMPAREJAMIENTO FINO

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 28: “Itemizado R0 y Certificación de Casas”

R0 Y PREPARACION DE VIVIENDAS
ASEO FINO
R0 (SOLUCION)
RI (SOLUCION)
RF (SOLUCION)
CERTIFICACION Y RECEPCION MUNICIPAL
INGRESO CARPETA DOM
RECEPCION MUNICIPAL

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 29: “Itemizado Obras previas y Estructura de Edificios”

OBRAS PREVIAS
SOCALZADO
EXCAVACION MASIVA
FUNDACION GRUAS
DREN AALL
ESTRUCTURA EDIFICIO
FUNDACIONES
OG-MUROS
OG-LOSAS
SALA MÁQ. Y CORONACION
ESTRUCTURA CUBIERTA
CUBIERTA

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 30: “Itemizado Terminaciones de Edificios”

TERMINACIONES EDIFICIO	
BARANDAS DEPARTAMENTOS	PINTURA 1° MANO
REMATE RASGOS	CERAMICA PISOS Y MUROS
YESOS LOSAS Y MUROS	CERAMICA PASILLOS
TABIQUE	PINTURA 2° MANO
IMPERMEABILIZACION INTERIOR	MUEBLES COCINA, BAÑO, CLOSET
ALUMINIO	COLOCACIÓN ARTEFACTOS
TINAS Y ANTEPECHOS	PAPEL MURAL
MARCOS PUERTAS	ALFOMBRA Y PISO FOTOLAMINADO
PIERNAS CLOSET	PINTURA TERMINACIÓN
GUARDAPOLVOS Y CORNISAS	PREPARACIÓN DEPTOS ENTREGA
REMATES YESO	ENTREGA DEPTOS A INMOBILIARIA
EMPASTE CIELOS Y MUROS	

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 31: “Itemizado Áreas comunes y Primer piso de Edificios”

AREAS COMUNES	
PASILLO-YESO	PRIMER PISO
PASILLO-TABIQUE	1er. P-HALL ACCESO EDIFICIO
PASILLO-KIT PUERTAS	1er. P-LAVANDERÍA
PASILLO-CERAMICO	1er. P-SALAS MULTIUSO I Y II
PASILLO-REMATES DE YESO	1er. P-GIMNASIO
PASILLO-PINTURA CIELO	1er. P-AREA CONSERJE
PASILLO-PINTURA MURO	1er. P-ENFERMERIA
ESCALA-YESO	1er. P-BAÑO COMUN
ESCALA-BARANDA	
ESCALA-REMATE DE YESO	
ESCALA-PINTURA	
ESCALA-PAVIMENTO	
ESCALA-PINTURA TERMINACION	

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

Tabla N° 32: “Itemizado Exteriores de Edificios”

EXTERIORES	
FACHADA SUR	EXTERIORES
FACHADA-ESTUCO SUR	JARDINERAS 1° PISO (c/ impermeabilización)
FACHADA-IMPERMEABILIZACION SUR	IMPERMEABILIZACION LOSA 1° PISO
FACHADA-PINTURA SUR	ASFALTO (TRÁNSITO VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTOS)
FACHADA ORIENTE	SOLERILLAS 1° PISO
FACHADA-ESTUCO ORIENTE	RELLENO TIERRA VEGETAL
FACHADA-IMPERMEABILIZACION ORIENTE	PASTELONES 1° PISO
FACHADA-PINTURA ORIENTE	CARPINTERIA METALICA (barandas y rejas)
FACHADA NORTE	PAISAJISMO
FACHADA-ESTUCO NORTE	QUINCHOS HGON AZOTEA
FACHADA-IMPERMEABILIZACION NORTE	PÉRGOLA AZOTEA
FACHADA-PINTURA NORTE	
FACHADA PONIENTE	
FACHADA-ESTUCO PONIENTE	
FACHADA-IMPERMEABILIZACION PONIENTE	
FACHADA-PINTURA PONIENTE	

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)


Tabla N° 33: “Itemizado Otros y Certificación de Edificios”

ASCENSORES
ASCENSORES
SALA DE BASURA
SALA DE BASURA
SERVIU - AVB
SERVIU
CERTIFICACION Y CARPETA
CERTIFICACION
ENTREGA CARPETA RM

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2016)

5. Diagrama de Flujo CayMo

Esquema N° 5: “Diagrama de Flujo CayMo”

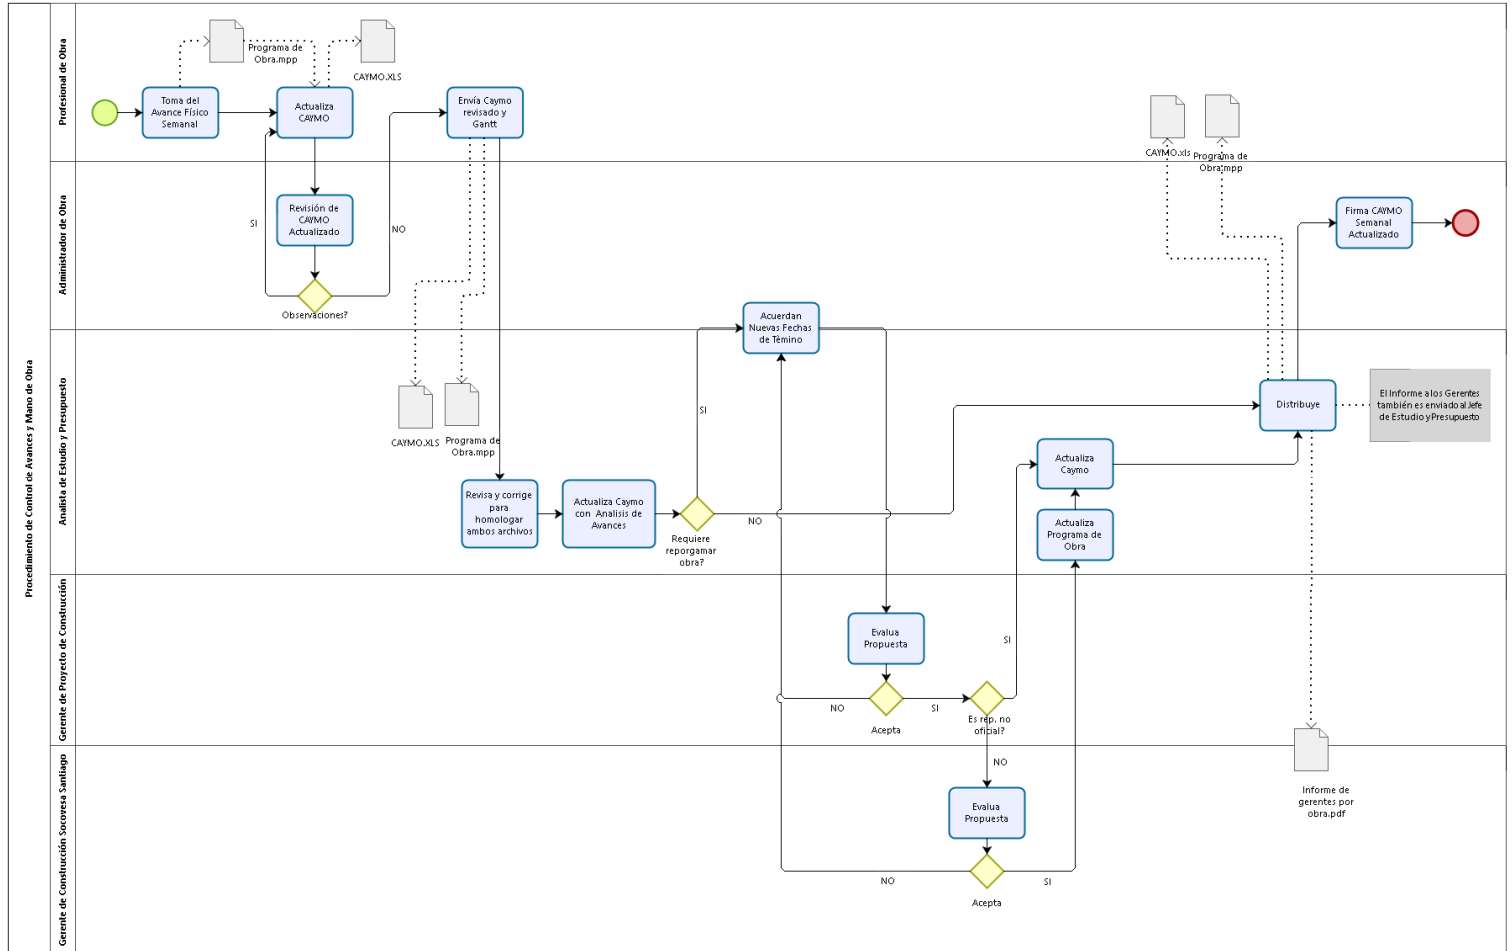

Fuente: (Constructora Socovesa Santiago SA, 2017)
